



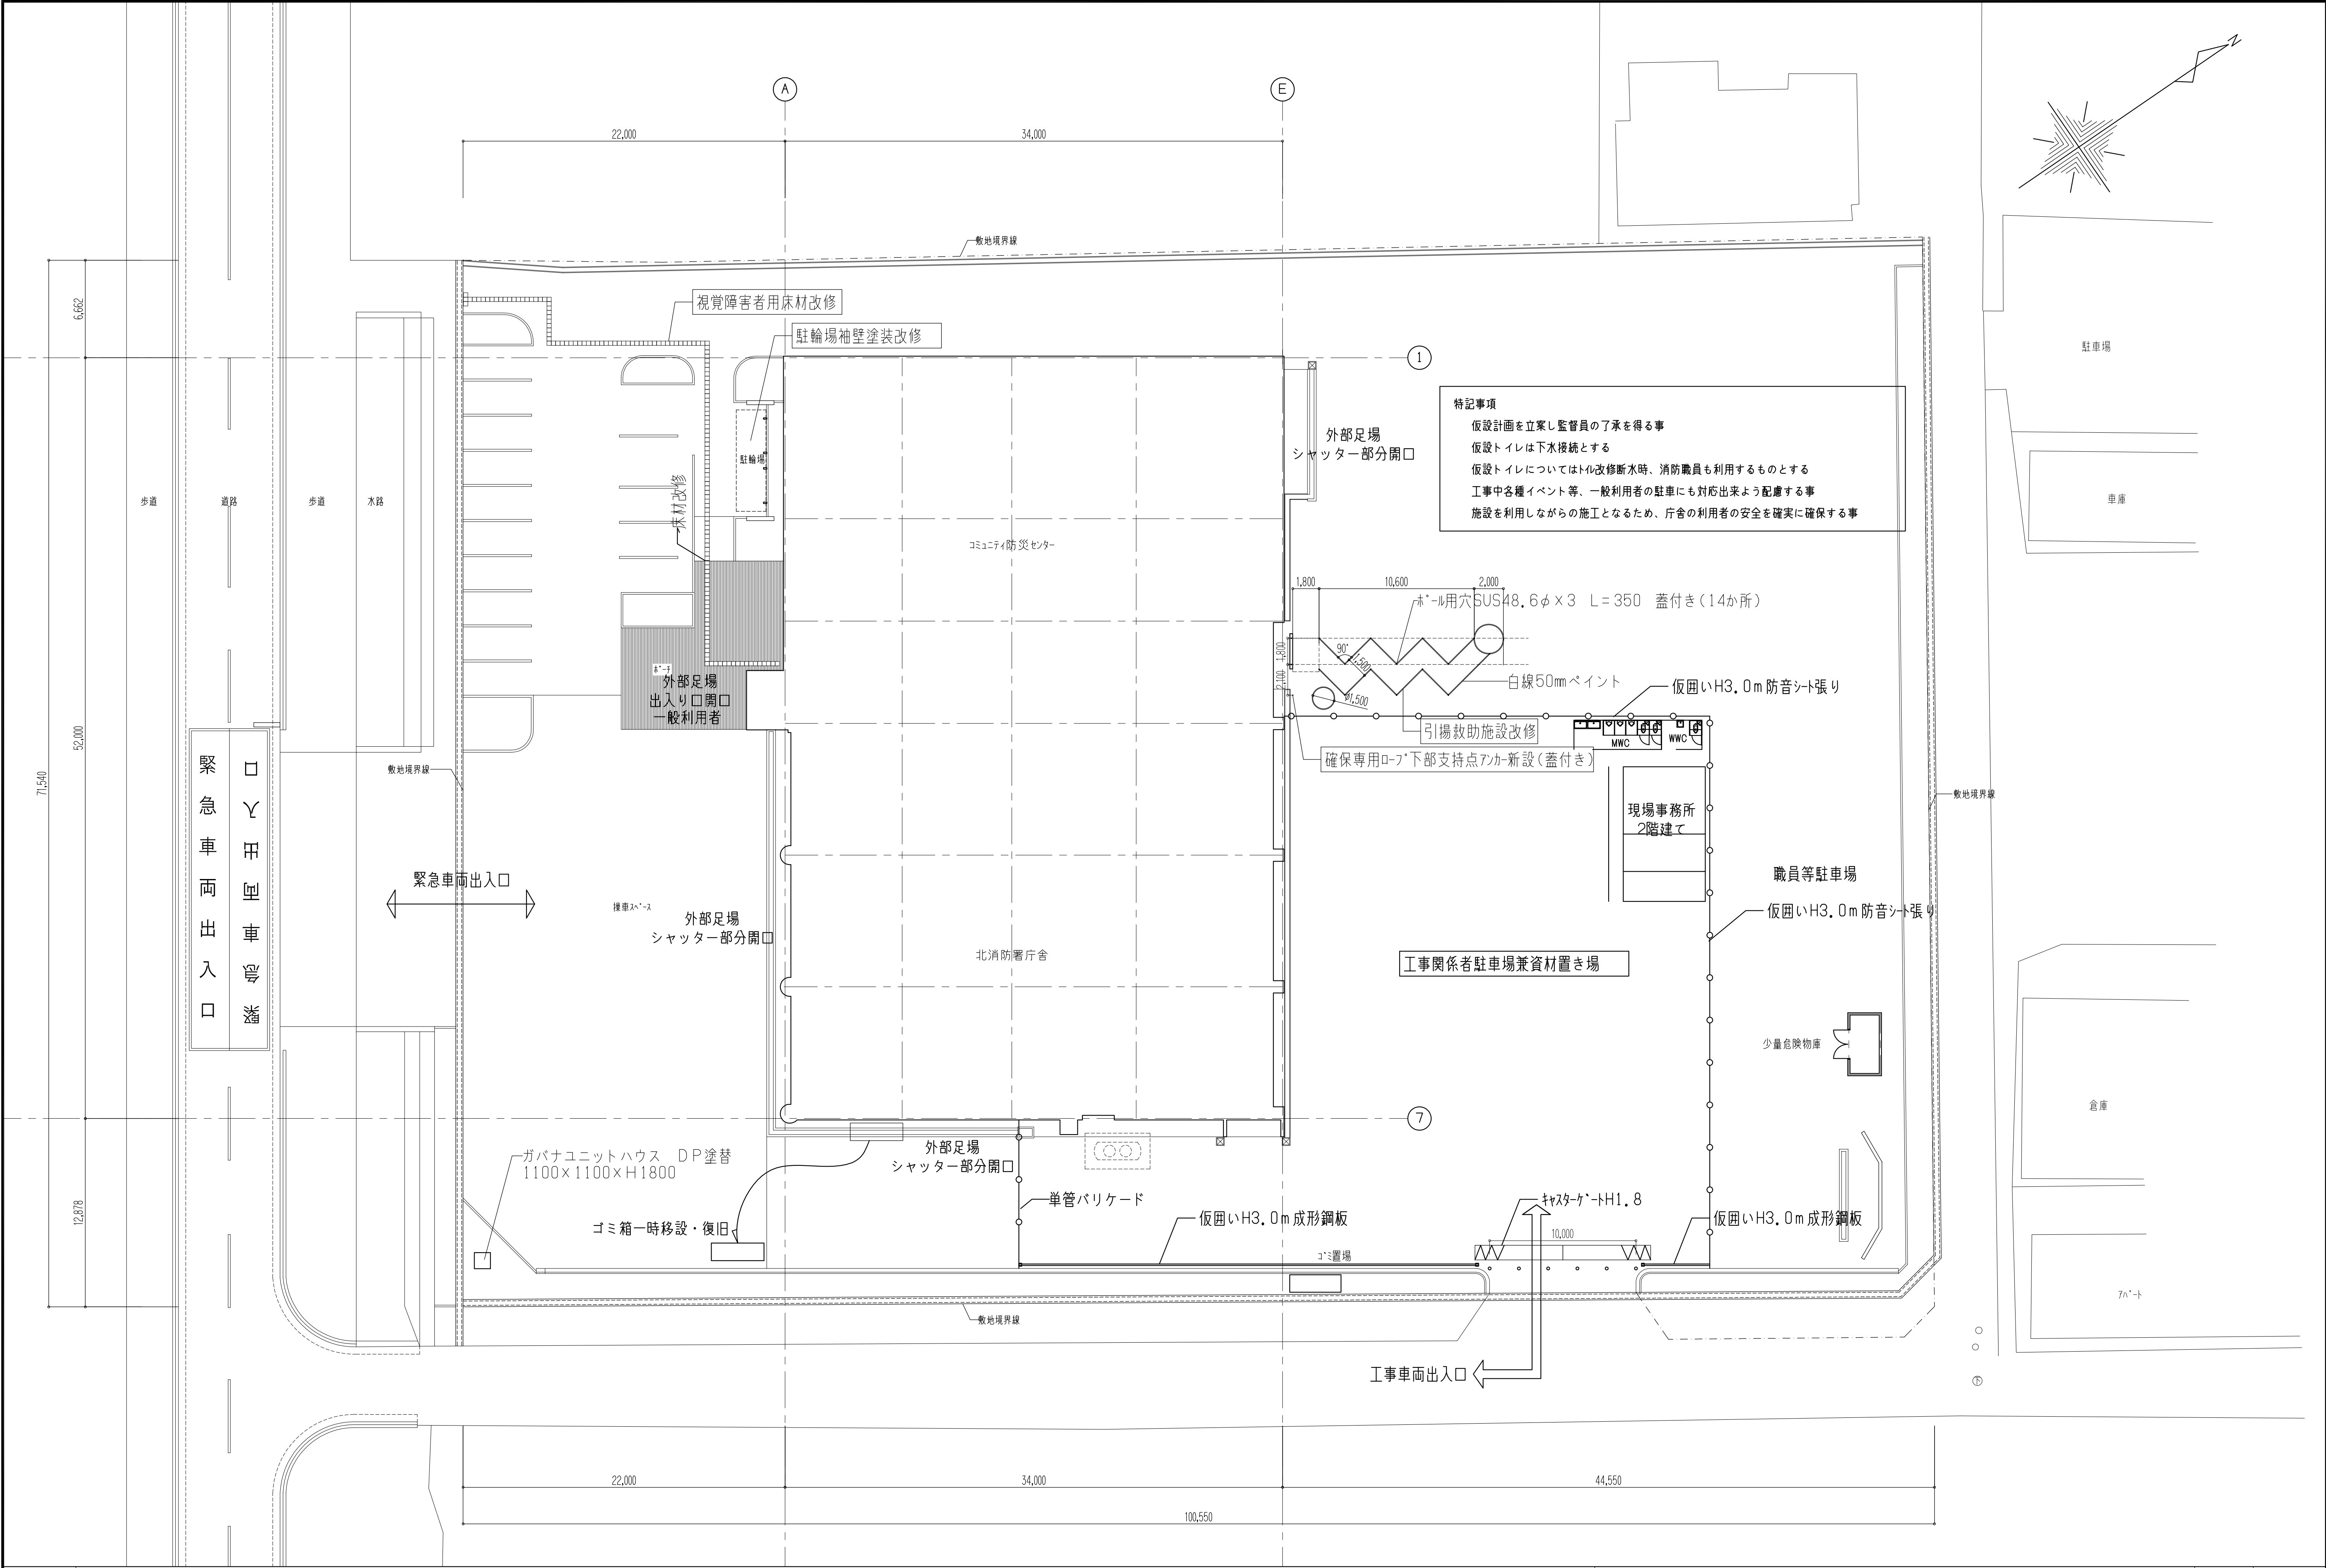


③

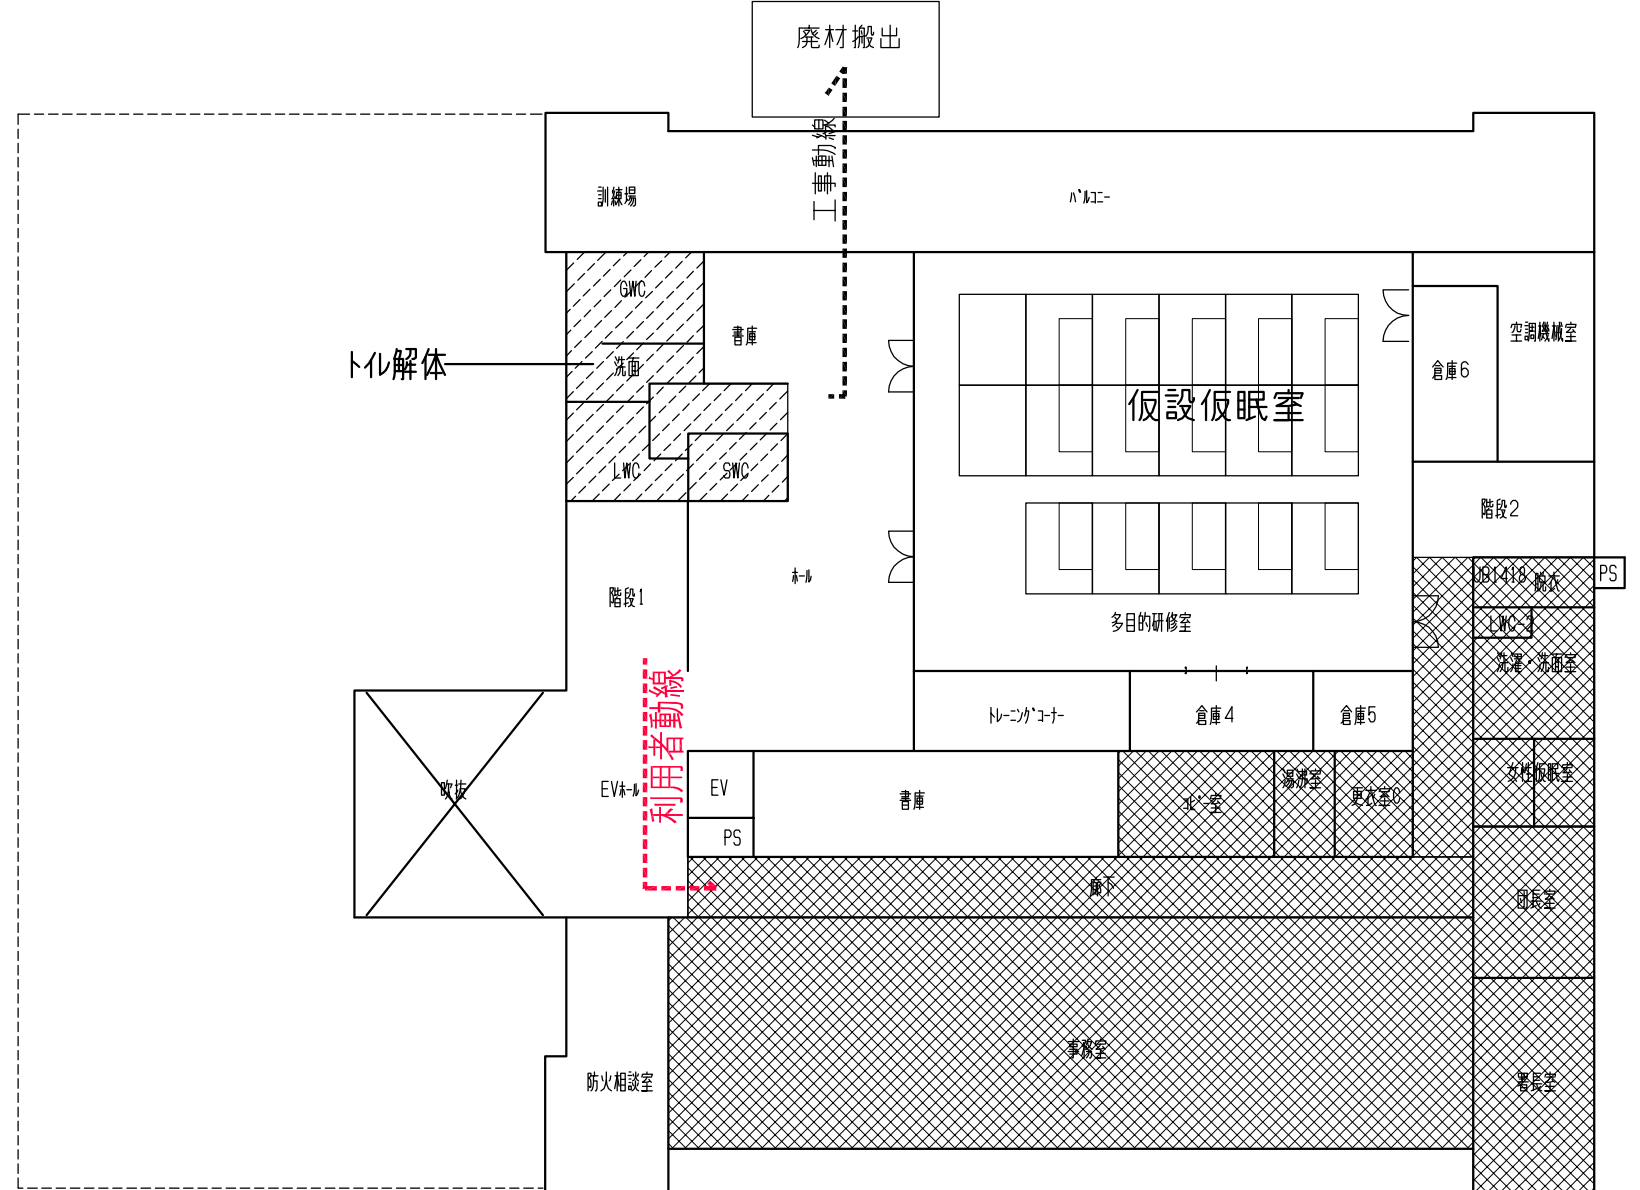

【概略工事内容】

- ★ 事務室、署長室、団長室、女性仮眠室完了
- ★ 2階トイレ解体
- ★ 1階仮眠17撤去に先立ち仮設仮眠室設置
- ★ トレーニング室は空調のみ設置

利用者動線、

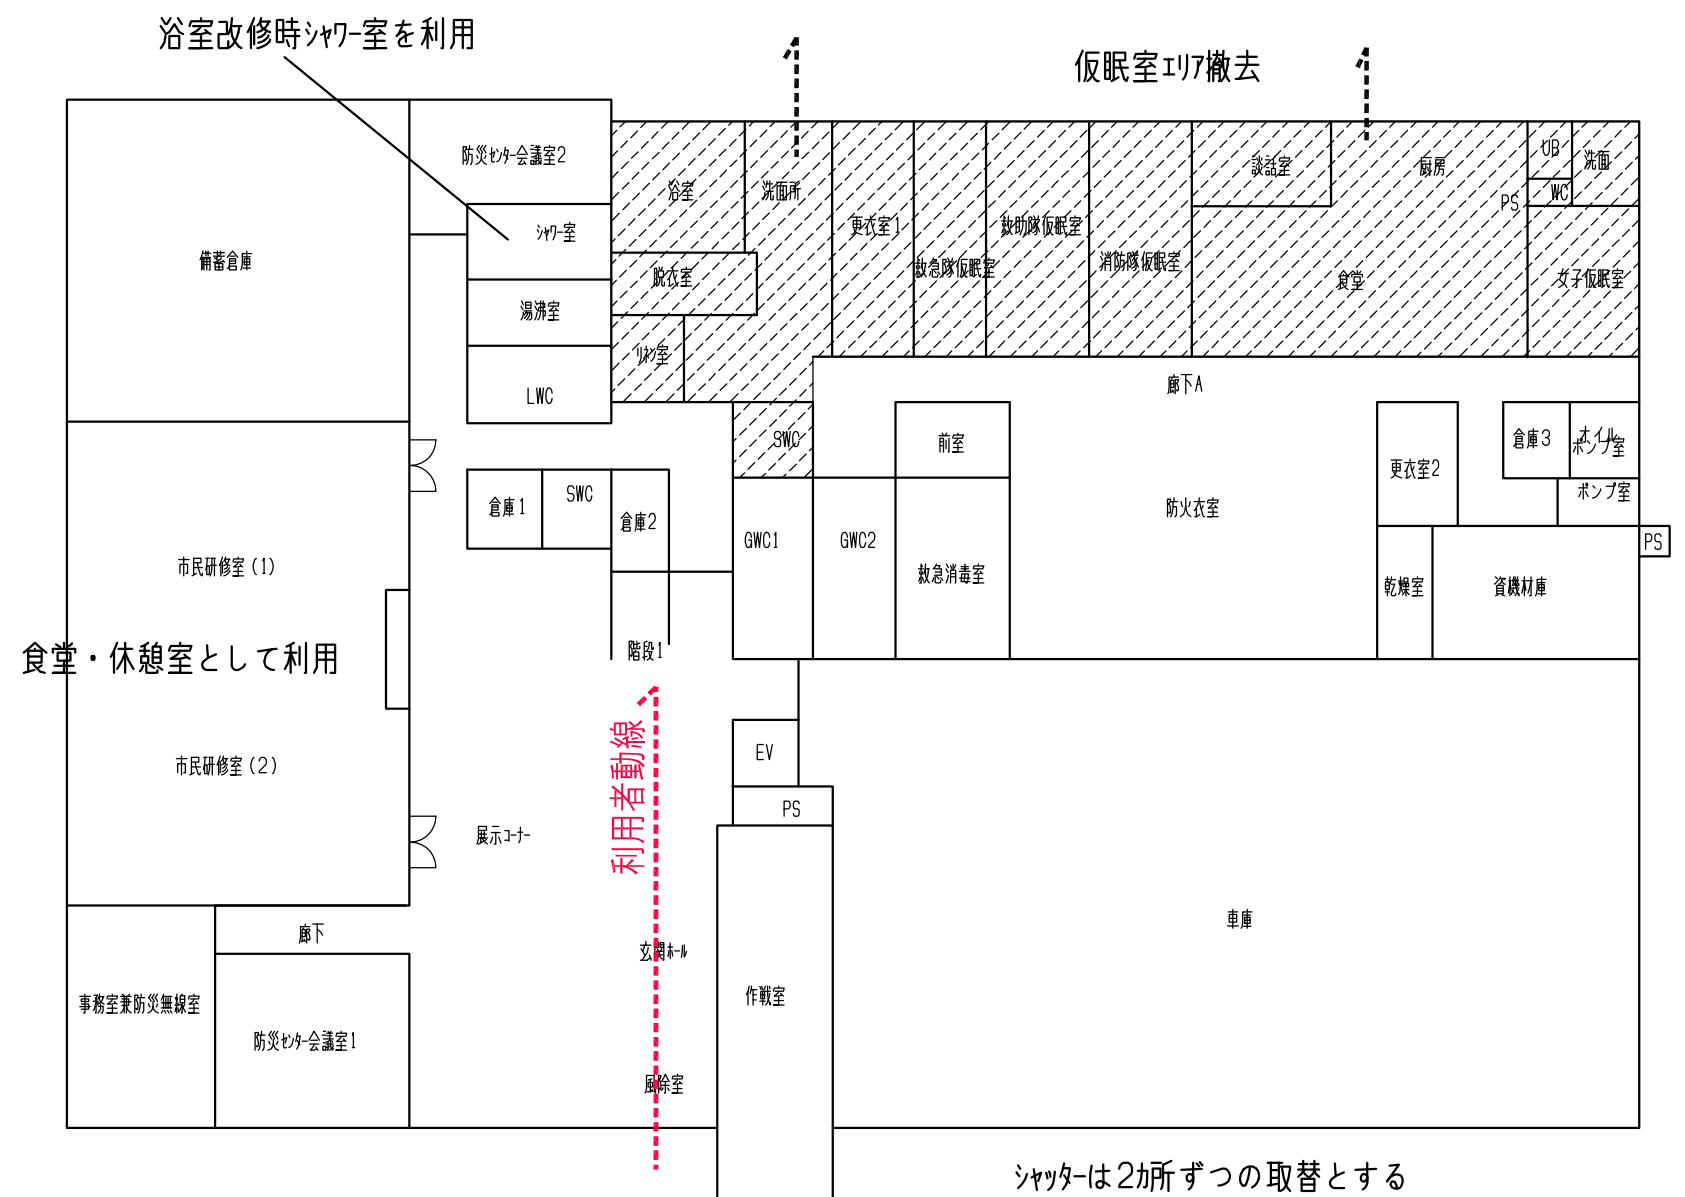


【概略工事内容】

★ 1階仮眠177撤去	仮眠室717撤去完了時にはベランダ防水完了しておく
★ 市民研修室は食堂・休憩室として利用	
	浴室改修時シャワ室を利用

備考
屋上自家発電設備機器 納期約6ヵ月

2階


④

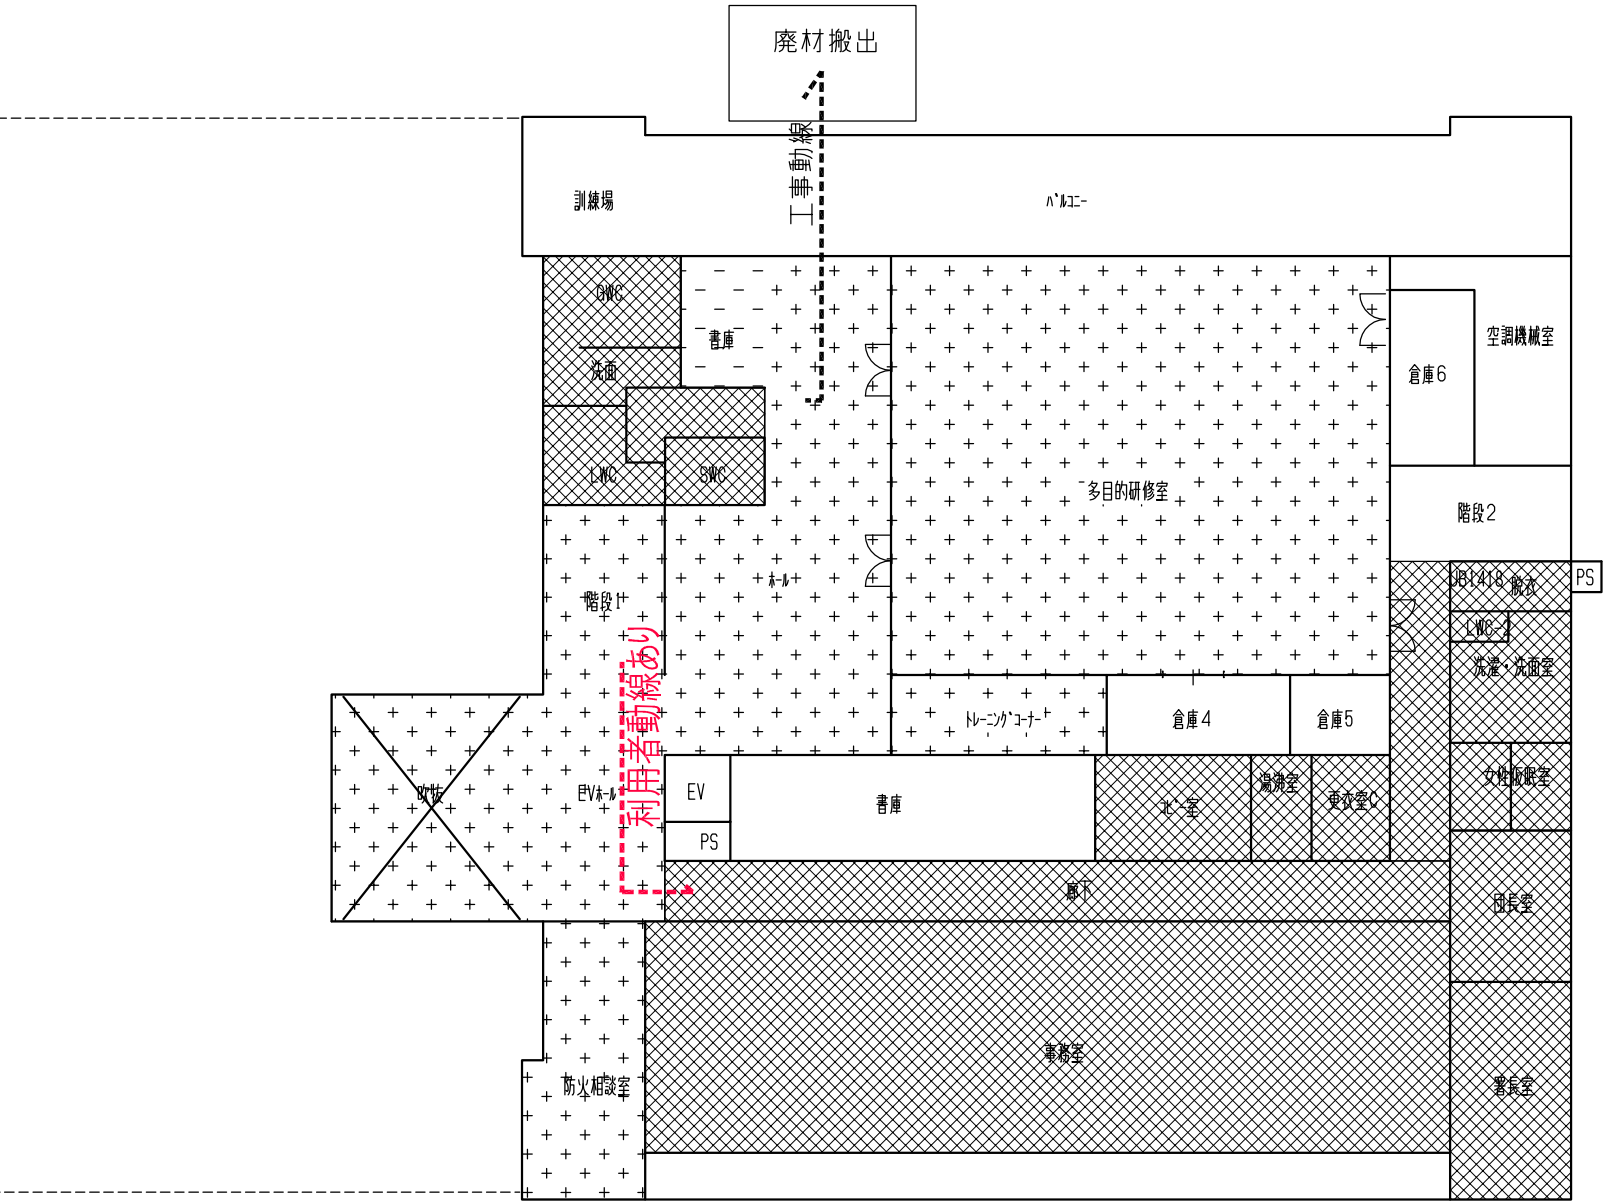

【概略工事内容】 既設配管、配線調査確認

- ★ 2階トイレ完了
- ★ 2階ホール、多目的研修室、トレーニング室改修


⑤

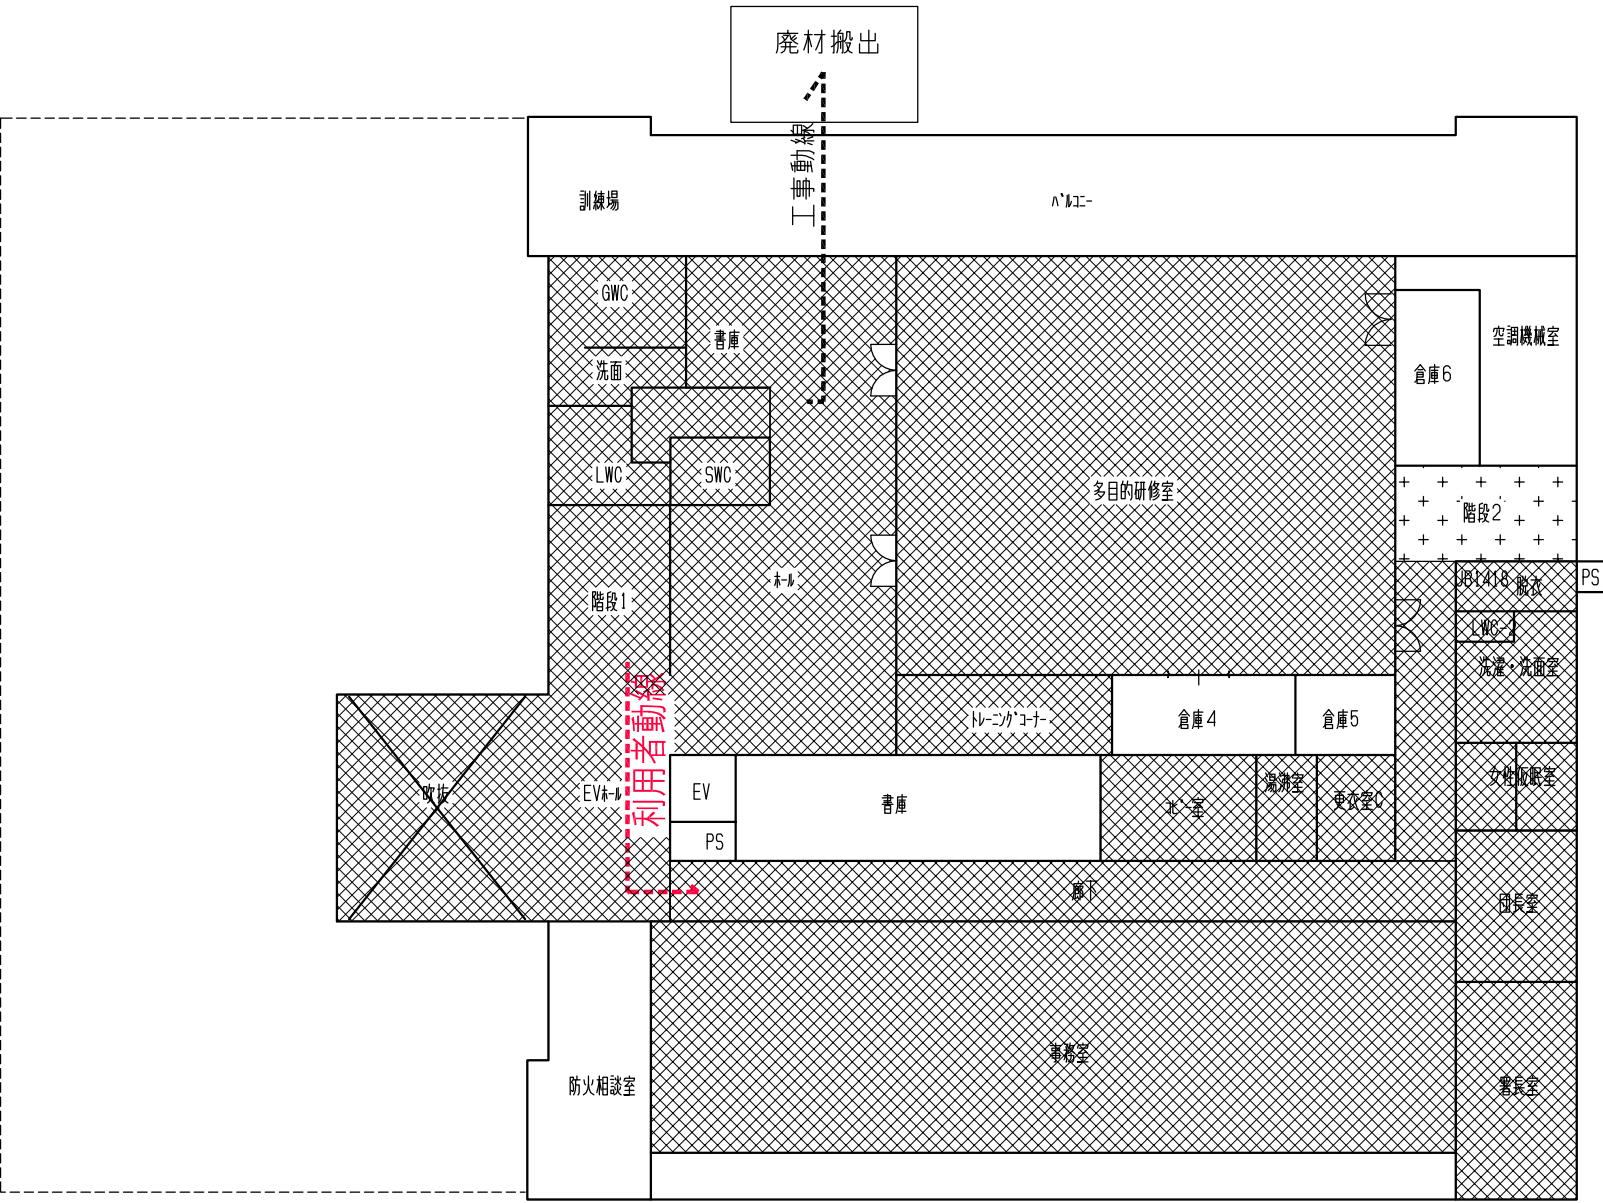

【概略工事内容】


- ★ 2階トイレ完了
- ★ 2階ホール、多目的研修室、トレーニング室完了

防火区画位置図

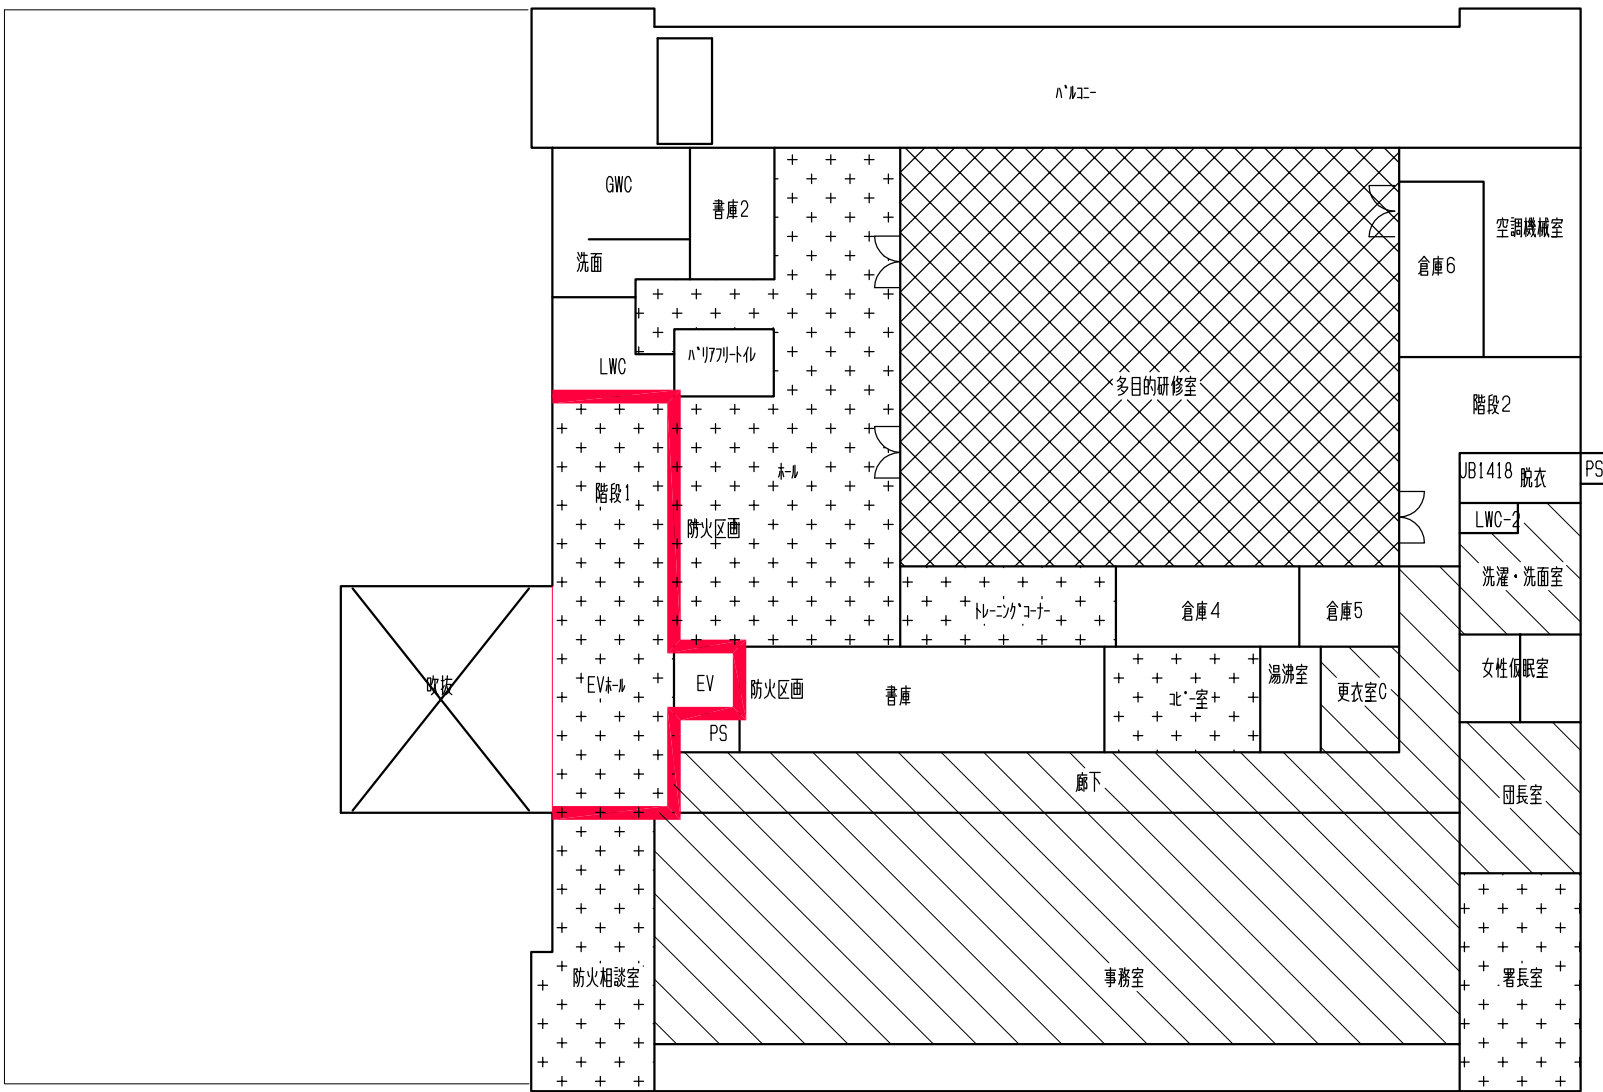

部屋のハッチング分けは空調系統を示す

2階 防火区画位置図

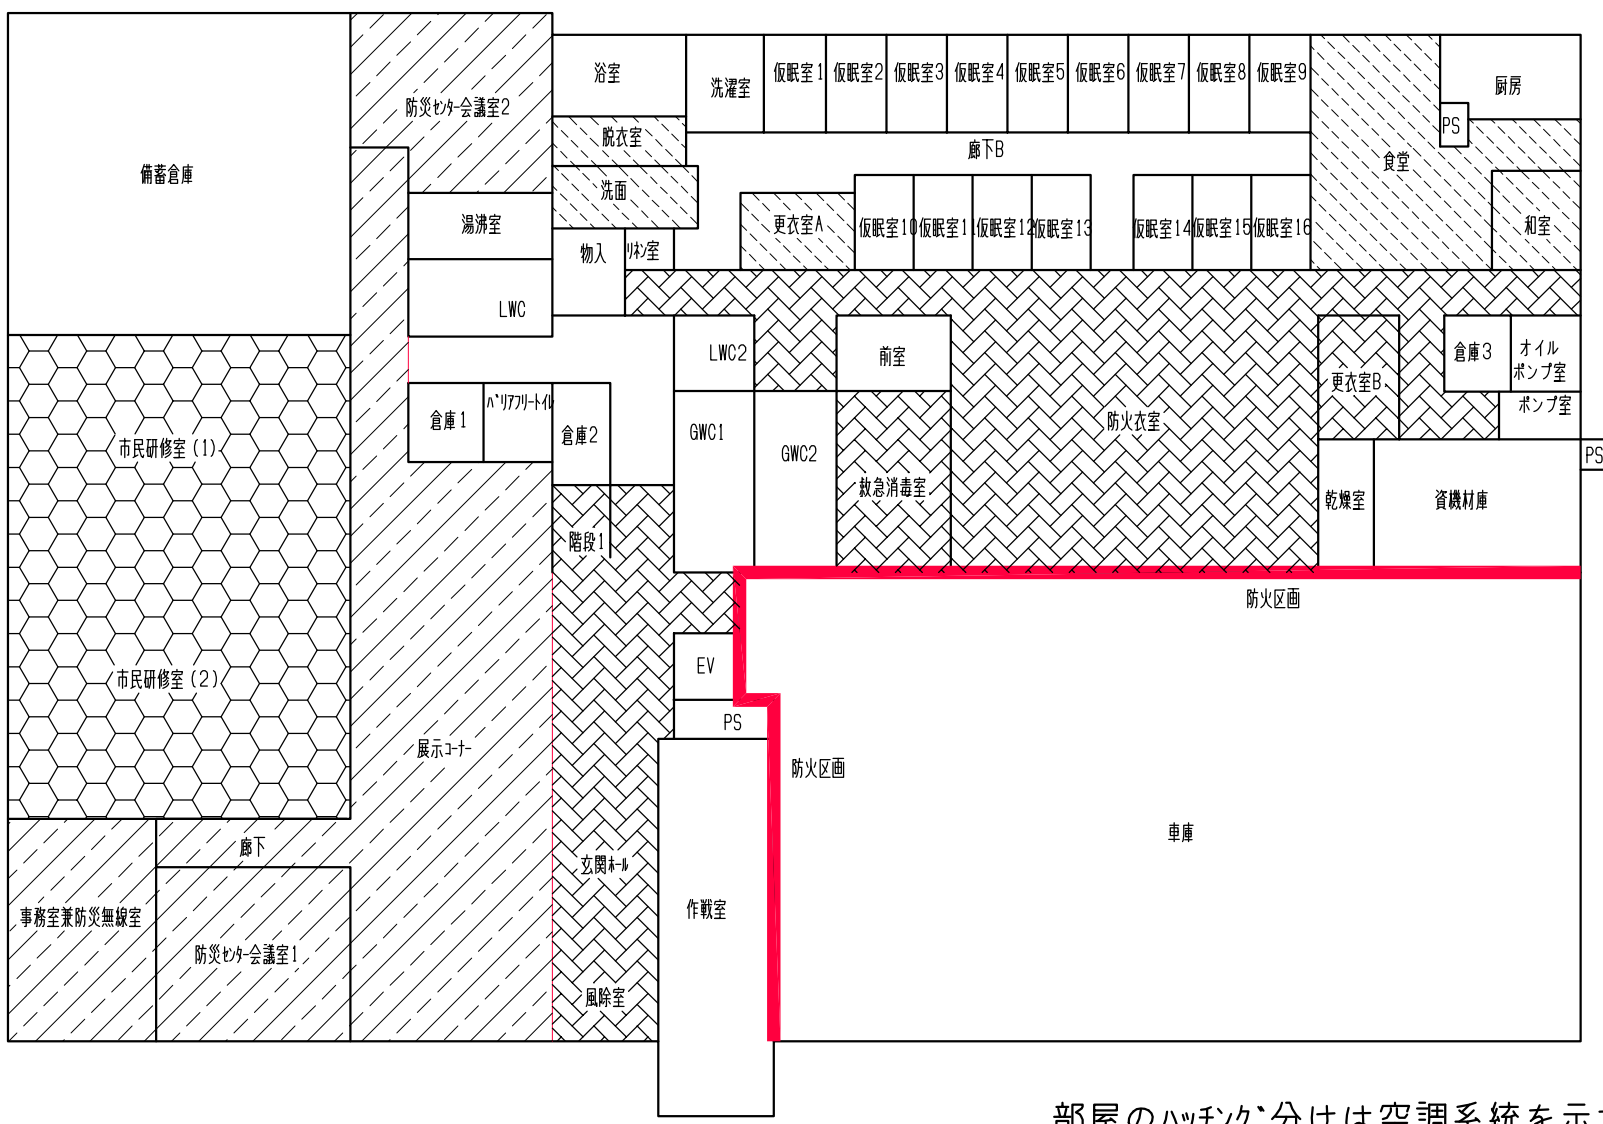


部屋のハッチング分けは空調系統を示す

1階 防火区画位置図

1階


防災会議室2解体撤去

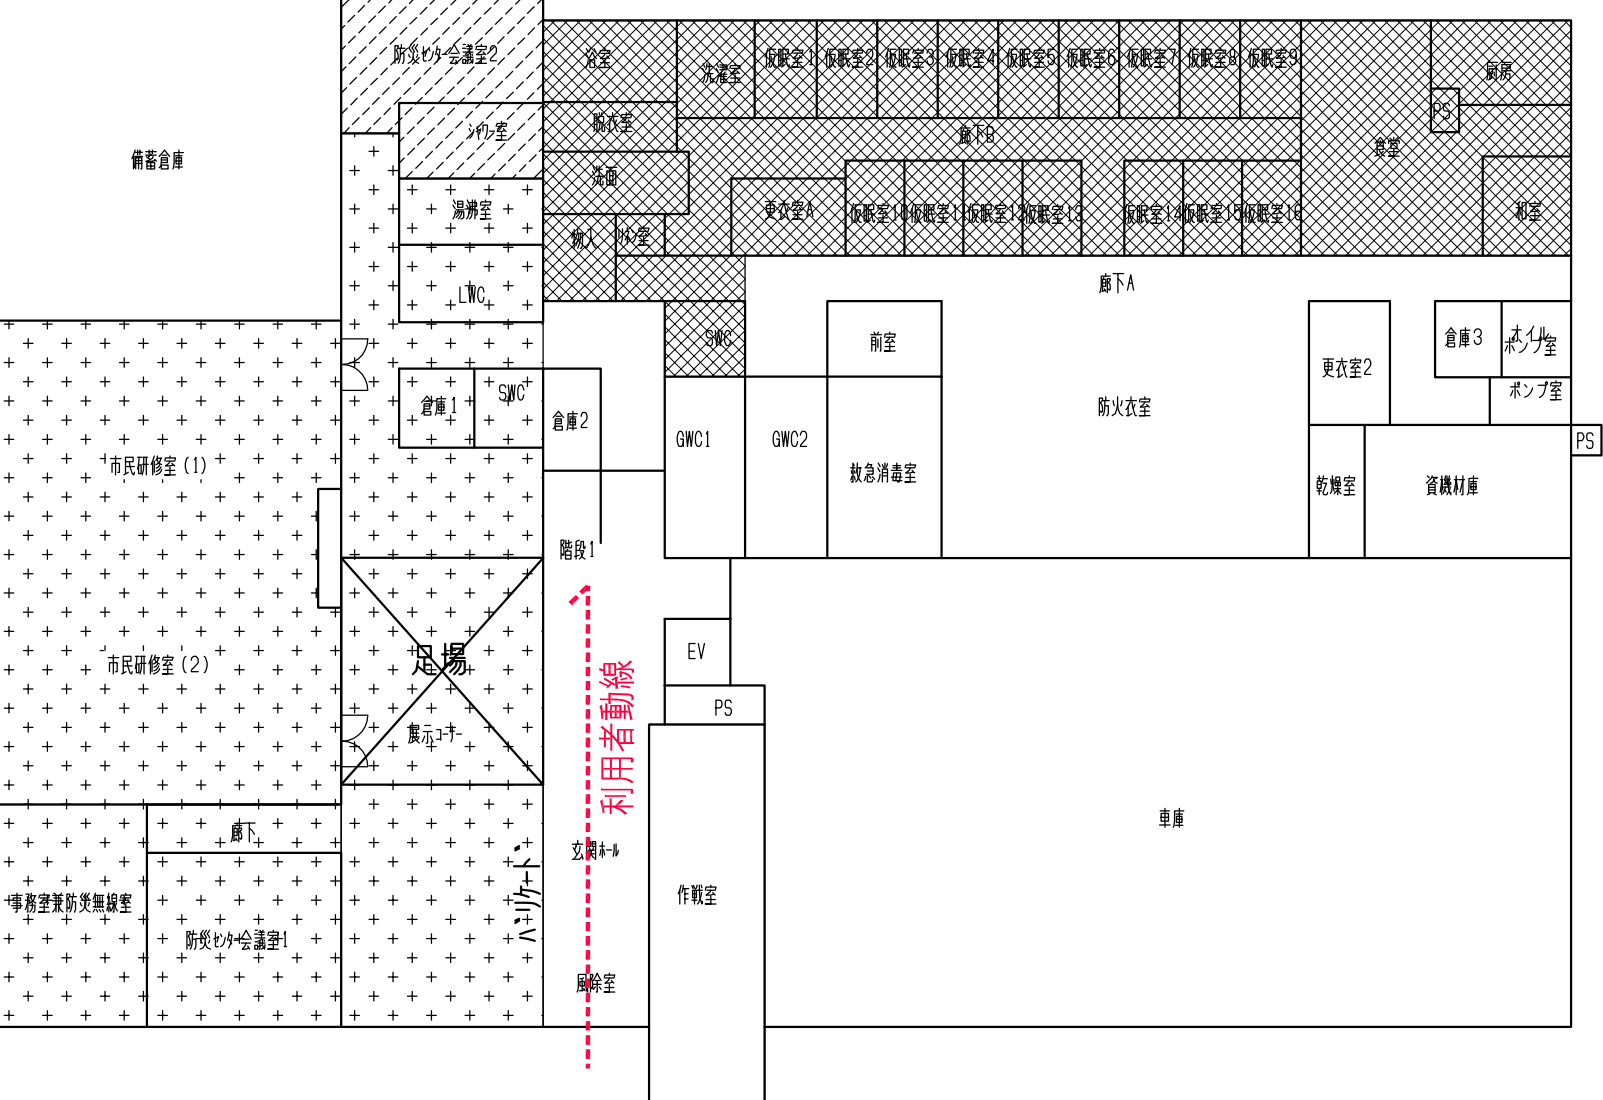

【概略工事内容】

- ★ 市民研修室他改修
- ★ 防災会議室2解体撤去
- ★ LWC・SWC改修
- ★ 仮眠室完了

防災会議室2解体改修

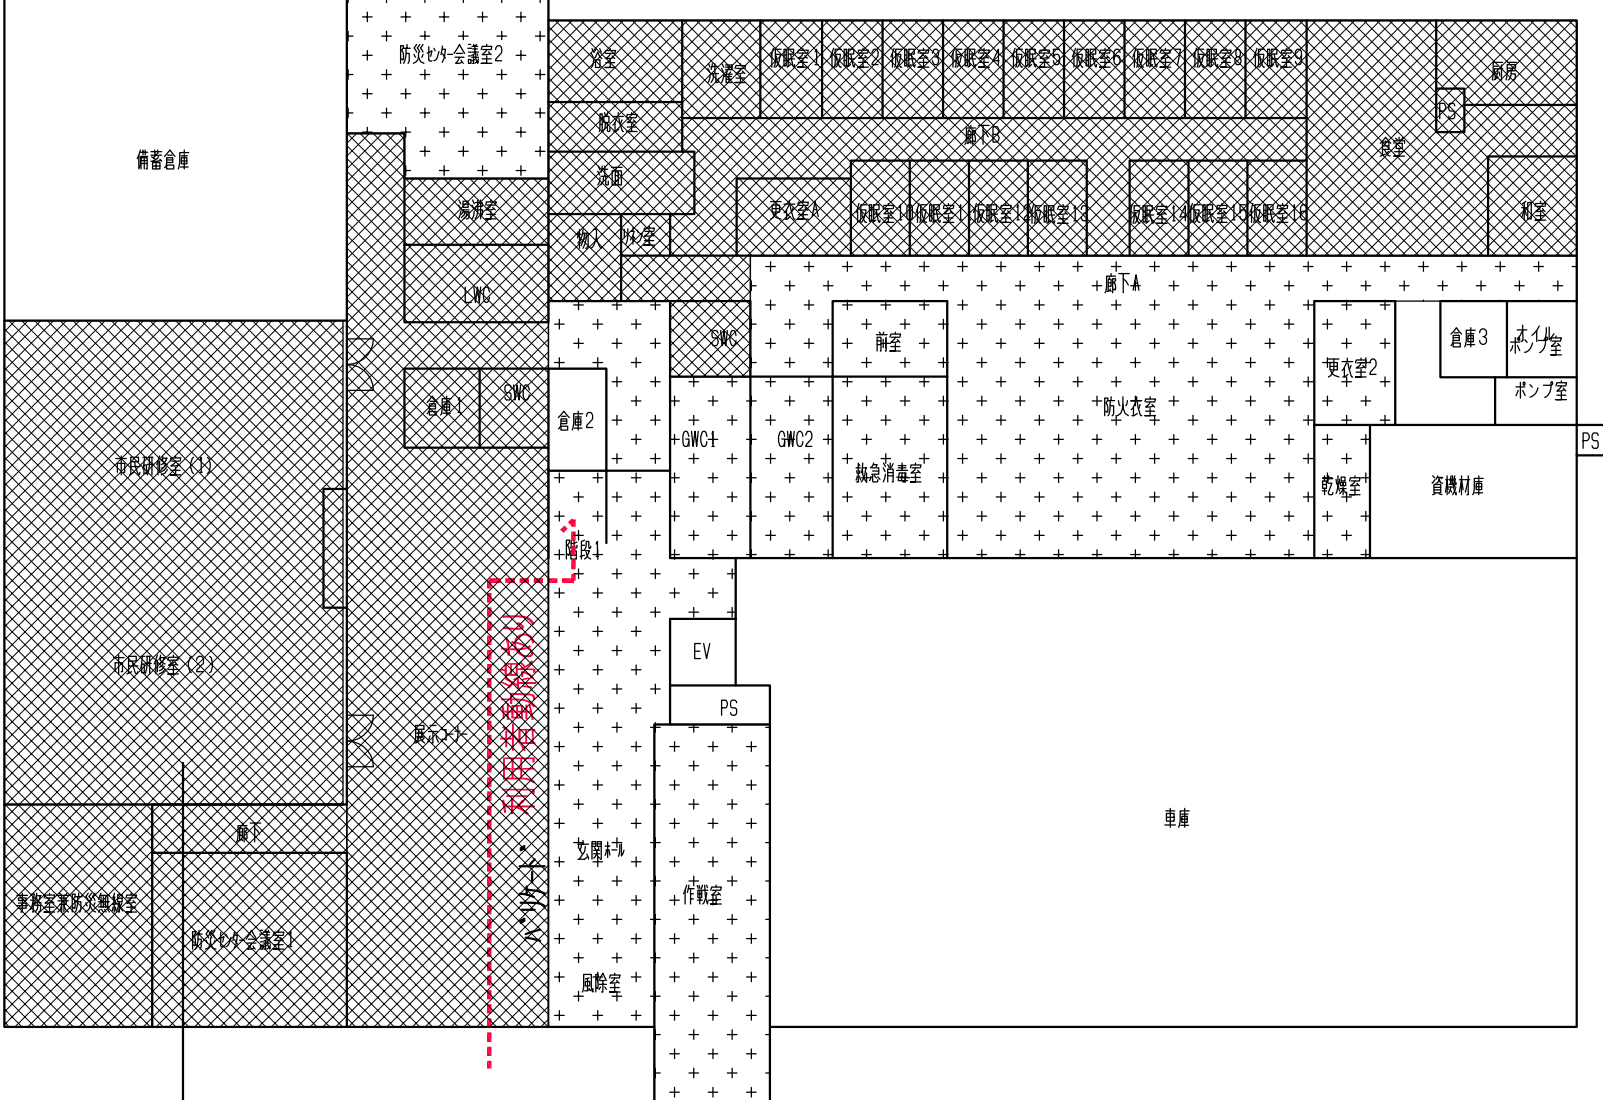


【概略工事内容】

- ★ 作戦室、防火衣室他随時改修
- ★ 市民研修室他完了
- ★ 防災会議室2改修
- ★ LWC・SWC完了


外部仕上げ表										既存建材製品中のアスベスト含有率測定結果											
屋根	既設			カーカ`ルハ`リウム銅板 t 0.4 嵌合式瓦棒葺	ｱｽﾌﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940	軒天3	既設			ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 外装薄塗材E	調査場所	部 位	石綿の有無	石綿の種類							
	改修			(既存のまま)			改修			アロンウオールST模様吹きのスエツﾌﾞｺｰﾄ2回											
ｸﾗﾌﾞ幕板	既設			幕板：カーカ`ルハ`リウム銅板		外壁 A	既設			ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 複層仕上げ塗材R E	外壁吹付材	仕上げ材	不検出								
	改修			下地処理の上ｶﾗﾌ塗装塗			改修			水洗い工法 10～15Mpa 外壁用ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水材 ｱﾛﾝｳｵｰﾙST工法（吹付）											
屋上（陸屋根）	既設			ｱｽﾌﾙﾄ防水（A1-2） ﾎﾟﾘｿﾌﾚﾝﾌｫｰﾑt25 押えｺﾝｸﾘｰﾄt80 伸縮目地w20 撤去	立上り 乾式立上り（成型ﾍﾞｰﾄﾞ板t15） 撤去	外壁 B	既設			ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 外装薄塗材E	ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ	仕上げ材	不検出								
	改修			水洗い工法10～15Mpa 改質ｱｽﾌﾙﾄ防水 ｸﾏｼﾞｽﾑｰﾌ 露出絶縁工法	目地PUシーリング`		改修			水洗い工法 10～15Mpa 外壁用ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水材 ｱﾛﾝｳｵｰﾙST模様吹きのスエツﾌﾞｺｰﾄ2回											
ﾊﾞﾙｺﾆｰ	既設			ｱｽﾌﾙﾄ防水（A1-2） ﾎﾟﾘｿﾌﾚﾝﾌｫｰﾑt25 押えｺﾝｸﾘｰﾄt80 伸縮目地w20 撤去	立上り 乾式立上り（成型ﾍﾞｰﾄﾞ板t15） 撤去	外壁 C	既設			ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 保護材【ﾍﾞﾐｸﾘｰﾄ工法】	ﾋﾞﾆｰﾙ巾木	仕上げ材	不検出								
	改修			ケレン清掃の上 ウレタン塗膜防水X-1工法	目地PUシーリング`		改修			水洗い工法 10～15Mpa 外壁用ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水材 ｱﾛﾝｳｵｰﾙST工法（吹付）											
庇	既設			防水ﾏﾙｸｺｰﾁｰ押え		外壁 D・E・F	既設			磁器質150角ﾀｲﾙ貼 せつ器質ﾀｲﾙ貼（小口・2丁掛） ﾏﾞﾗﾝｸﾞﾀｲﾙ100×50貼	内部塗装（EP）	仕上げ材	不検出								
	改修			ケレン清掃の上 ウレタン塗膜防水X-1工法			改修			下地処理：酸洗い 外壁ﾀｲﾙ剥落防止工法 ﾎﾟﾝﾄﾞｱｸｱﾌｧｲﾝﾄﾞ工法											
軒天1	既設			ﾀｲﾙﾙ板t6 底目貼り VP塗 撤去			既設				天井材（ﾀｲﾙﾙ板）	繊維強化板	不検出								
	改修			ﾀｲﾙﾙ板t6張替 底目貼り EP塗			改修														
軒天2	既設			ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 保護材【ﾍﾞﾐｸﾘｰﾄ工法】							防水 乾式立上り材	押出成形ﾍﾞｰﾄﾞ板	有	ｸﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ							
	改修			アロンウオールST模様吹きのスエツﾌﾞｺｰﾄ2回																	
コミュニティ防災センター ㊦通り～㊧通り										吹付材（A） 複層仕上げ塗材R E 吹付材（I） 複層仕上げ塗材R E		石綿含有部分の解体等工事時に石綿含有仕上塗材として除去を行い、 廃棄物処理法に基づいて石綿含有廃棄物として処理する事									
										吹付材（B） 外装薄塗材E											
内部仕上げ表																					
階	室 名		床高	天井高さ	床仕上	巾木	壁	天井	天井下地	廻縁	ｸﾞﾗｽﾜｰﾙ	ｶｰﾅｰ	ﾌﾗｲﾝﾄﾞ	備考	AC	換気設備	照明器具	室 名			
1階	展示コーナー	既設	1FL±0	7800～8900	御影石400×400 JB仕上	御影石JB仕上 H100	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材（1）	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上吹付材（1）	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`			ｸﾞｰﾑ機撤去		更新	更新	更新	展示コーナー		
		改修	1FL±0	7800～8900	既存のまま		既存のまま	下地処理の上、トップコート	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`						更新	更新	更新	展示コーナー	
	廊下	既設	1FL±0	2515	防滑性長尺塩ビｼｰﾄt2.5 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材（1）	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上吹付材（1）	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`					/	更新	更新	廊下		
		改修	1FL±0	2515	防滑性長尺塩ビｼｰﾄt2.5貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	下地処理の上、トップコート	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`							/	更新	更新	廊下	
	防災ﾍﾞｰﾙ会議室1	既設	1FL±0	2880	長尺塩ビｼｰﾄt2.5 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`		○			更新	更新	更新	防災ﾍﾞｰﾙ会議室1		
		改修	1FL±0	2880	長尺塩ビｼｰﾄt2.5貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	無機質壁紙 張替	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`							更新	更新	更新	防災ﾍﾞｰﾙ会議室1	
	事務室兼防災無線室	既設	1FL±0	2880	ﾀｲﾙﾙﾍﾞｰｼｯﾄt6.5 撤去 O A ｼｵﾌﾞ（既存のまま）	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`		○			更新	更新	更新	事務室兼防災無線室		
		改修	1FL±0	2880	ﾀｲﾙﾙﾍﾞｰｼｯﾄt6.5貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	無機質壁紙 張替	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`							更新	更新	更新	事務室兼防災無線室	
	市民研修室1	既設	1FL±0	2880 3360	防滑性長尺塩ビｼｰﾄt2.5 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材（1）	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上吹付材（1）	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`		○			更新	更新	更新	市民研修室1		
		改修	1FL±0	2880 3360	防滑性長尺塩ビｼｰﾄt2.5貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	下地処理の上、トップコート	無機質壁紙張替	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`						更新	更新	更新	市民研修室1	
	市民研修室2	既設	1FL±0	2880 3360	防滑性長尺塩ビｼｰﾄt2.5 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材（1）	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上吹付材（1）	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`		○			更新	更新	更新	市民研修室2		
		改修	1FL±0	2880 3360	防滑性長尺塩ビｼｰﾄt2.5貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	下地処理の上、トップコート	無機質壁紙張替	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`						更新	更新	更新	市民研修室2	
	備蓄倉庫	既設	1FL-20	直天	ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え 無機系硬質塗床塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H200	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		木繊維ﾍﾞｰﾄﾞ板t25打込み							/	更新	LED化済	備蓄倉庫		
		改修	1FL-20	直天	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま								/	更新	LED化済	備蓄倉庫	
	倉庫1	既設	1FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄt2.5	ｼｯﾄ巾木H60	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上E P塗		化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5	LGS	塩ビ`					/	/	更新	倉庫1		
		改修	1FL±0	2515	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま		既存						/	更新	倉庫1		
	SWC	既設	1FL-15	2300	磁器質50角ﾀｲﾙ張 撤去	ﾏﾙｸﾙ下地		半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5 撤去	LGS 撤去	塩ビ`					更新	更新	SWC			
		改修	1FL±0	2285	長尺塩ビｼｰﾄt2.5	ﾏﾙｸﾙﾍﾞｰｼｯｸ`	ｼｯﾄ巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3（onﾀｲﾙ工法）	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5	LGS	塩ビ`					更新	更新	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾙ			
	LWC	既設	1FL-15	2300	磁器質50角ﾀｲﾙ張 撤去	ﾏﾙｸﾙ下地		半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5 撤去	LGS 撤去	塩ビ`				洗面ｶﾝﾀﾞ撤去		更新	更新	LWC		
		改修	1FL±0	2285	長尺塩ビｼｰﾄt2.5	ﾏﾙｸﾙﾍﾞｰｼｯｸ`	ｼｯﾄ巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3（onﾀｲﾙ工法）	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5	LGS	塩ビ`						更新	更新	LWC		
湯沸室	既設	1FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄt2.5 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張 撤去	1部半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`					/	更新	更新	湯沸室			
	改修	1FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄt2.5 貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張替		化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5	既存流用 一部補修	塩ビ`					/	更新	更新	湯沸室			
ｼｬﾂ室	既設	1FL±0	2300	長尺塩ビｼｰﾄt2.5 撤去	ﾏﾙｸﾙ下地 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張 撤去	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5 撤去	LGS 撤去	塩ビ`				ｺﾝﾄｼｬﾂ0808 撤去				ｼｬﾂ室			
防災ﾍﾞｰﾙ会議室2	既設	1FL±0	2880	無垢3層ﾌﾛｰｼｯｸ`t14 ｱﾝﾀﾞｰｼｰﾄt5 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張		ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 撤去	塩ビ`		○			更新	更新	更新	防災ﾍﾞｰﾙ会議室2			
	改修	1FL±0	2880	ﾌﾛｰｼｯｸ`t15 一部ﾏﾙｸﾙ下地補修	ｼｯﾄ巾木H60張	無機質壁紙 LGS65下地石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5下地		ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	LGS	塩ビ`					更新	更新	更新	防災ﾍﾞｰﾙ会議室2			
内部仕上げ表 北消防署 ㊦通りへの通り																					
階段1	既設				ｺﾞﾑﾀｲﾙt3 撤去	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材（1）	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`					/	/	更新	階段1			
	改修				ｺﾞﾑﾀｲﾙt3 貼替	ｼｯﾄ巾木H60張替	下地処理の上、トップコート	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`						/	更新	階段1			
階段2	既設				ｺﾞﾑﾀｲﾙt3	ｼｯﾄ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張	石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t12.5の上無機質壁紙張	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5 撤去	LGS 撤去	塩ビ`				/	/	更新	階段2			
	改修				既存のまま	ｼｯﾄ巾木H60張替	無機質壁紙張替	化粧石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5	LGS	塩ビ`						/	更新	階段2			
1階	風除室	既設	1FL±0	3360	せつ器質200×100ﾀｲﾙ張		せつ器質2丁掛	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材（1）	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ビ`				/	/	更新	風除室			
	改修	1FL±0	3360	既存のまま			既存のまま	下地処理の上、トップコート	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t9 石こうﾎﾟｰﾄﾞ`t9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ビ`					/	更新	風除室			
										守山コミュニティ防災センター・湖南広域消防局北消防署改修工事（建築工事）										SCALE	NO
										DATE 2026 仕上げ表1											A-07
										株式会社 内 堀 建 築 設 計 事 務 所 1級建築士登録第148816号 和田 茂											

北消防署																									
階	室 名		床高	天井高さ	床仕上		巾木	壁		天井		天井下地		廻縁	ガラス	カーテン	ブラインド	備考	AC	換気設備	照明器具	室 名			
1階	玄関ホール	既設	1FL±0	3360	御影石400×400 JB仕上		御影石JB仕上 H100	コンクリト打放しの上吹付材（1）		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼 撤去		LGS 既存利用		塩ビ					更新	更新	更新	玄関ホール			
		改修	1FL±0	3360	既存のまま			下地処理の上、トップコート		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼 貼替		既存流用 一部補修		塩ビ											
	受付 作戦室	既設	1FL±0	2880	コタイルt5 撤去 O A707 （既存のまま）		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上無機質壁紙張 石こうボードt12.5の上無機質壁紙張		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼 撤去		LGS 既存利用		塩ビ			○ 撤去	天井吊り下げ形 フレックカー 撤去	更新	更新	更新	受付 作戦室			
		改修	1FL±0	2880	コタイルt5 貼替		ソク巾木H60張替	無機質壁紙 張替		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼 貼替		既存流用 一部補修		塩ビ			○	天井吊り下げ形 フレックカー 取替							
	車庫	既設	1FL-20 ~200		コンクリトこて押え 無機系硬質塗床塗		コンクリト打放し H200	コンクリト打放し		木繊維外板t25打込み										更新	更新	車庫			
		改修	1FL-20 ~200		既存のまま		既存のまま	既存のまま		既存のまま															
	前室	既設	1FL±0	2515	コタイルt3		ソク巾木H60	コンクリト打放しの上EP塗 モルタルこて押え EP塗		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS		塩ビ						更新	更新	前室			
		改修	1FL±0	2515	既存のまま		既存のまま	下地処理の上、EP塗替		化粧石こうボードt9.5 貼替															
	救急消毒室	既設	1FL±0	2515	磁器質50角タイル張			半磁器質100角タイル張		バリア7張（防露断熱裏打） 撤去		LGS		塩ビ			○ 撤去	シャワーカーテン、カーテンロール撤去	更新	更新	更新	救急消毒室			
		改修	1FL±0	2515	クリーニング		ソク巾木H60張	下地処理の上 メラミン化粧板t3（onタイル工法）		バスパネル （不燃）						○	シャワーカーテン、カーテンロール取替								
	防火衣室	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上EP塗 石こうボードt12.5の上EP塗		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 既存利用		塩ビ				防火衣ロッカー	更新	更新	更新	防火衣室			
		改修	1FL±0	2515	コタイルt3 貼替		ソク巾木H60張替	下地処理の上、EP塗替		化粧石こうボードt9.5 貼替		既存流用 一部補修		塩ビ				防火衣ロッカー（既存のまま）							
	乾燥室	既設	1FL±0	2515	磁器質50角タイル張		磁器質50角タイル張	コンクリト打放しの上VP塗		タイル板t6底目張 VP塗 撤去		LGS 既存利用		塩ビ				SUSバンプ （既存のまま）	更新	既存のまま	更新	乾燥室			
		改修	1FL±0	2515	既存のまま		既存のまま	既存のまま		タイル板t6底目張替 EP塗 貼替		既存流用 一部補修		塩ビ											
	資機材庫	既設	1FL±0 ~20	2515	コンクリトこて押え 無機系硬質塗床塗		コンクリト打放し H200	コンクリト打放し		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ						更新	更新	更新	資機材庫		
		改修	1FL±0 ~20	2515	既存のまま		既存のまま	既存のまま		既存のまま															
	更衣室2	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上無機質壁紙張		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 既存利用		塩ビ					更新	更新	更新	更衣室2			
	更衣室B	改修	1FL±0	2515	タイルカーベツトt6.5 一部 長尺塩ビシートt2.5		ソク巾木H60張替	無機質壁紙 張替		化粧石こうボードt9.5 貼替		既存流用 一部補修		塩ビ						更新	更新	更新	更衣室B		
	女子仮眠室	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ			○	仮眠バット・棚・ユニットバス撤去				女子仮眠室			
	厨房	既設	1FL-50	2930	磁器質50角タイル張 撤去			半磁器質100角タイル張 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ				○ SUS流し台、SUS作業台 ガスコンロ、吊戸棚 撤去				厨房			
	食堂	既設	1FL±0	2880	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 撤去		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼 撤去		LGS 撤去		塩ビ				自販機一時移設				食堂			
	談話室	既設	1FL+250	2630	畳敷きt55 複合フローリングt15		撤去 木製床組 撤去	タタ寄せ 撤去	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 撤去		杉珪化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		木製			○				談話室			
	消防隊・救助隊 救急隊仮眠室	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 撤去 E通りGL工法 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ			○	仮眠バット・棚・収納棚 撤去				消防隊・救助隊 救急隊仮眠室			
	更衣室1	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ			○					更衣室1			
	仮眠室1~16	改修	1FL±0	2515	タイルカーベツトt6.5 一部 長尺塩ビシートt2.5		ソク巾木H60	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 E通りGL工法		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼		LGS		塩ビ	○		○	タタバット、コト掛け、吊戸棚	更新	更新	更新	仮眠室1~16			
	更衣室A	改修	1FL±0	2515	タイルカーベツトt6.5 一部 長尺塩ビシートt2.5		ソク巾木H60	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ	○			スリム更衣ロッカー（3人用）	更新	更新	更新	更衣室A			
廊下B	改修	1FL±0	2515	コタイルt3		ソク巾木H60	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ				個人ロッカー	更新	更新	更新	廊下B				
食堂	改修	1FL±0	2880	コタイルt3 貼替 モルタル補修		ソク巾木H60	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張 E通りGL工法		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼		LGS		塩ビ	○		○	自販機復旧	更新	更新	更新	食堂				
厨房	改修	1FL±0	2880	長尺塩ビシートt2.5 モルタル補修		ソク巾木H60	防水石こうボードt12.5の上 メラミン化粧板t3張		ロウカー吸音板t9 石こうボードt9.5捨貼		LGS		塩ビ	○		○	SUS流し台、SUS作業台 ガスコンロ台、ガスバー、吊戸棚	更新	更新	更新	厨房				
和室	改修	1FL+250	2630	畳敷きt55 複合フローリングt12（ひのき）		木製床組	木製巾木H100 OS塗	石こうボードt12.5の上無機質壁紙張		石こうボードt9.5 無機質壁紙張		LGS		木製 OS塗	○		○	更新	更新	更新	和室				
洗面所	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上EP塗 石こうボードt12.5の上EP塗		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ					更新	更新	更新	洗面所				
洗濯室	改修	1FL±0	2515	コタイルt3 貼替		ソク巾木H60	防水石こうボードt12.5の上 メラミン化粧板t3張		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ				収納棚								
SWC	既設	1FL-15	2300	磁器質50角タイル張 撤去 珪藻土下地			半磁器質100角タイル張		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ					更新	更新	更新	SWC				
LWC2	改修	1FL±0	2285	長尺塩ビシートt2.5 珪藻土ベリソク		ソク巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3（onタイル工法）		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ												
GWC1	既設	1FL-15	2300	磁器質50角タイル張 撤去 珪藻土下地			半磁器質100角タイル張		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ				洗面カゴタ撤去	更新	更新	更新	GWC1				
	改修	1FL±0	2285	長尺塩ビシートt2.5 珪藻土ベリソク		ソク巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3（onタイル工法）		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ												
GWC2	既設	1FL-15	2300	磁器質50角タイル張 撤去 珪藻土下地			半磁器質100角タイル張		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ				洗面カゴタ撤去	更新	更新	更新	GWC2				
	改修	1FL±0	2285	長尺塩ビシートt2.5 珪藻土ベリソク		ソク巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3（onタイル工法）		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ												
倉庫2	既設	1FL±0	直天	長尺塩ビシートt2.5		ソク巾木H60	コンクリト打放し		コンクリト打放し									更新	更新	更新	倉庫2				
	改修	1FL±0		既存のまま		既存のまま	既存のまま		既存のまま																
倉庫3	既設	1FL+3000	1400	コンクリトこて押え		コンクリト打放し H200	コンクリト打放し		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ					更新	更新	更新	倉庫3				
	改修			既存のまま		既存のまま	既存のまま		既存のまま																
廊下A	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上EP塗 石こうボードt12.5の上EP塗 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ					更新	更新	更新	廊下A				
	改修	1FL±0	2515	コタイルt3 貼替		ソク巾木H60	下地処理の上、EP塗替 石こうボードt12.5の上EP塗		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ												
リヤ室	既設	1FL±0	2515	コタイルt3 撤去		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上EP塗 石こうボードt12.5の上EP塗 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ					更新	更新	更新	リヤ室				
物入	改修	1FL±0	2515	コタイルt3 貼替		ソク巾木H60	下地処理の上、EP塗替 石こうボードt12.5の上EP塗		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ				収納棚								
脱衣室	既設	1FL±0 1FL+150	2550 2400	ビコタイルt2 木製床組 撤去		ソク巾木H60 撤去	コンクリト打放しの上ビコタイル張 撤去		化粧石こうボードt9.5 撤去		LGS 撤去		塩ビ					更新	更新	更新	脱衣室				
洗面	改修	1FL±0	2550	長尺塩ビシートt2.5 珪藻土ベリソク		ソク巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3		化粧石こうボードt9.5		LGS														
浴室	既設	1FL+100	2300~2400	磁器質50角タイル張 撤去 モルタル下地 撤去			半磁器質100角タイル張 撤去		バリア7張（防露断熱裏打） 撤去		LGS 撤去		塩ビ				タリ浴槽 撤去	更新	更新	更新	浴室				
	改修	1FL+100	2300~2400	磁器質150角タイル張 モルタル下地			磁器質150角タイル張替		バスパネル （不燃）		LGS		塩ビ												
リヤ室	改修	1FL±0	2515	コタイルt3 貼替		ソク巾木H60	石こうボードt12.5の上EP塗		化粧石こうボードt9.5		LGS		塩ビ				収納棚	更新	更新	更新	リヤ室				
脱衣室	改修	1FL+150	2400	長尺塩ビシートt2.5 モルタル下地		ソク巾木H60	下地処理の上 メラミン化粧板t3		化粧石こうボードt9.5		LGS			塩ビ				脱衣棚	更新	更新	更新	脱衣室			
												守山コミュニティ防災センター・湖南広域消防局北消防署改修工事（建築工事）										SCALE	NO		
												DATE 2026		仕上げ表2										A-08	
												株式会社 内 堀 建 築 設 計 事 務 所 1級建築士登録第148816号 和田 茂													

北消防署																			
①通り～③通り																			
内部仕上表																			
階	室 名		床高	天井高さ	床仕上	巾木	壁	天井	天井下地	廻縁	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｶｰﾃﾝ	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	備考	AC	換気設備	照明器具	室 名	
2階	多目的研修室	既設	2FL±0	4080 ～5760	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 撤去	ﾎﾟﾗｽﾀﾘ 付け H60	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張 ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ	撤去		電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞのみ撤去		更新	更新	更新	多目的研修室	
		改修	2FL±0	4080 ～5760	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 貼替	CL塗替	無機質壁紙張替 ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○		○						
	倉庫4	既設	2FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5	ｼｵｵ巾木H60	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上EP塗	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ					/	/	既存のまま	倉庫4	
		改修	2FL±0	2515	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま										
	倉庫5	既設	2FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5	ｼｵｵ巾木H60	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上EP塗	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ					/	/	既存のまま	倉庫5	
		改修	2FL±0	2515	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま										
	倉庫6	既設	2FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5	ｼｵｵ巾木H60	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上EP塗	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ					/	/	既存のまま	倉庫6	
		改修	2FL±0	2515	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま										
	ﾄﾚｰﾅﾝｸﾞｺｰﾅｰ	既設	2FL±0	2515	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 撤去	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ					更新	更新	更新	ﾄﾚｰﾅﾝｸﾞｺｰﾅｰ	
		改修	2FL±0	2515	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 貼替	ｼｵｵ巾木H60張替	無機質壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○								
	署長室	既設	2FL±0	2880	ﾀｲﾙカーベｯﾄｿ6.5 撤去 ○Aフロア	ｼｵｵ巾木H60 撤去	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上箆物調整壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ			○ 撤去		ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ撤去	更新	更新	更新	署長室
		改修	2FL±0	2880	ﾀｲﾙカーベｯﾄｿ6.5 貼替 既存のまま	ｼｵｵ巾木H60張替	箆物調整壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○	○ ｶｰﾃﾞﾝﾚｰｽ		ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ、ﾚｰｽｶｰﾃﾞﾝ					
	団長室	既設	2FL±0	2880	ﾀｲﾙカーベｯﾄｿ6.5 撤去 ○Aフロア	ｼｵｵ巾木H60 撤去	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ			○ 撤去		ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ撤去	更新	更新	更新	団長室
		改修	2FL±0	2880	ﾀｲﾙカーベｯﾄｿ6.5 貼替 既存のまま	ｼｵｵ巾木H60張替	無機質壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○	○ ｶｰﾃﾞﾝﾚｰｽ		ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ、ﾚｰｽｶｰﾃﾞﾝ					
	事務室	既設	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ5 撤去 ○Aフロア	ｼｵｵ巾木H60 撤去	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ				○ 撤去	ﾛｰｶﾝﾀﾞｰ、窓下ｽﾃｰﾙ欄撤去	更新	更新	更新	事務室
		改修	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ5 貼替 既存のまま	ｼｵｵ巾木H60張替	無機質壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○			○	ﾛｰｶﾝﾀﾞｰ、窓下戸棚新設				
	防火相談室	既設	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ5 撤去 ○Aフロア	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ				○ 撤去	ﾛｰﾊﾞｰﾃｰｼﾞｵﾝ撤去	更新	更新	更新	防火相談室
		改修	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ5 貼替 既存のまま	ｼｵｵ巾木H60張替	無機質壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○			○	ﾛｰﾊﾞｰﾃｰｼﾞｵﾝ新設				
	廊下	既設	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 撤去	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ					更新	更新	更新	廊下	
		改修	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 貼替	ｼｵｵ巾木H60張替	無機質壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○								
	書庫	既設	2FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5	ｼｵｵ巾木H60	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上EP塗 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上EP塗	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ					/	更新	既存のまま	書庫	
		改修	2FL±0	2515	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま										
	北ﾌﾞｰｼﾑ	既設	2FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5	ｼｵｵ巾木H60	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ					更新	更新	更新	北ﾌﾞｰｼﾑ	
		改修	2FL±0	2515	既存のまま	既存のまま	既存のまま	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○								
	湯沸室	既設	2FL±0	2515	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾞﾙｳ張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾞﾙｳ張 1部半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ					/	更新	更新	湯沸室	
		改修	2FL±0	2515	既存のまま	ｼｵｵ巾木H60張替	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾞﾙｳ張替 下地処理の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3 (onﾀｲﾙ工法)	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ									
	WC 更衣室C	既設	2FL～15	2300	磁器質50角ﾀｲﾙ張 撤去 ﾏｲﾙｶﾞ下地		半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5 撤去	LGS 撤去	塩ﾋﾞ					/	更新	更新	WC	
		改修	2FL±0	2400	ﾀｲﾙカーベｯﾄｿ6.5 一部 長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 ﾏｲﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ｼｵｵ巾木H60	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾞﾙｳ張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ	○			ｽﾃｰﾙ更衣ﾛｯｶｰ (3人用)				更衣室C	
空調機械室	既設	2FL±0	2880	ｺﾝｸﾘｰﾄこて押え	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し H200	ｸﾞﾗｽｳｰﾙｿ50ｶﾞｽｸﾞﾙｳ押え	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	R/C	塩ﾋﾞ					/	更新	既存のまま	空調機械室		
	改修	2FL±0	2880	既存のまま		既存のまま	既存のまま												
SWC ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ	既設	2FL～15	2300	磁器質50角ﾀｲﾙ張 撤去 ﾏｲﾙｶﾞ下地		半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5 撤去	LGS 撤去	塩ﾋﾞ					/	更新	更新	SWC		
	改修	2FL±0	2285	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 ﾏｲﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ｼｵｵ巾木H60	下地処理の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3 (onﾀｲﾙ工法)	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ								ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ		
GWC	既設	2FL～15	2300	磁器質50角ﾀｲﾙ張 撤去 ﾏｲﾙｶﾞ下地		半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ				洗面ｶﾝﾀﾞｰ撤去	/	更新	更新	GWC		
	改修	2FL±0	2285	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 ﾏｲﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ｼｵｵ巾木H60	下地処理の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3 (onﾀｲﾙ工法)	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ										
LWC	既設	2FL～15	2300	磁器質50角ﾀｲﾙ張 撤去 ﾏｲﾙｶﾞ下地		半磁器質100角ﾀｲﾙ張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5 撤去	LGS 撤去	塩ﾋﾞ				洗面ｶﾝﾀﾞｰ撤去	/	更新	更新	LWC		
	改修	2FL±0	2285	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 ﾏｲﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	ｼｵｵ巾木H60	下地処理の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3 (onﾀｲﾙ工法)	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ										
ﾎｰﾙ	既設	2FL±0	3000 2745	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 撤去	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ	撤去	○	○		更新	更新	更新	ﾎｰﾙ		
	改修	2FL±0	3000 2745	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 貼替	ｼｵｵ巾木H60張替	無機質壁紙張替	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○	○	○							
EVﾎｰﾙ	既設	2FL±0	2515	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 撤去	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上吹付材 (1)	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 既存利用	塩ﾋﾞ					更新	更新	更新	EVﾎｰﾙ		
	改修	2FL±0	2515	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 貼替	ｼｵｵ巾木H60張替	下地処理の上、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	既存流用 一部補修	塩ﾋﾞ	○									
書庫2	既設	2FL±0	2745	ｺﾑﾀｲﾙｿ3 撤去	ｼｵｵ巾木H60 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上無機質壁紙張 石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 撤去	塩ﾋﾞ				ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾃﾞｿｼｵﾝ 撤去	/	更新	既存のまま	書庫		
	改修	2FL±0	2745	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5張替	ｼｵｵ巾木H60張替	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ										
会議室	既設	2FL±0	2880	ｺﾑﾀｲﾙｿ5 撤去 ○Aフロア H100 撤去	ｼｵｵ巾木H60 撤去	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 撤去	LGS 撤去	塩ﾋﾞ			○					会議室		
女性仮眠室	改修	2FL±0	2880	ﾀｲﾙカーベｯﾄｿ6.5 一部 長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 鋼製床組H100	ｼｵｵ巾木H60	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上無機質壁紙張	ﾛｯｸﾜｰﾙ吸音板ｿ9 石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5捨貼 貼替	LGS	塩ﾋﾞ	○	○ ｶｰﾃﾞﾝﾚｰｽ		ｸﾞﾗｽﾞﾍﾞｯﾄ、ｺｰﾄ掛け、吊戸棚、ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ	更新	更新	更新	女性仮眠室		
洗濯・洗面室	改修	2FL±0	2880	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 鋼製床組H100	ｼｵｵ巾木H60	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ	○	○ ｶｰﾃﾞﾝﾚｰｽ		個人ﾛｯｶｰ下足箱 ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ ｽﾃｰﾙ更衣ﾛｯｶｰ (2人用)	更新	更新	更新	洗濯・洗面室		
脱衣室	改修	2FL+100	2780	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 鋼製床組H200	ｼｵｵ巾木H60	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ	○	○ ｶｰﾃﾞﾝﾚｰｽ		脱衣棚 ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ	/	更新	更新	脱衣室		
UB	改修			ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ仕様 (機械設備工事)													UB		
LWC-2	改修	2FL±0	2400	長尺塩ビｼｰﾄｿ2.5 鋼製床組H200	ｼｵｵ巾木H60	石こうﾎｰﾄﾞｿ12.5の上 ﾊﾞﾚｰﾐﾝ化粧板ｿ3張	化粧石こうﾎｰﾄﾞｿ9.5	LGS	塩ﾋﾞ								LWC-2		
									守山コミュニティ防災センター・湖南広域消防局北消防署改修工事（建築工事）						SCALE	NO			
									DATE 2026 仕上げ表3								A-09		
									株式会社 内 堀 建 築 設 計 事 務 所 1級建築士登録第148816号 和田 茂										

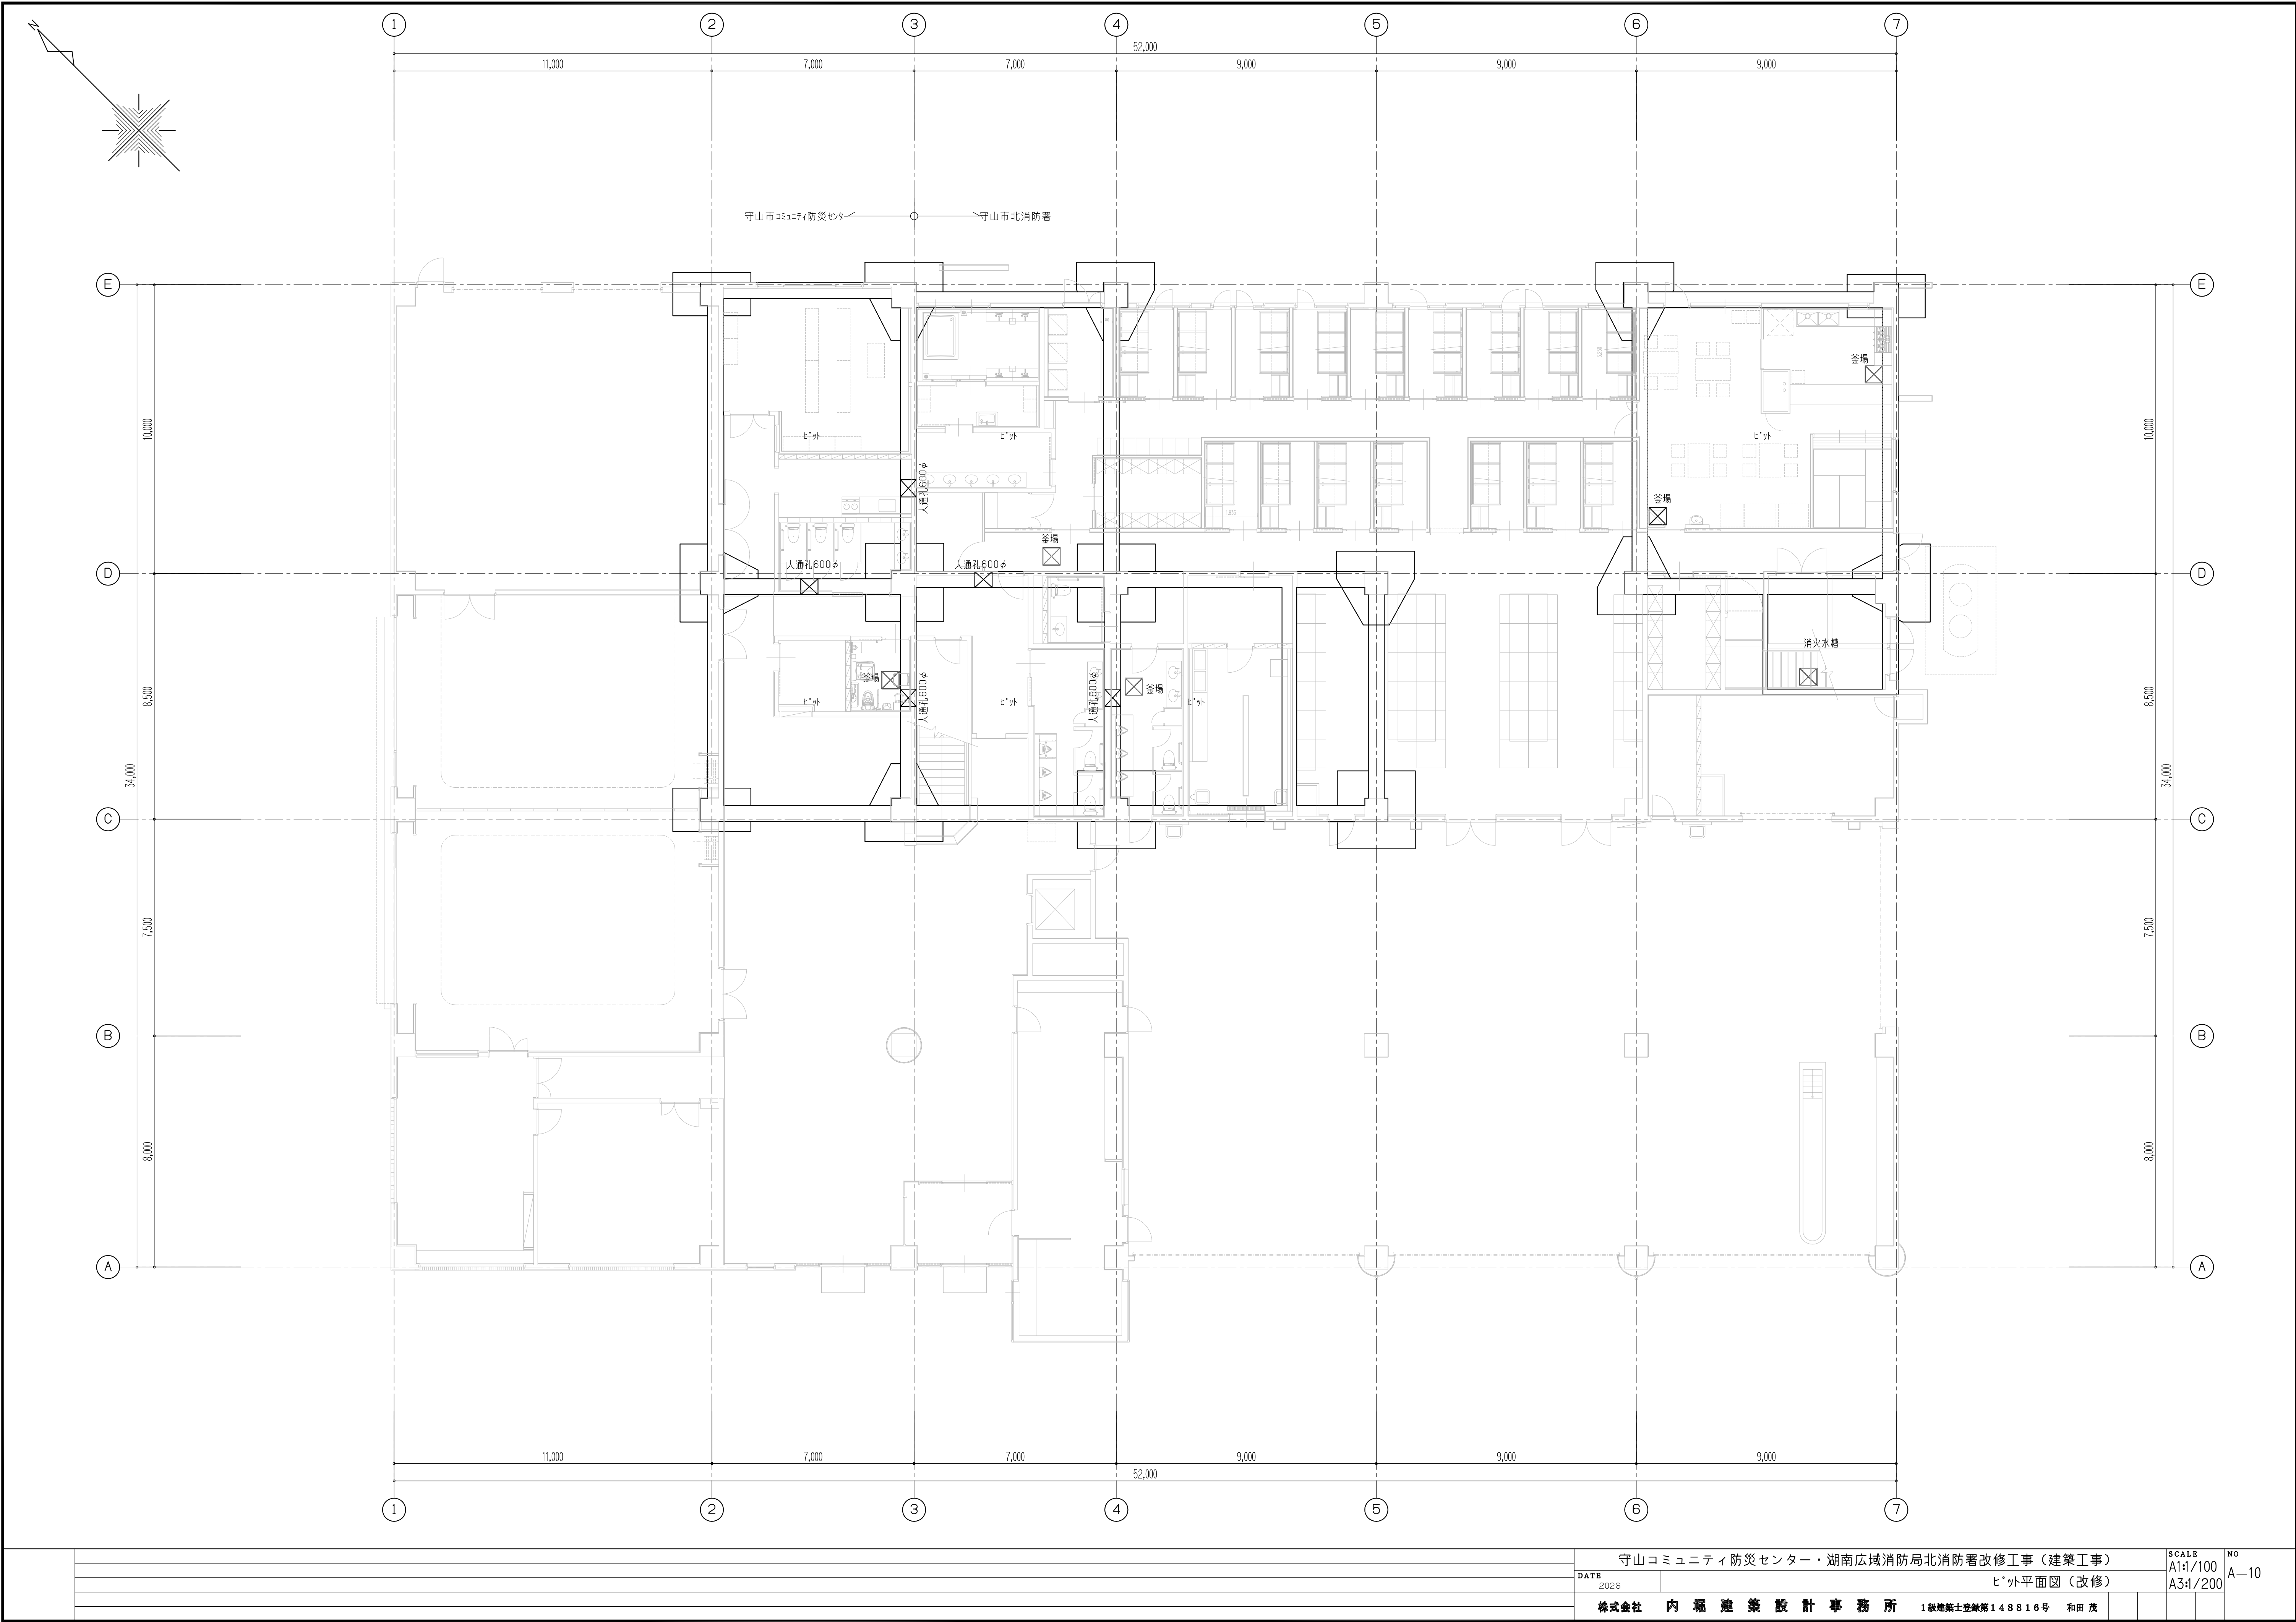

										守山コミュニティ防災センター・湖南広域消防局北消防署改修工事（建築工事）										SCALE		NO							
										DATE		ヒ'外平面図（改修）										A1:1/100		A-10					
										2026												A3:1/200							
										株式会社		内堀建築設計事務所										1級建築士登録第148816号		和田茂					

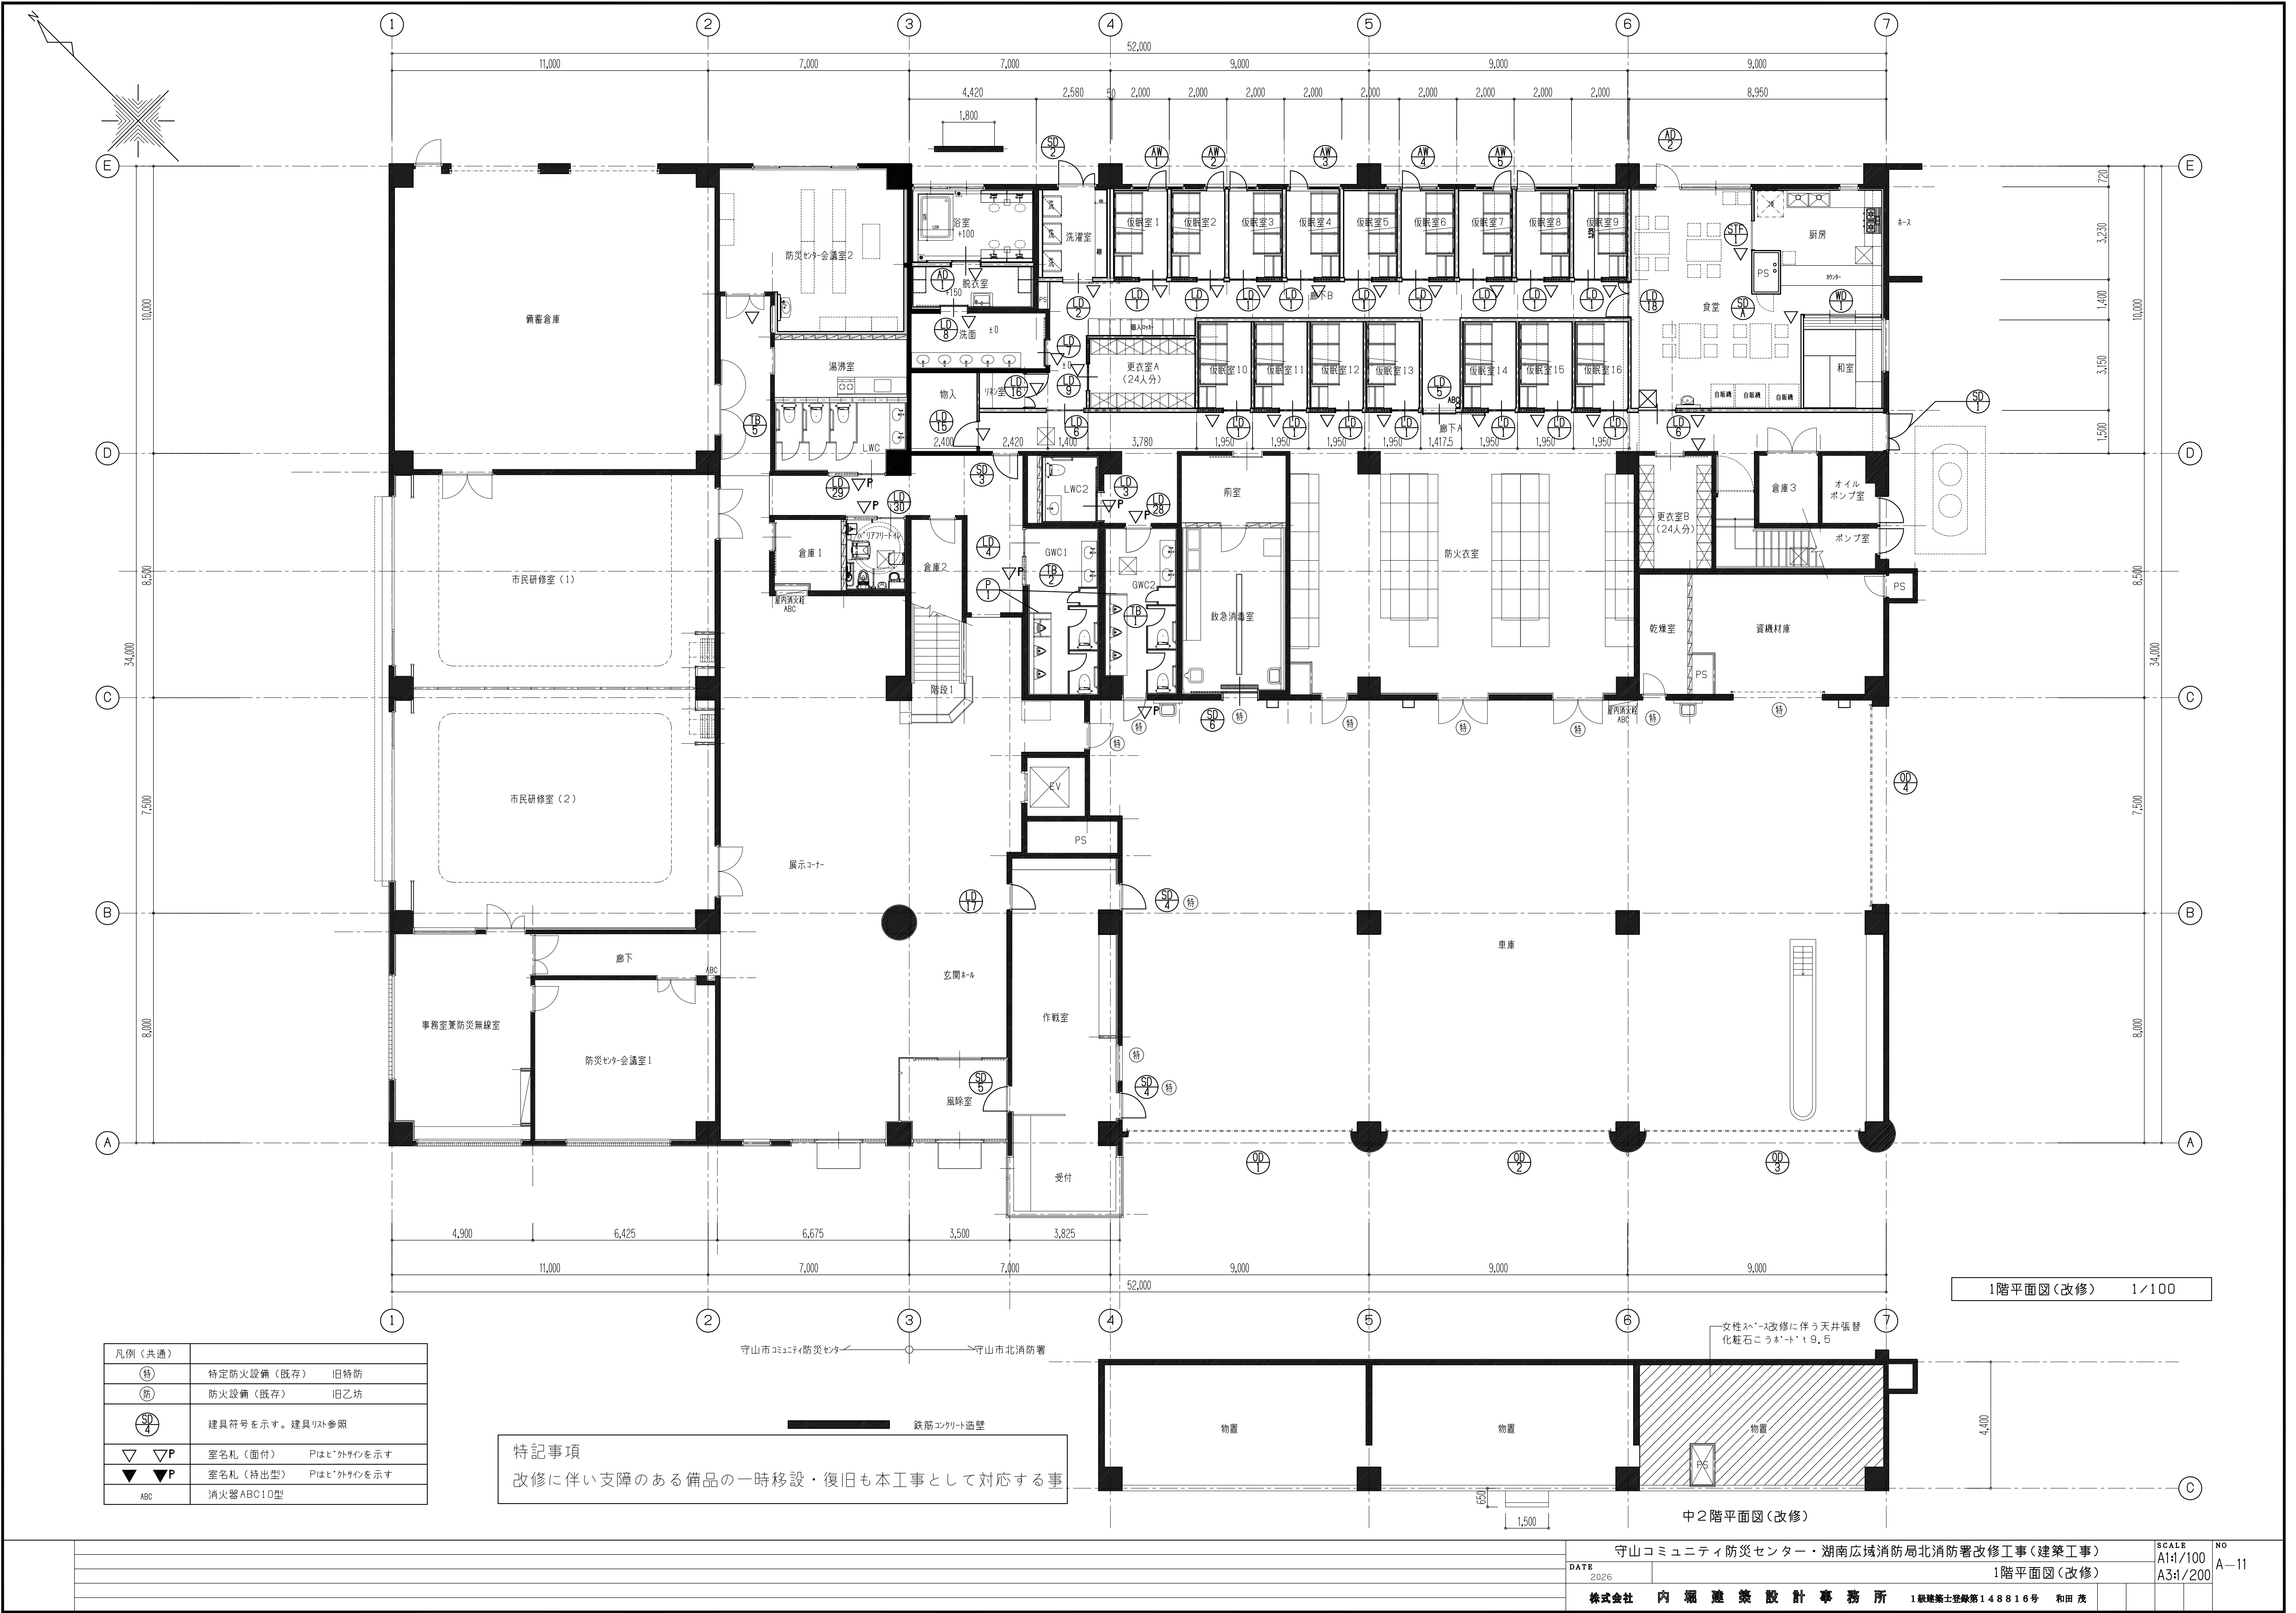


凡例（共通）		
Ⓔ	特定防火設備（既存）	旧特防
防	防火設備（既存）	旧乙防
SP-4	建具符号を示す。建具リスト参照	
▽▽P	室名札（面付）	Pはヒト外サインを示す
▼▼P	室名札（持出型）	Pはヒト外サインを示す
ABC	消火器ABC10型	


特記事項
改修に伴い支障のある備品の一時移設・復旧も本工事として対応する事



1階平面図（改修） 1/100

中2階平面図（改修）

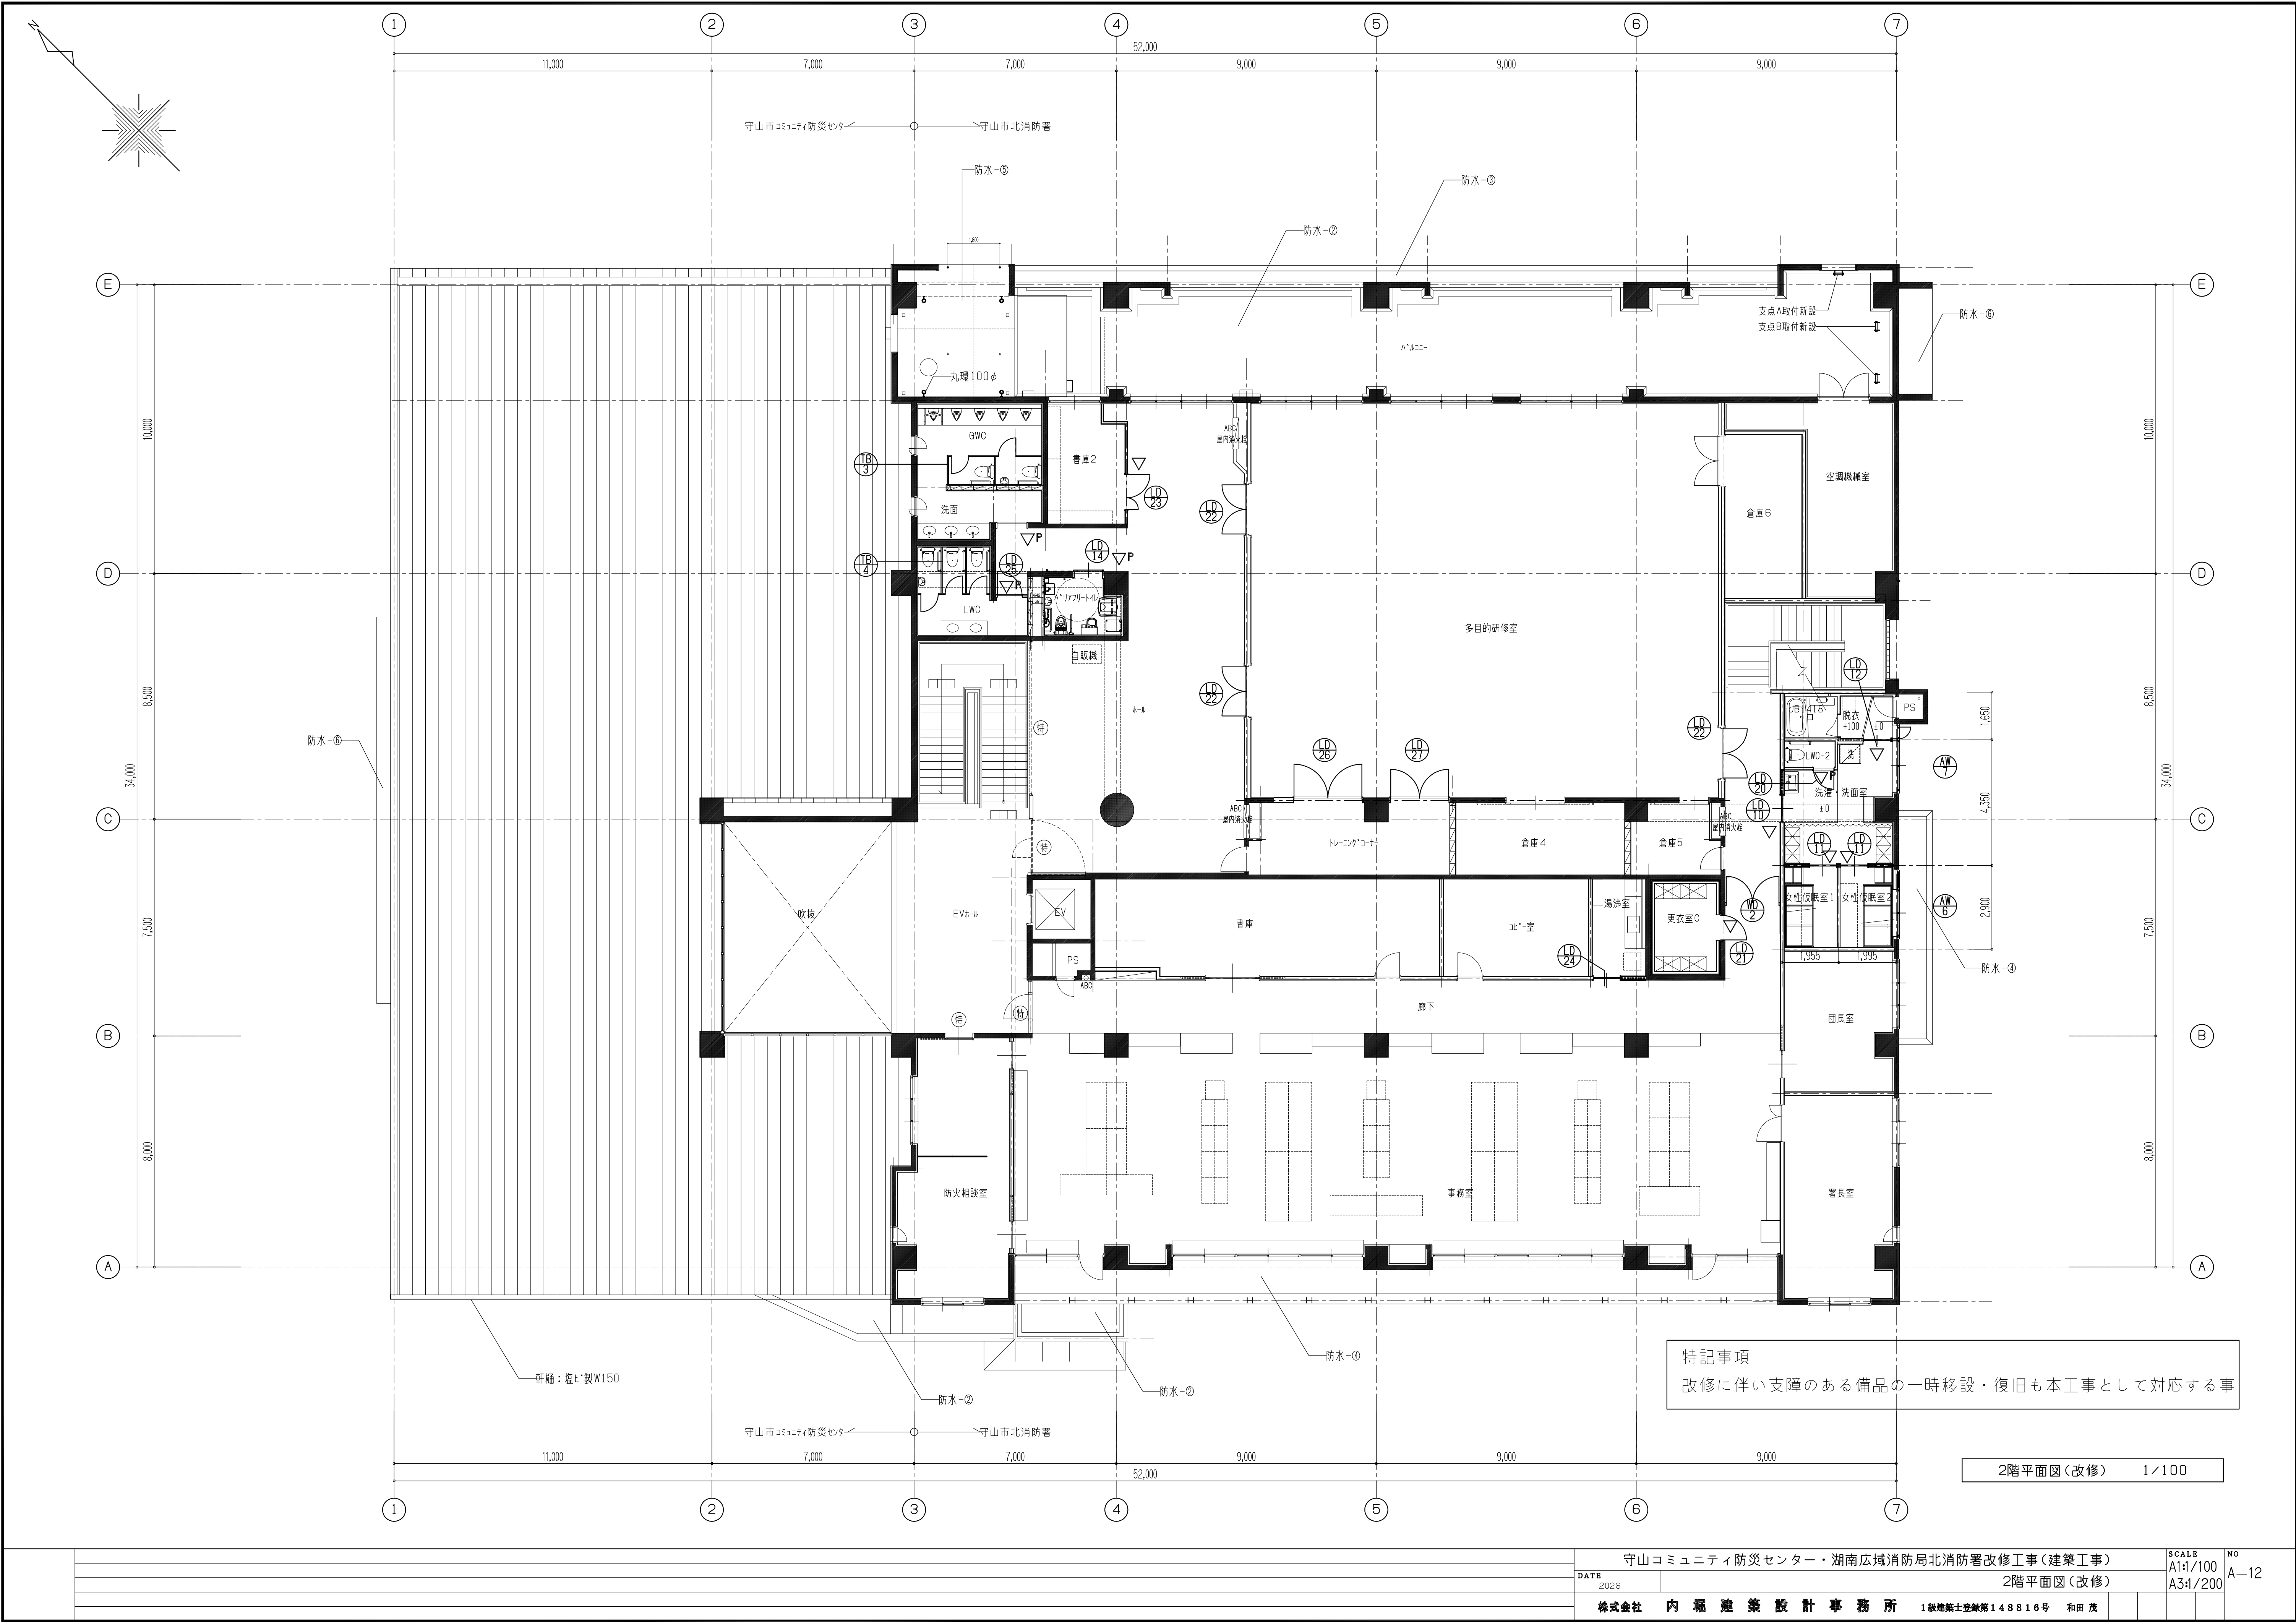


2階平面図(改修) 1/100

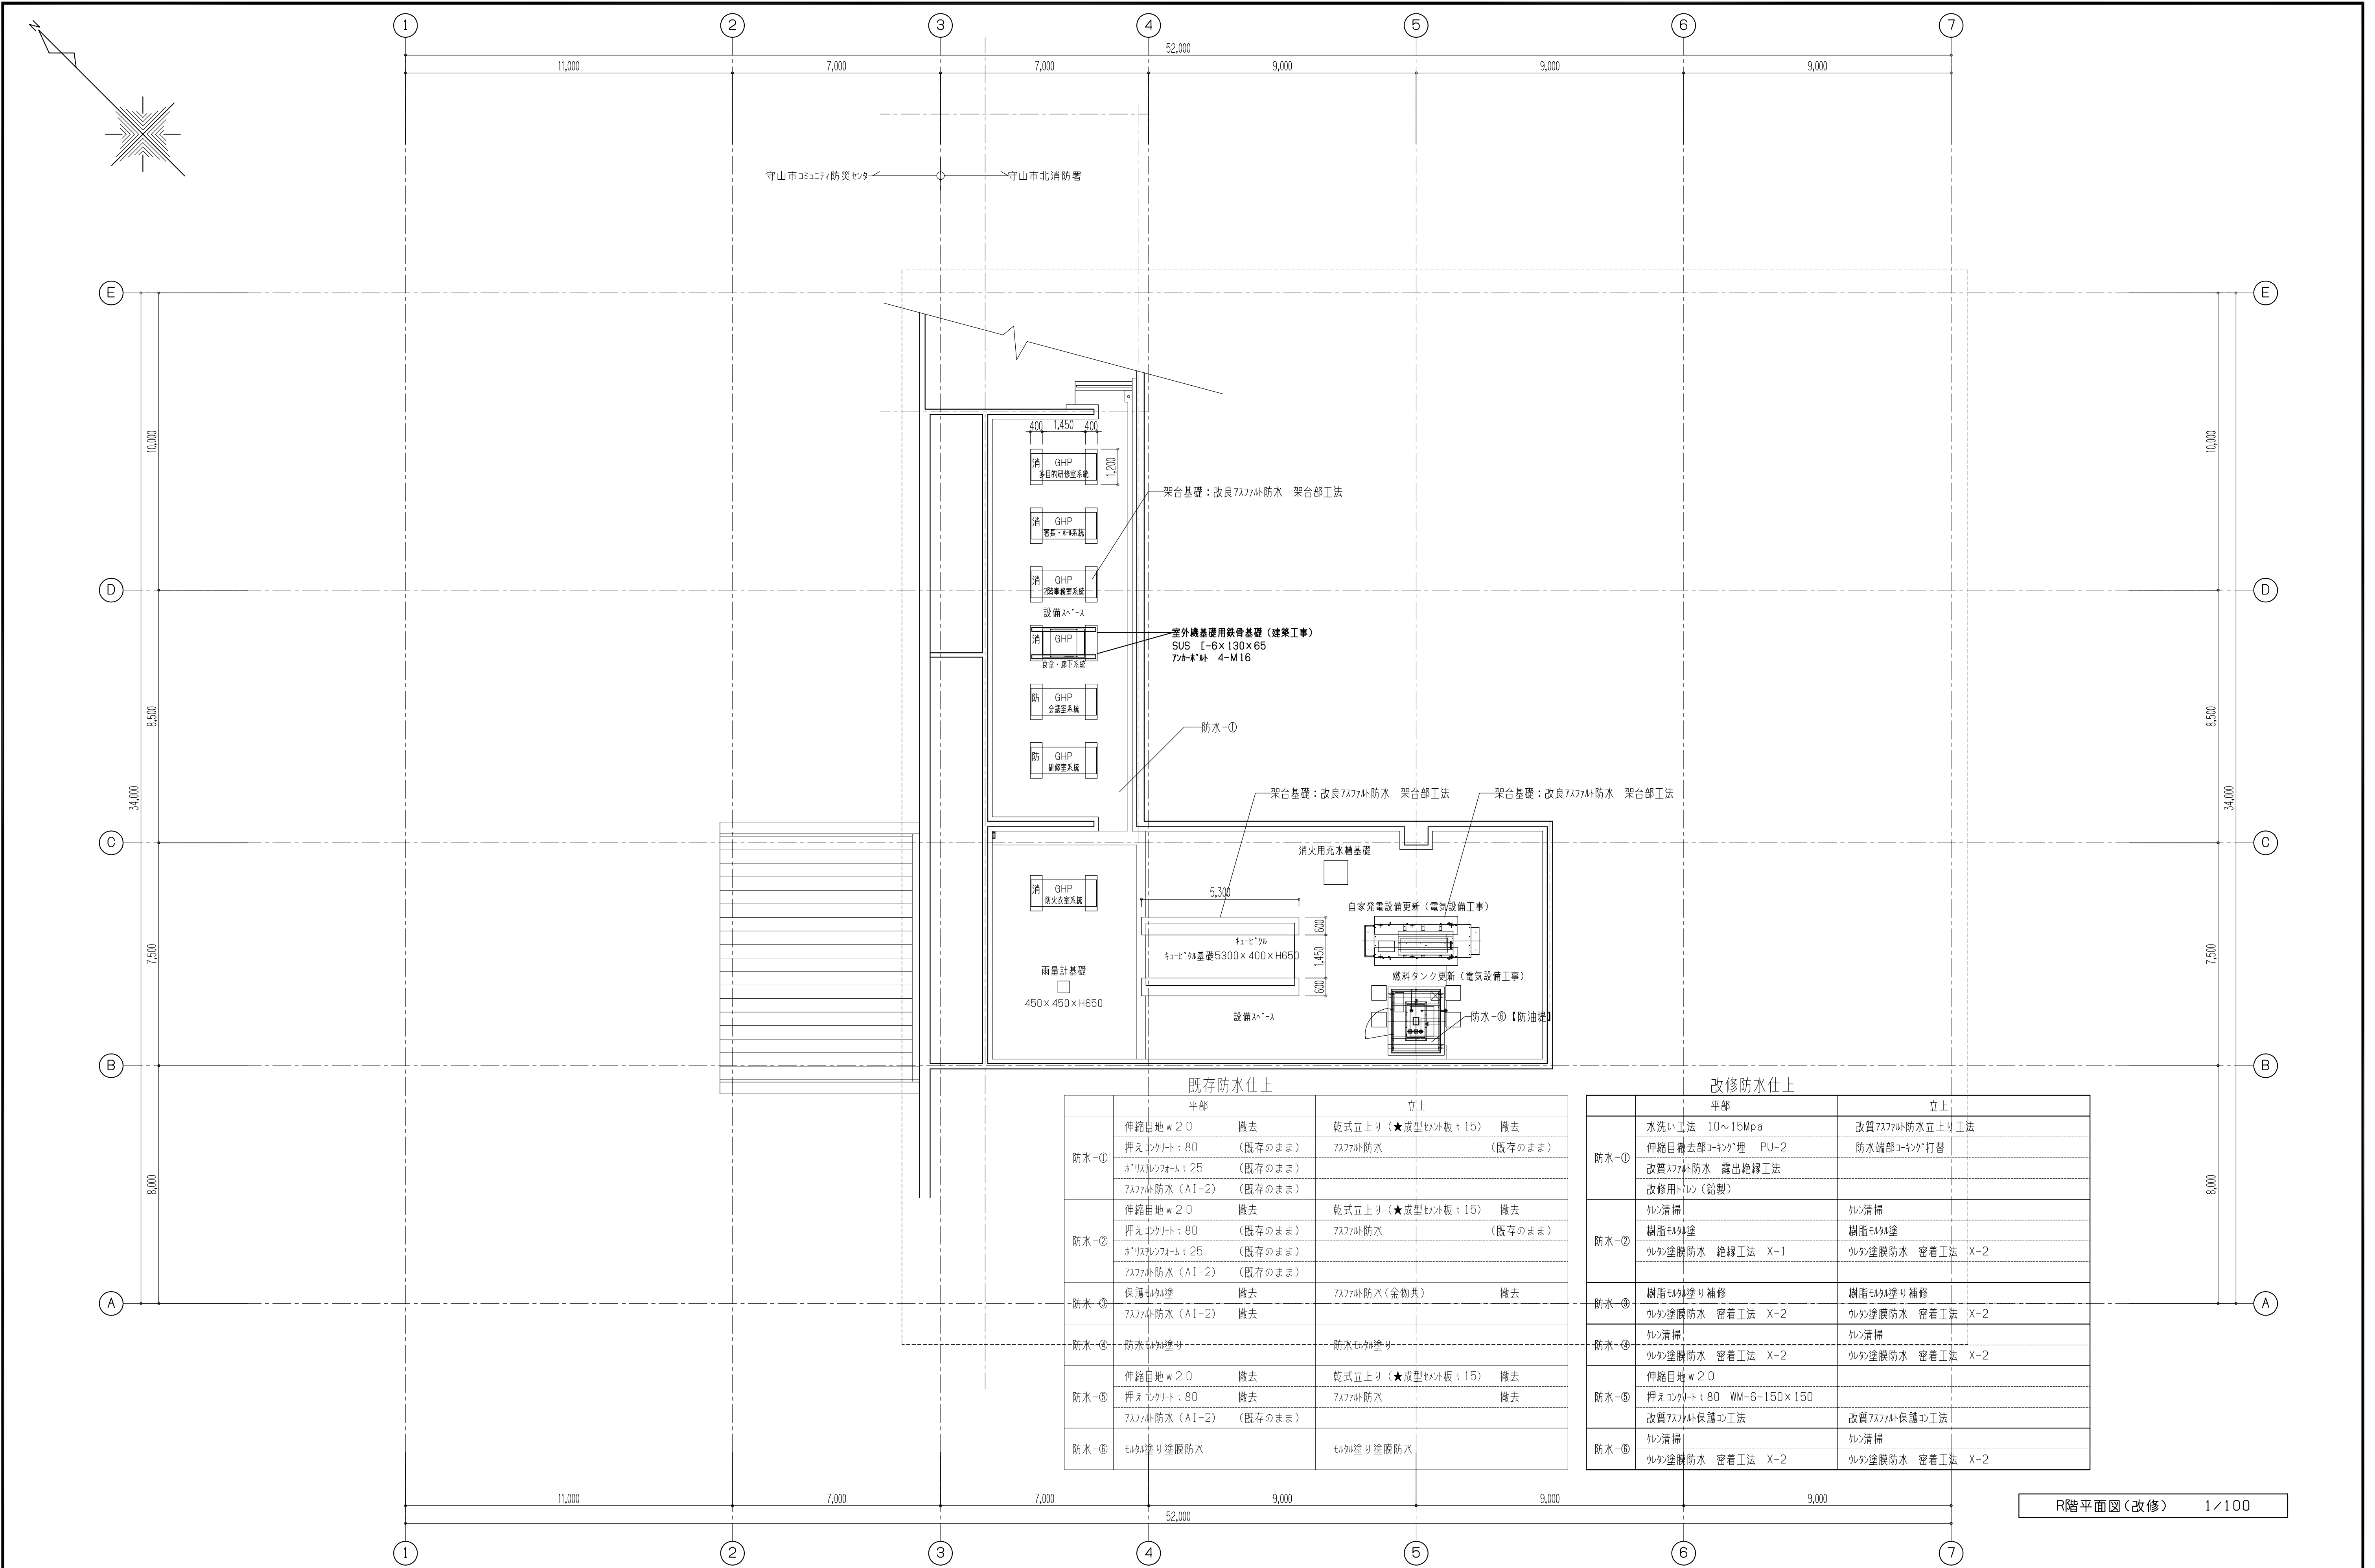

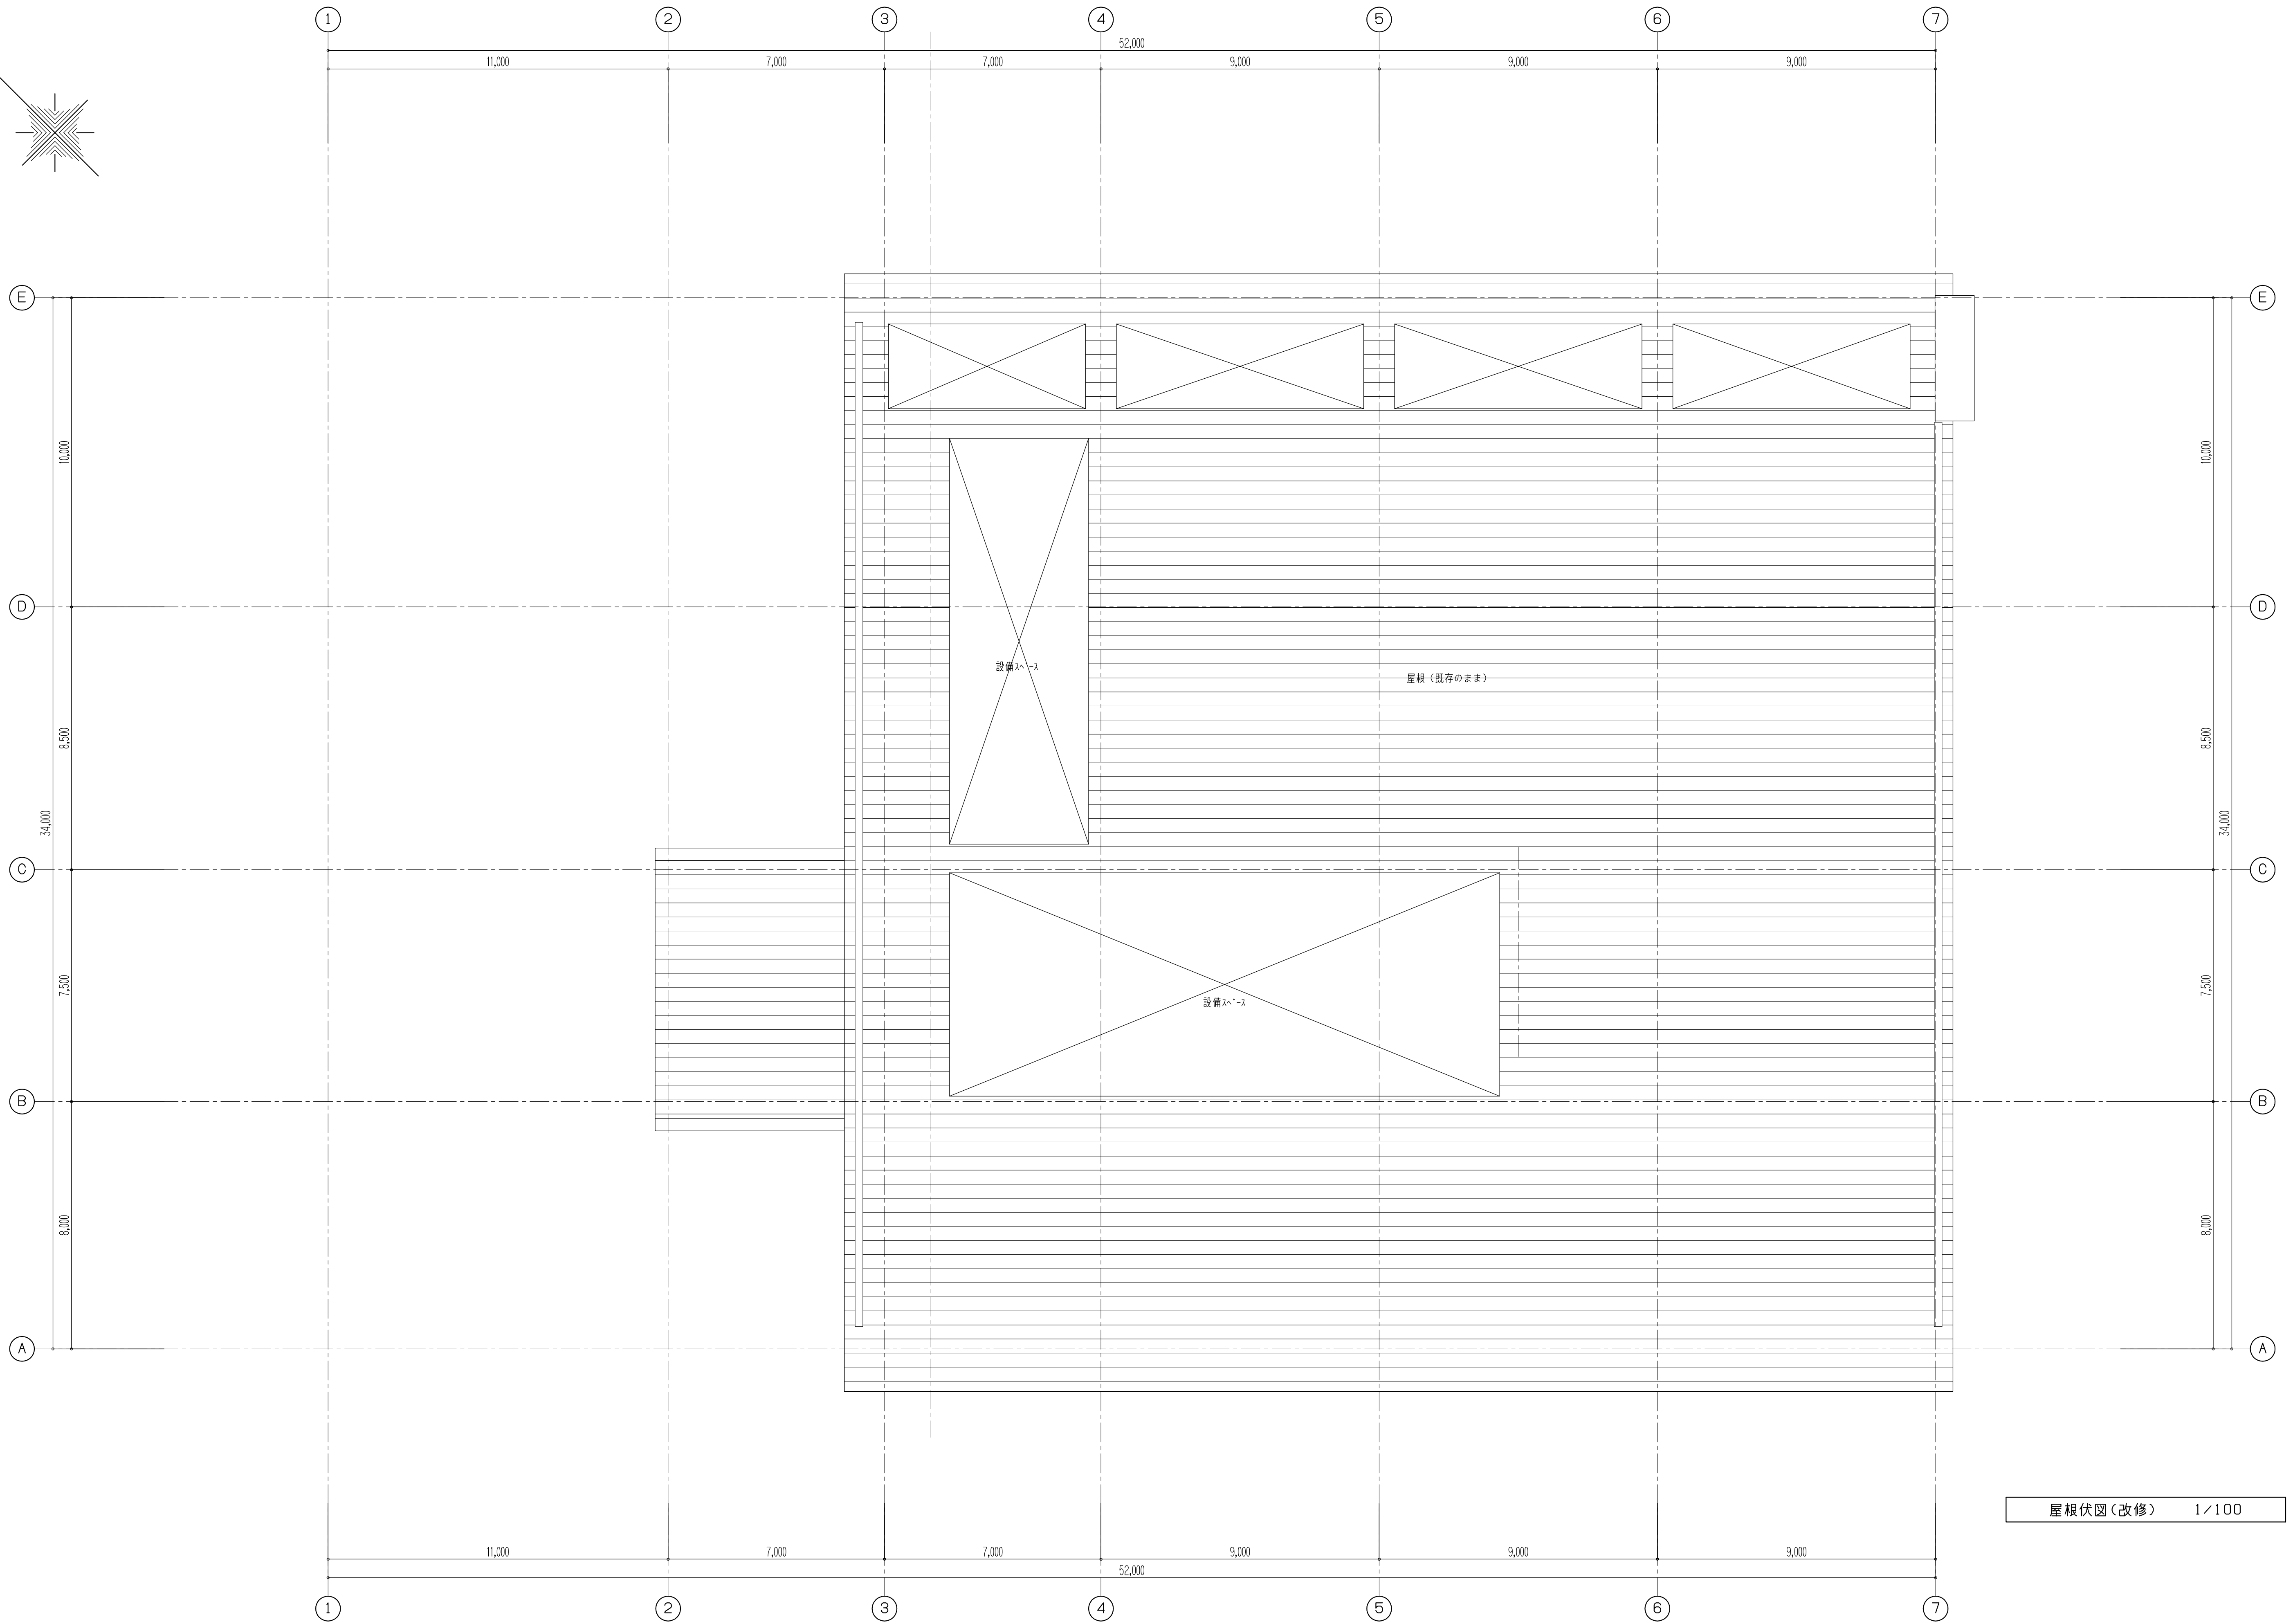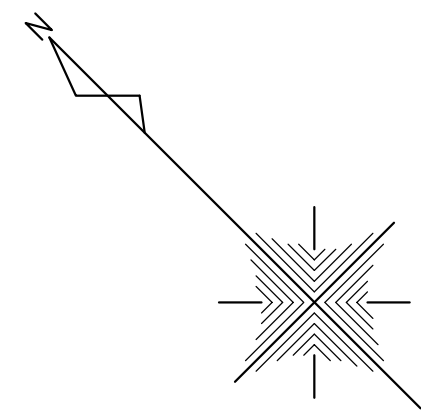

屋根伏図（改修） 1/100

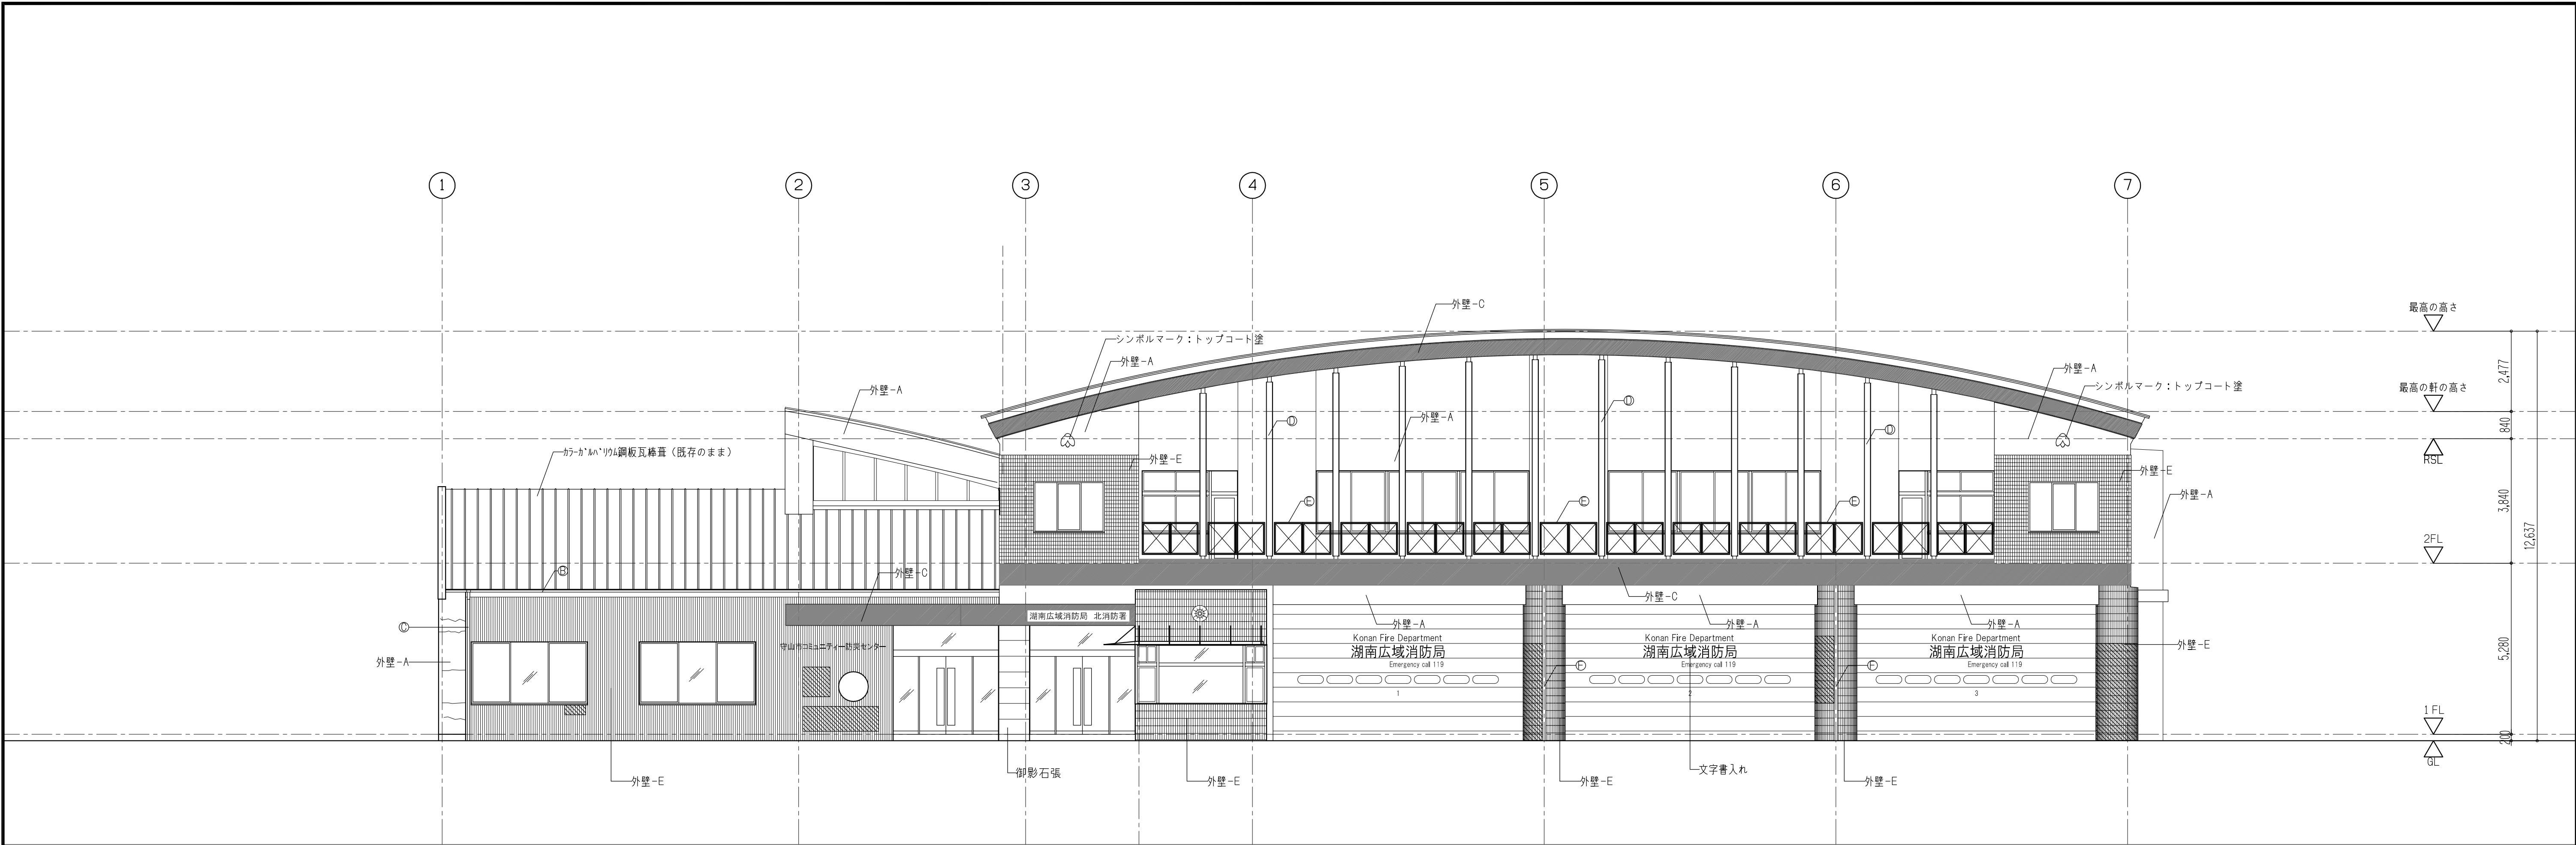

南側立面図 1/100


凡例	既存仕上げ	改修仕上げ
外壁-A	コンクリート打放し 複層仕上げ塗材 RE	水洗い工法 10～15Mpa 外壁用779162 [®] 4系塗膜防水材 770701 [®] 4ST工法（吹付）
外壁-B	コンクリート打放し 外装薄塗材 E	水洗い工法 10～15Mpa 外壁用779162 [®] 4系塗膜防水材 770701 [®] 4ST模様吹きの上えトップコート2回
外壁-C	コンクリート打放し 保護材【セパレート工法】	水洗い工法 10～15Mpa 外壁用779162 [®] 4系塗膜防水材 770701 [®] 4ST工法（吹付）
外壁-D	磁器質150角タイル貼	下地処理：酸洗い 外壁タイル剥落防止工法 6 [®] 10 [®] 7777 [®] 4スト [®] 工法
外壁-E	せっ器質タイル貼（小口・2丁掛）	下地処理：酸洗い 外壁タイル剥落防止工法 6 [®] 10 [®] 7777 [®] 4スト [®] 工法
外壁-F	珪 [®] 1 [®] タイル100×50貼	下地処理：酸洗い 外壁タイル剥落防止工法 6 [®] 10 [®] 7777 [®] 4スト [®] 工法
既SD	スチ [®] メ [®] フラッシュ [®] 7 F P 塗	ケ [®] ン [®] 錆止めの上DP塗替
既SS	スチ [®] メ [®] チャター SOP 塗	ケ [®] ン [®] 錆止めの上DP塗替
㊦	タ [®] タ [®] ：タ [®] VP100φ	下地処理の上 6 [®] 10 [®] ケ [®] ン [®] 樹脂塗装
㊧	タ [®] タ [®] ：珪化銅板120φ半丸	塩ビ [®] タ [®] タ [®] 取替
㊨	タ [®] タ [®] ：珪化銅板76×46	塩ビ [®] タ [®] タ [®] 70φ取替 SUS [®] 網み金物共
㊩	SUSH-200×200	（既存のまま）
㊪	SUS□-61×32φ900	（既存のまま）
㊫	タ [®] タ [®] ：SUS100φ	（既存のまま）
㊬	薄板：タ [®] タ [®] タ [®] タ [®] 鋼板	下地処理の上 DP塗装
㊭	タ [®] タ [®] ：タ [®] タ [®] タ [®] 破風：76×50×46	洗浄ケ [®] ン [®] の上アラ [®] タ [®] 塗 シリ [®] コン [®] 塗装 取合いコ [®] タ [®] タ [®] 打替え

特記事項



1. 外立面76×50は全てケ[®]ン[®]とする
2. 外立面建具はすべてコ[®]タ[®]タ[®]打替えとする
3. 外壁打越目地、タ[®]タ[®]目地は全てコ[®]タ[®]タ[®]打替えとする
4. コ[®]タ[®]タ[®]欠損部は樹脂タ[®]タ[®]にて補修の事
5. 外壁は2色程度塗り分けるとする
6. 既存タ[®]タ[®]張り部分は事前調査（浮き等）を行い、報告書にまとめ能工にあたる事
7. タ[®]タ[®]・タ[®]タ[®]浮き部補修は下記による


参考数量			
タ [®] タ [®]	0.2m以下	処理必要なし	北消防署 防災コミュニティセンター
タ [®] タ [®]	0.2～0.5m	779162 [®] 4系下地準動緩衝材 770701 [®] 4SH w50mm	330m 150m
タ [®] タ [®]	0.5～2.0m	タ [®] タ [®] コン [®] 充填のうえ779162 [®] 4系下地準動緩衝材 770701 [®] 4SH w60mm	180m 60m
タ [®] タ [®]	2.0m以上	U [®] カ [®] シ [®] 工法	なし なし
欠損部補修	タ [®] タ [®] 樹脂タ [®] タ [®] 充填工法		700か所（100角程度） 400か所（100角程度）

凡例
 タ [®] タ [®] 浮き部分を示す
 タ [®] タ [®] を示す

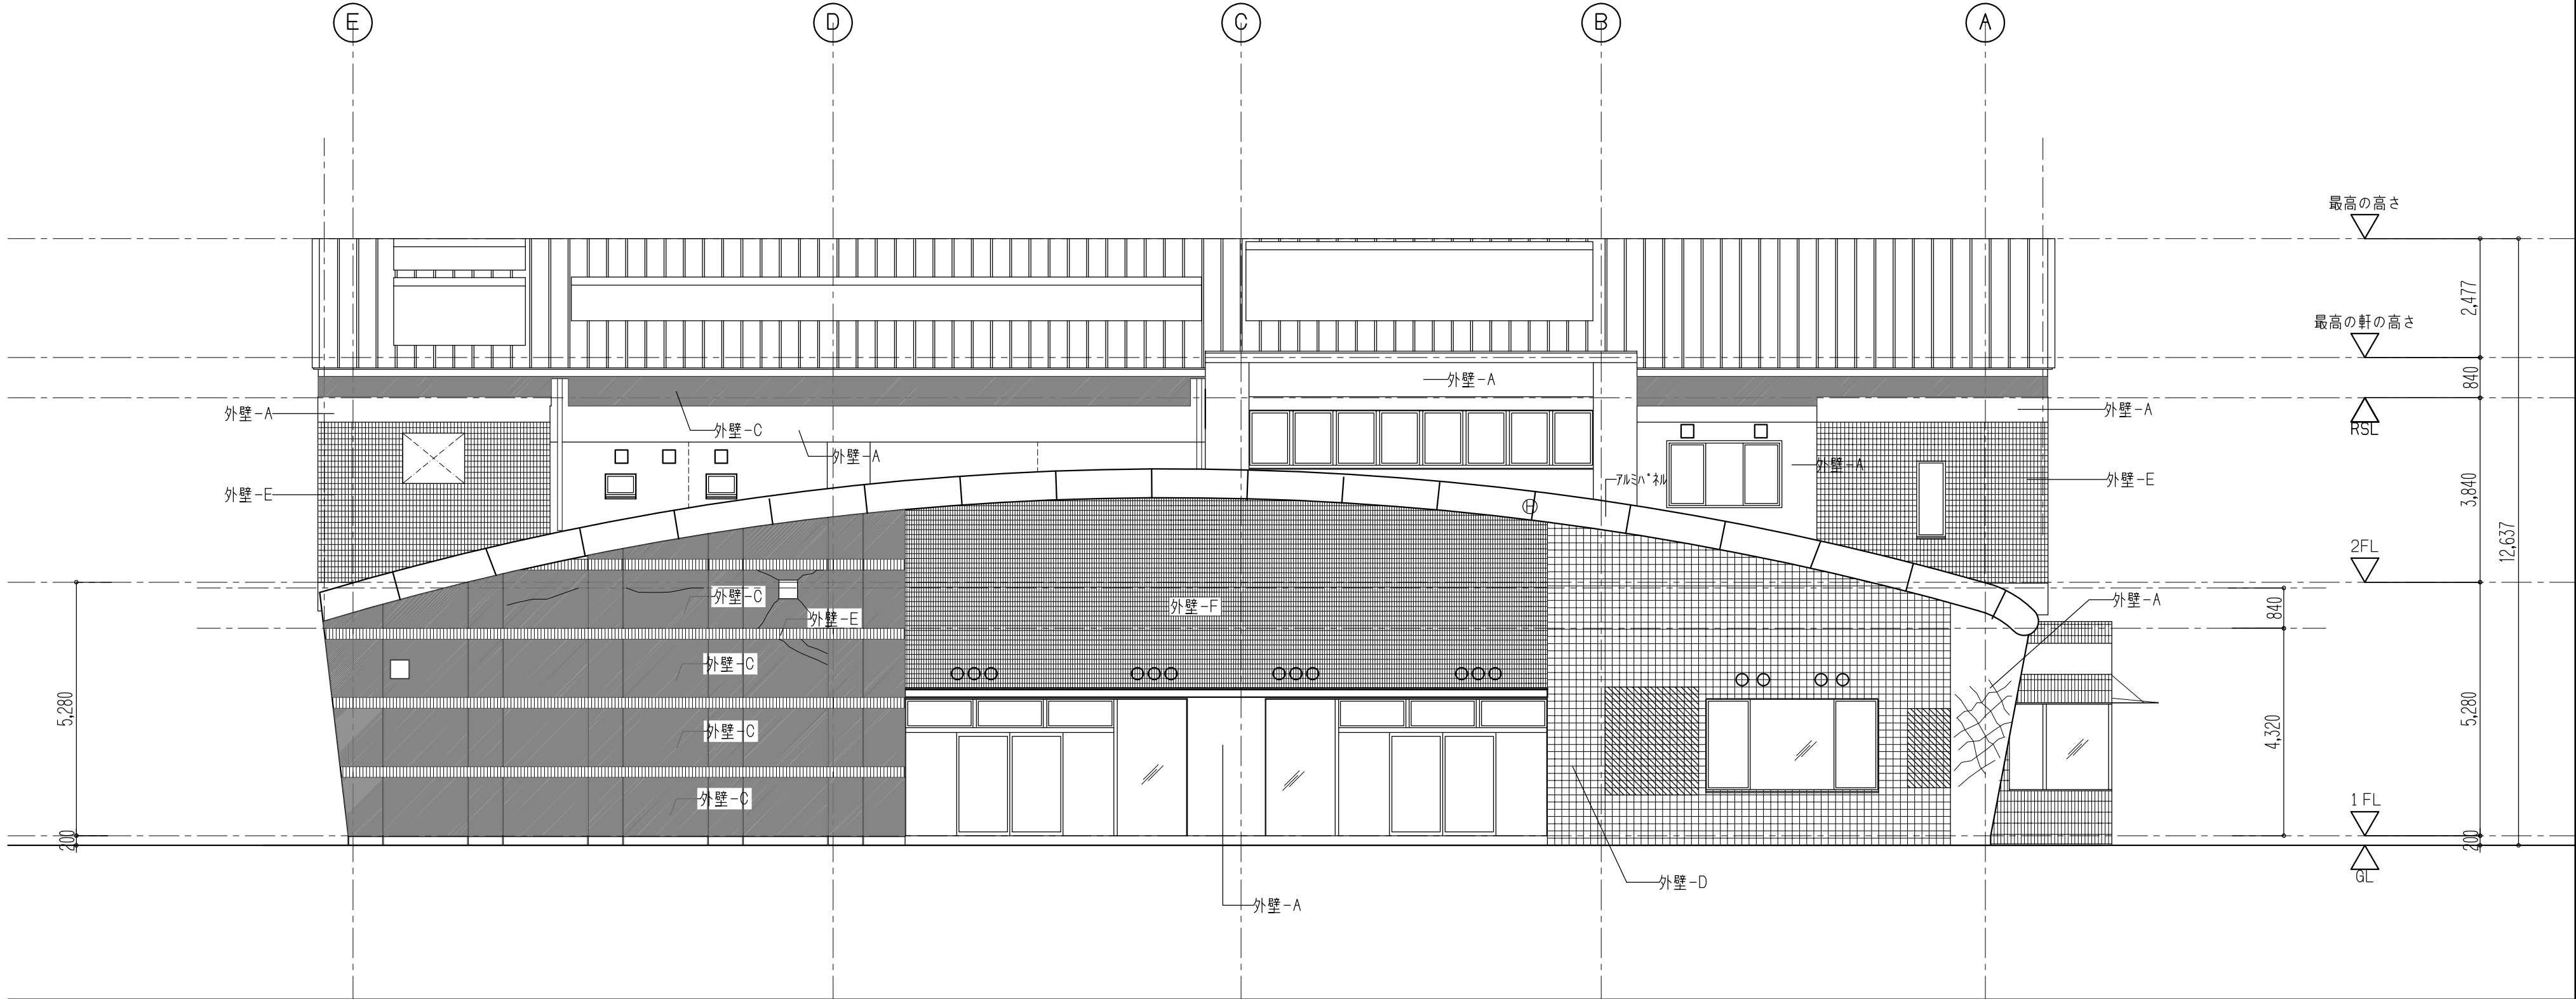


西側立面図 1/100

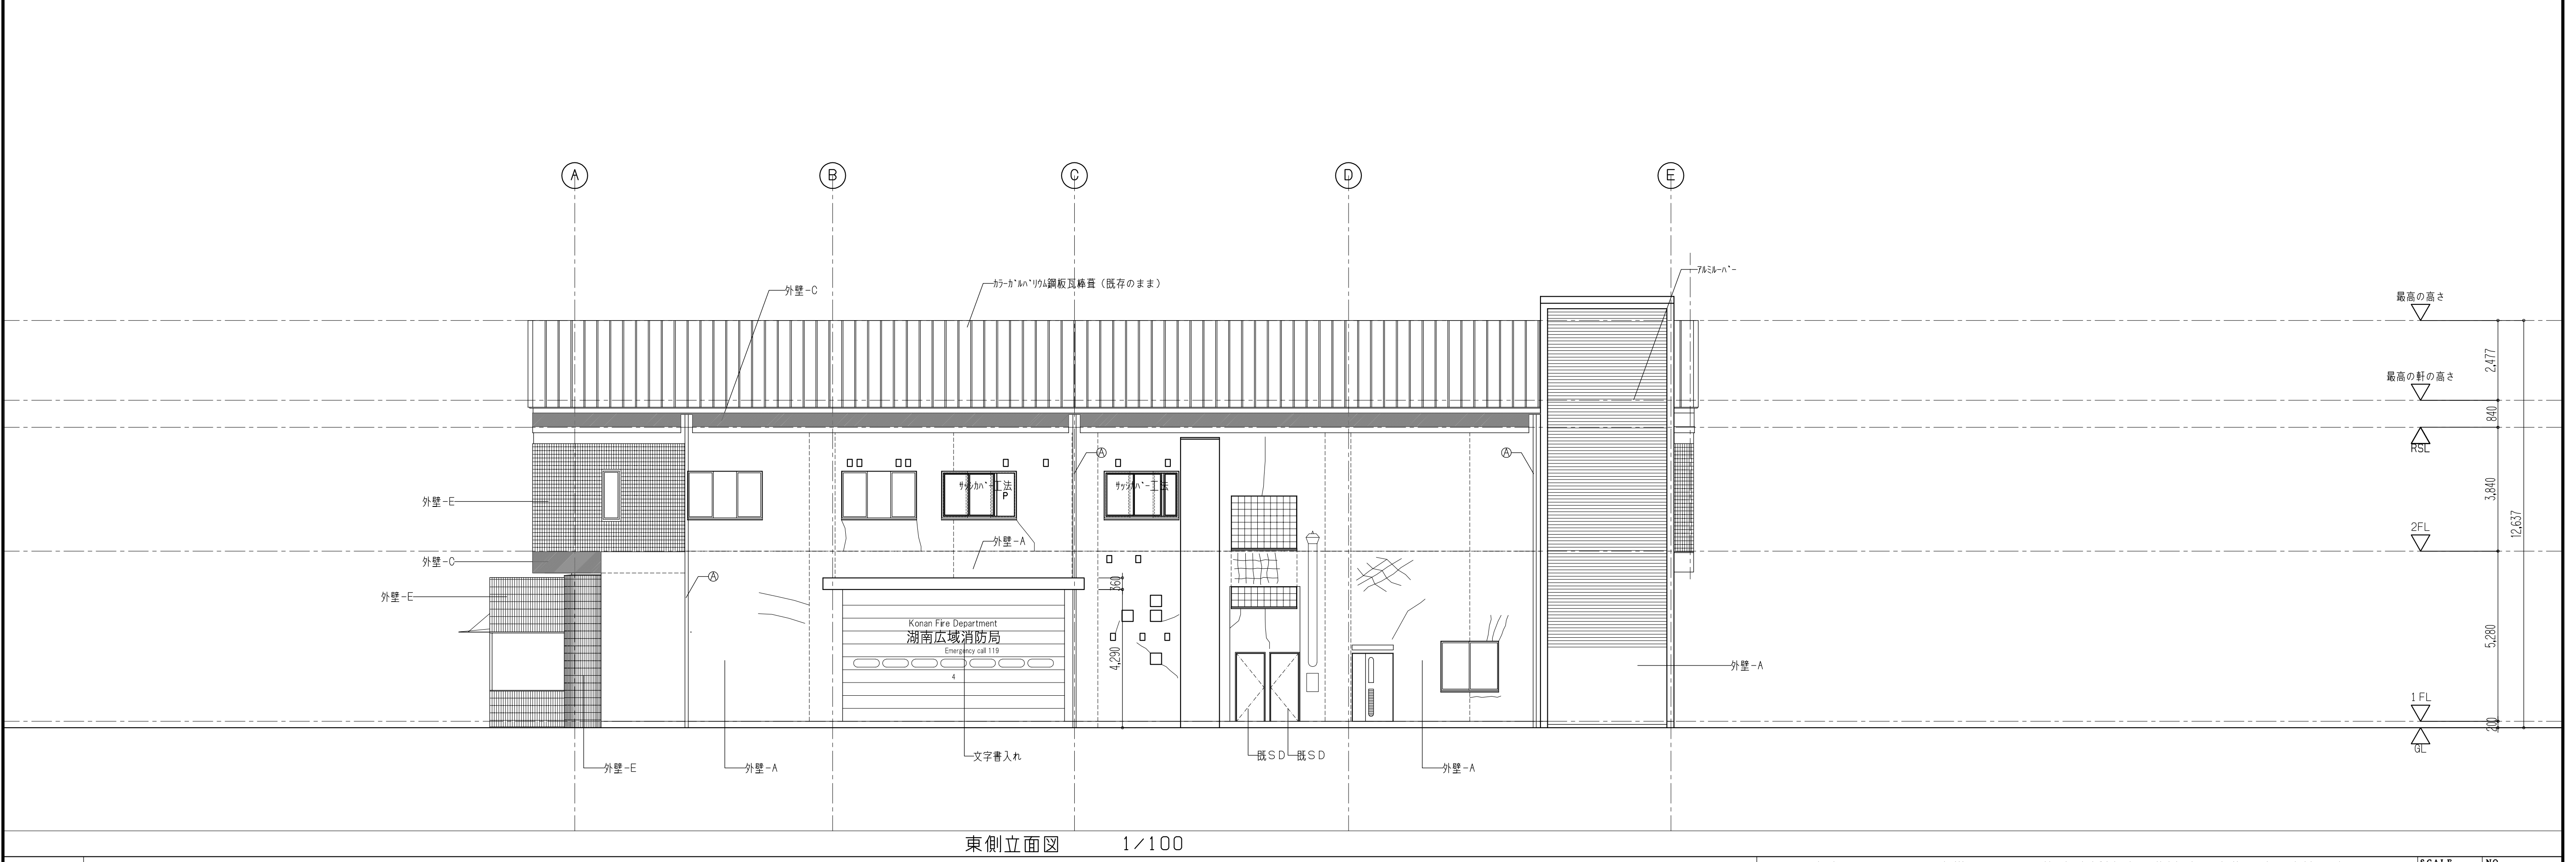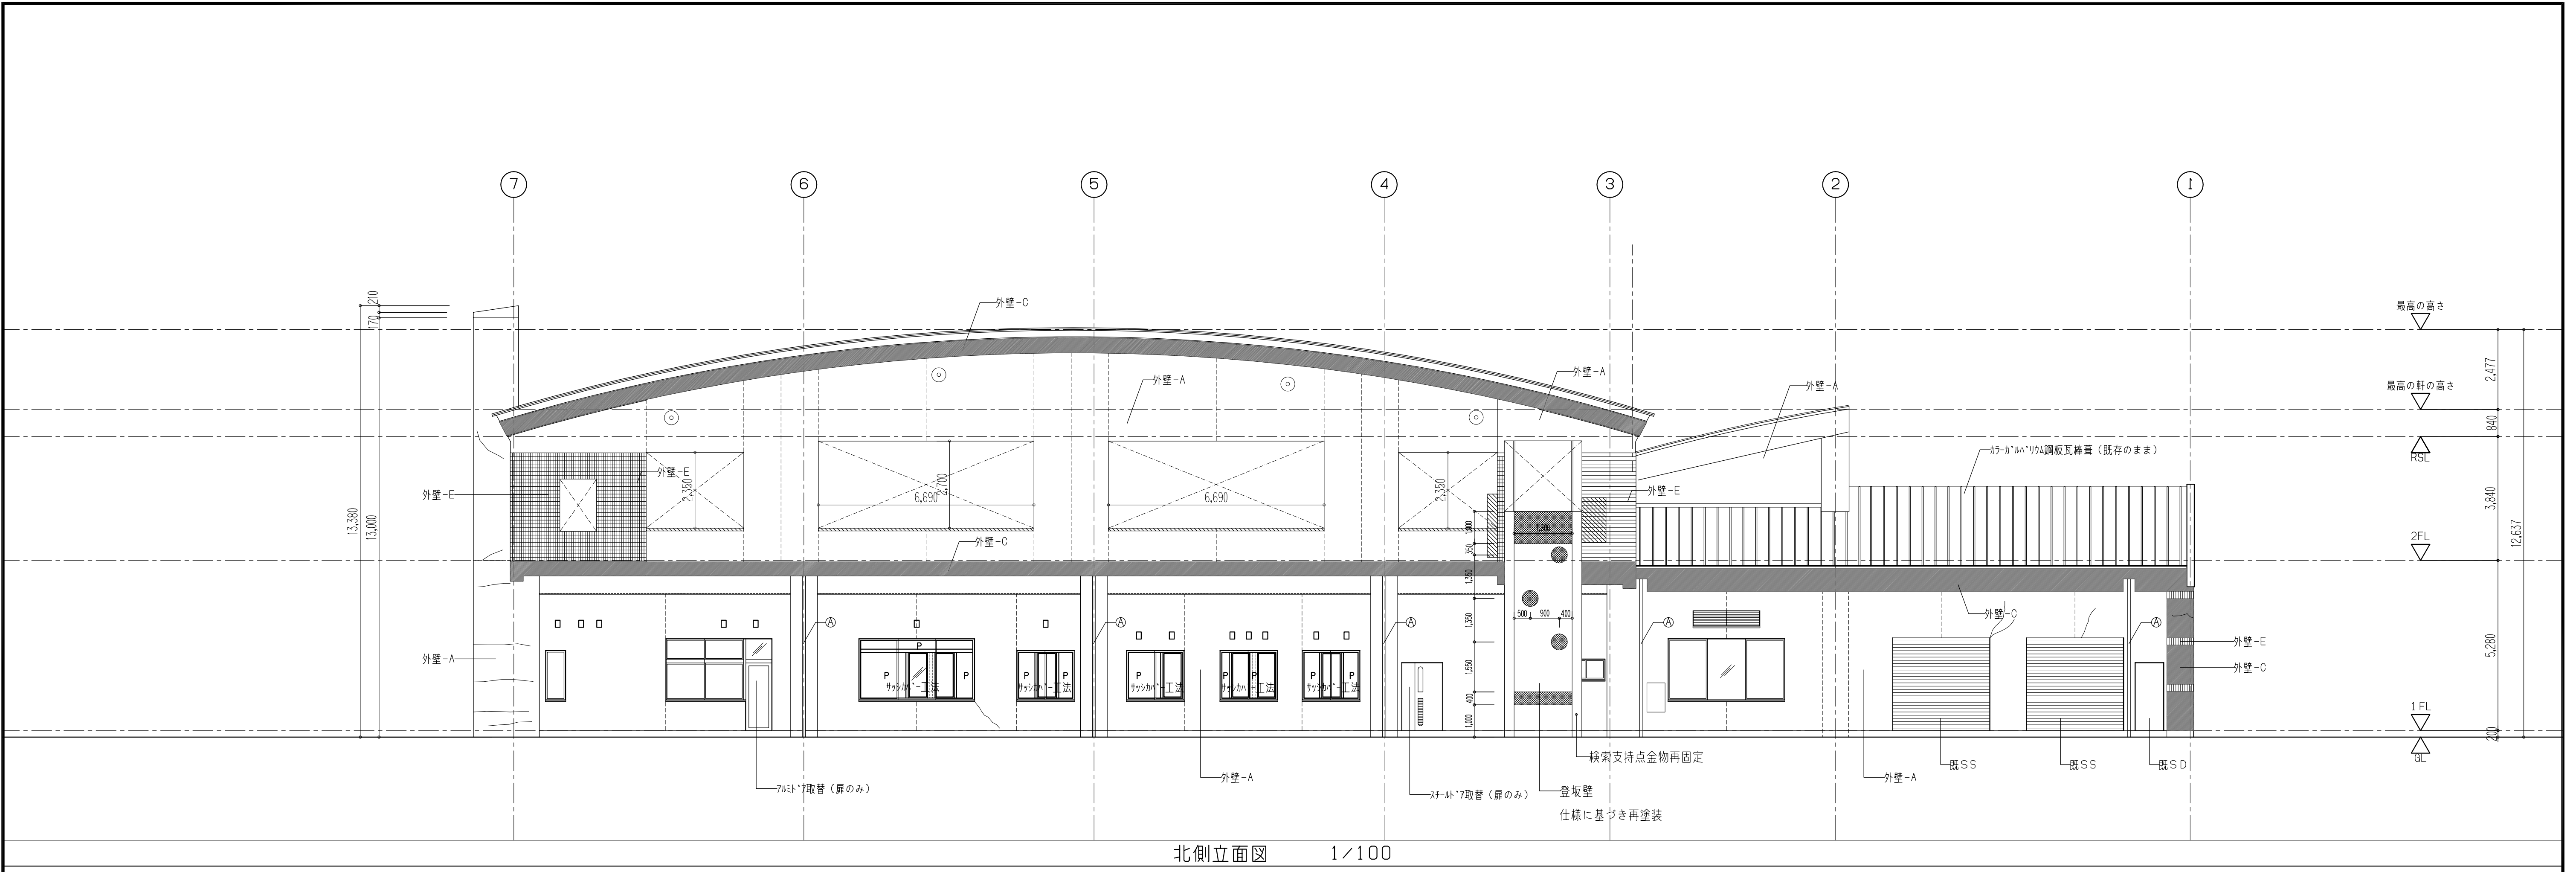

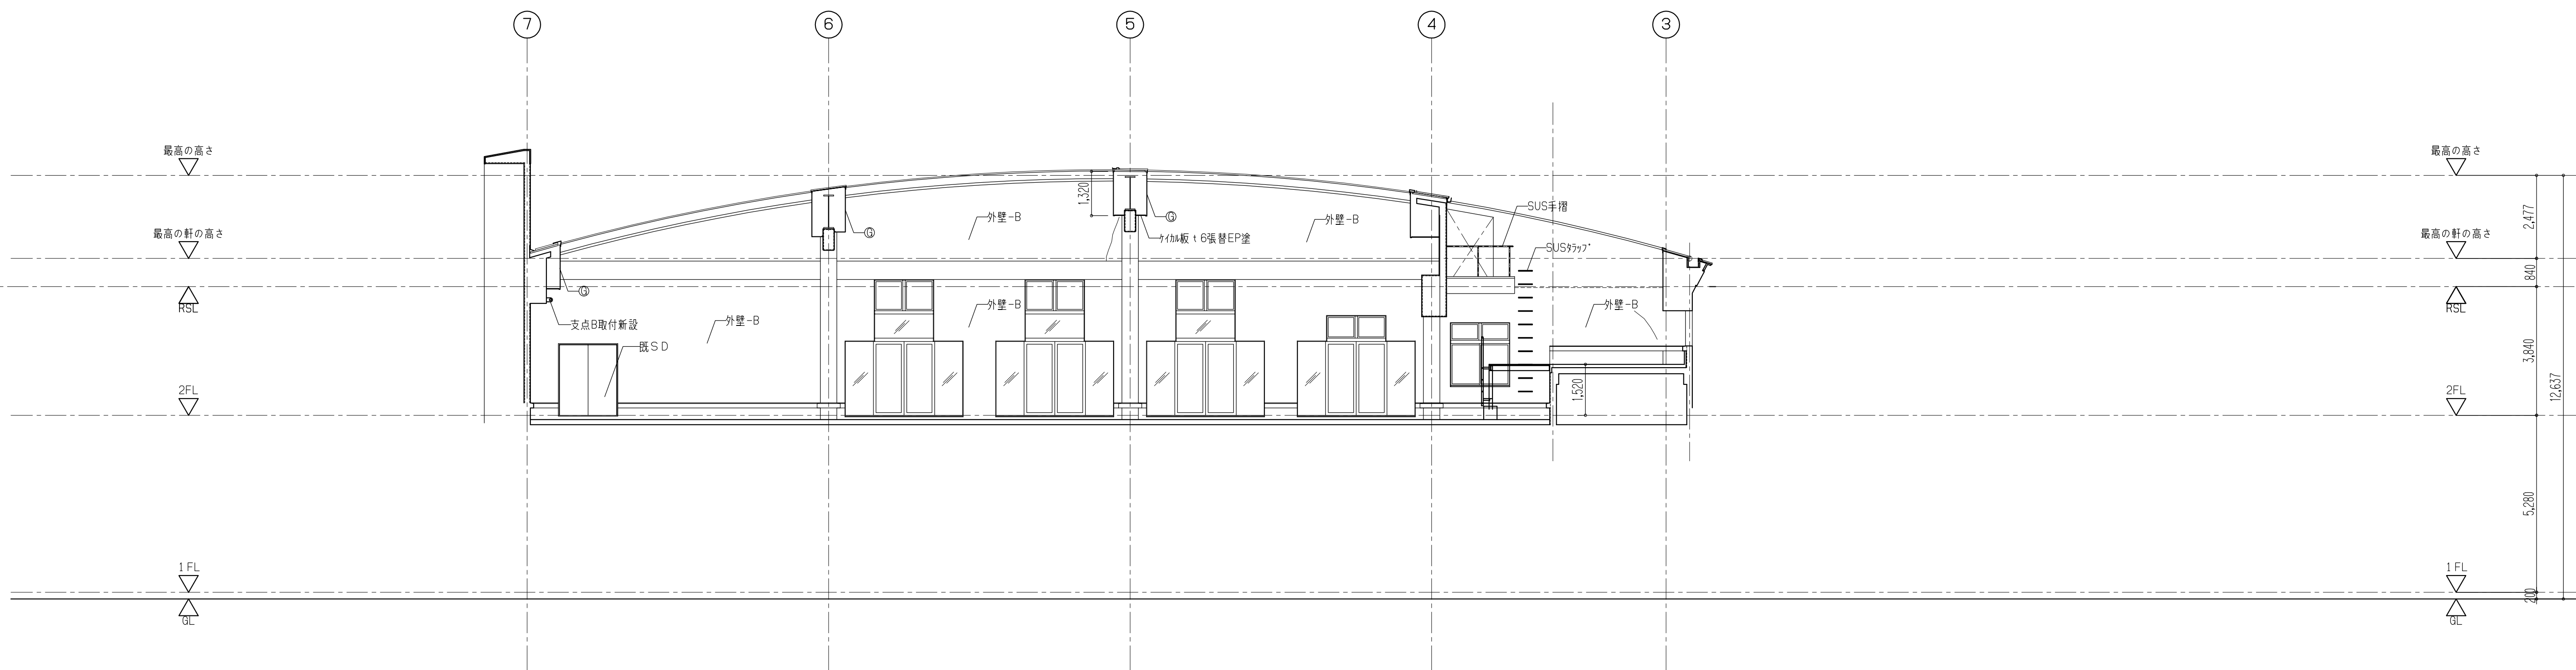


ハルコニ-南側立面図 1/100

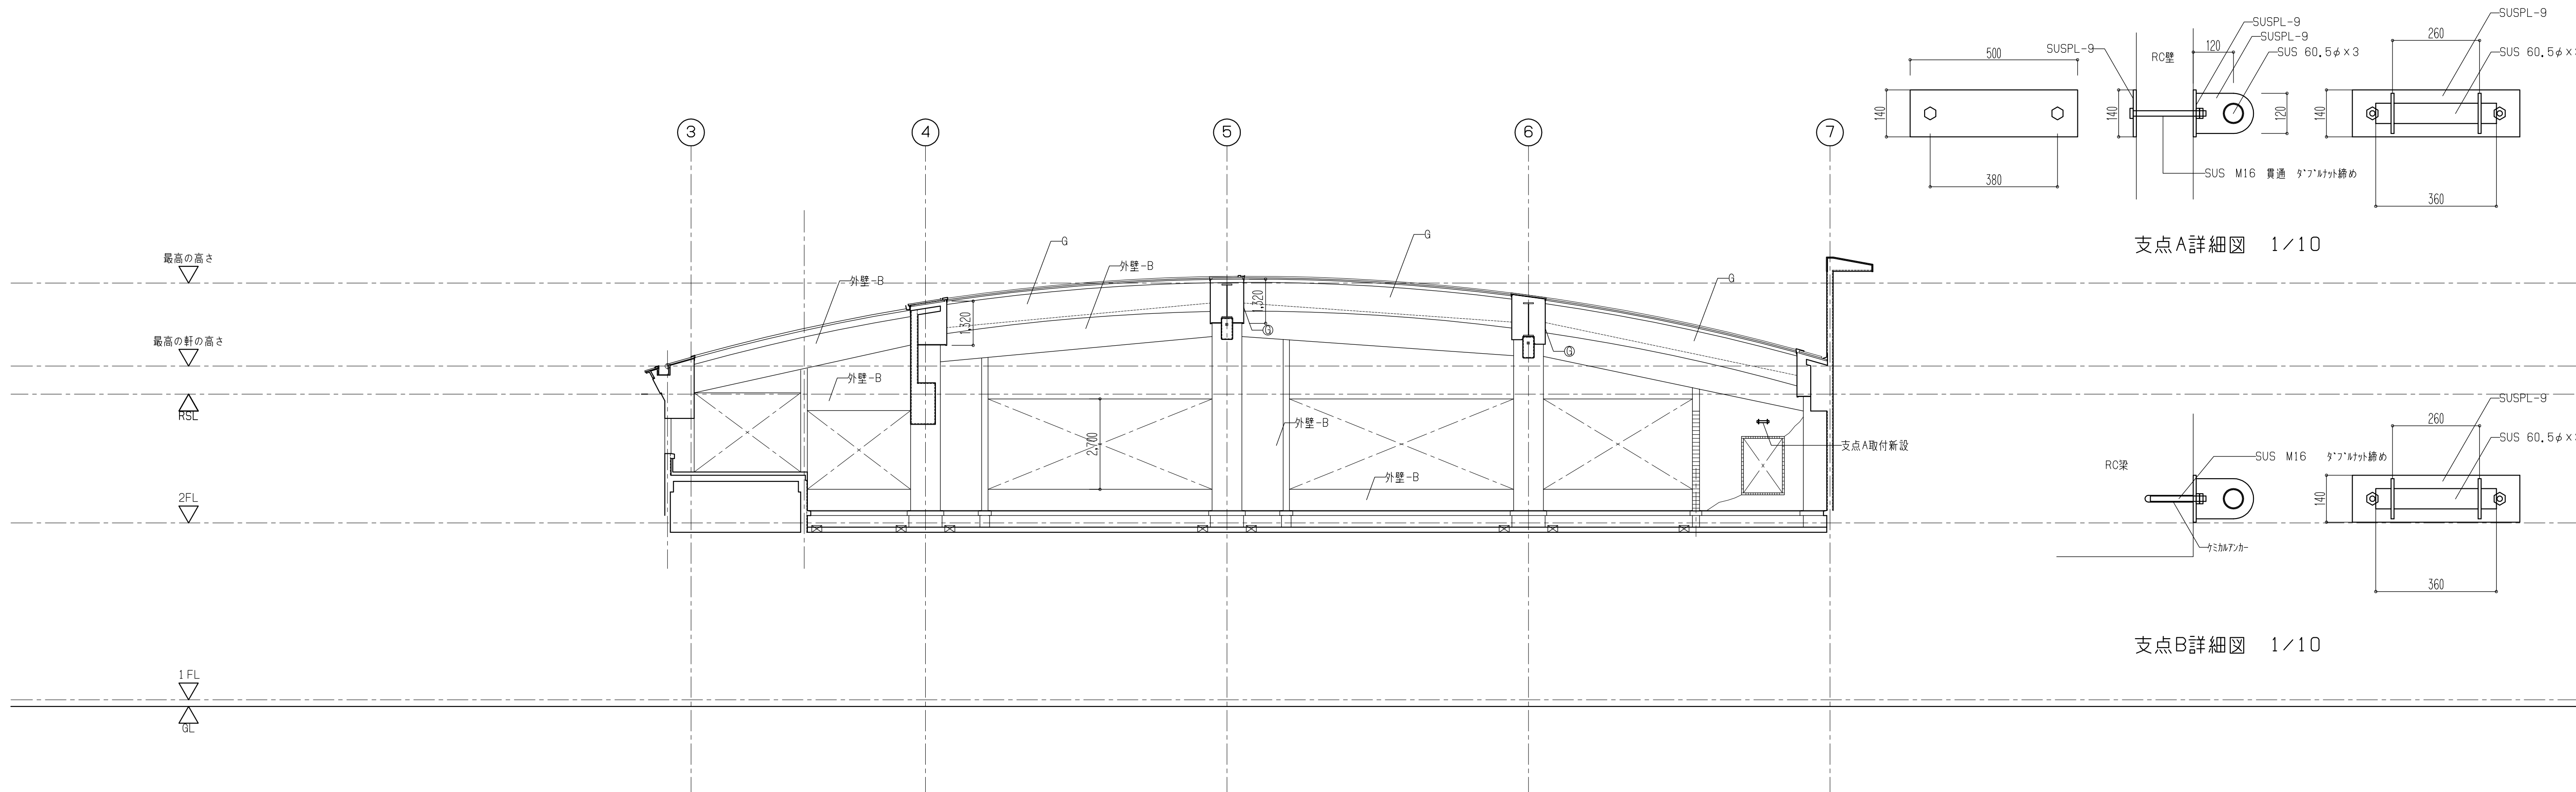


ハルコニ-北側立面図 1/100




守山コミュニティ防災センター・湖南広域消防局北消防署改修工事（建築工事）		SCALE	NO A-18
DATE 2026	1階天井伏図（改修）	A1:1/100 A3:1/200	
株式会社 内堀建築設計事務所		1級建築士登録第148816号	和田 茂




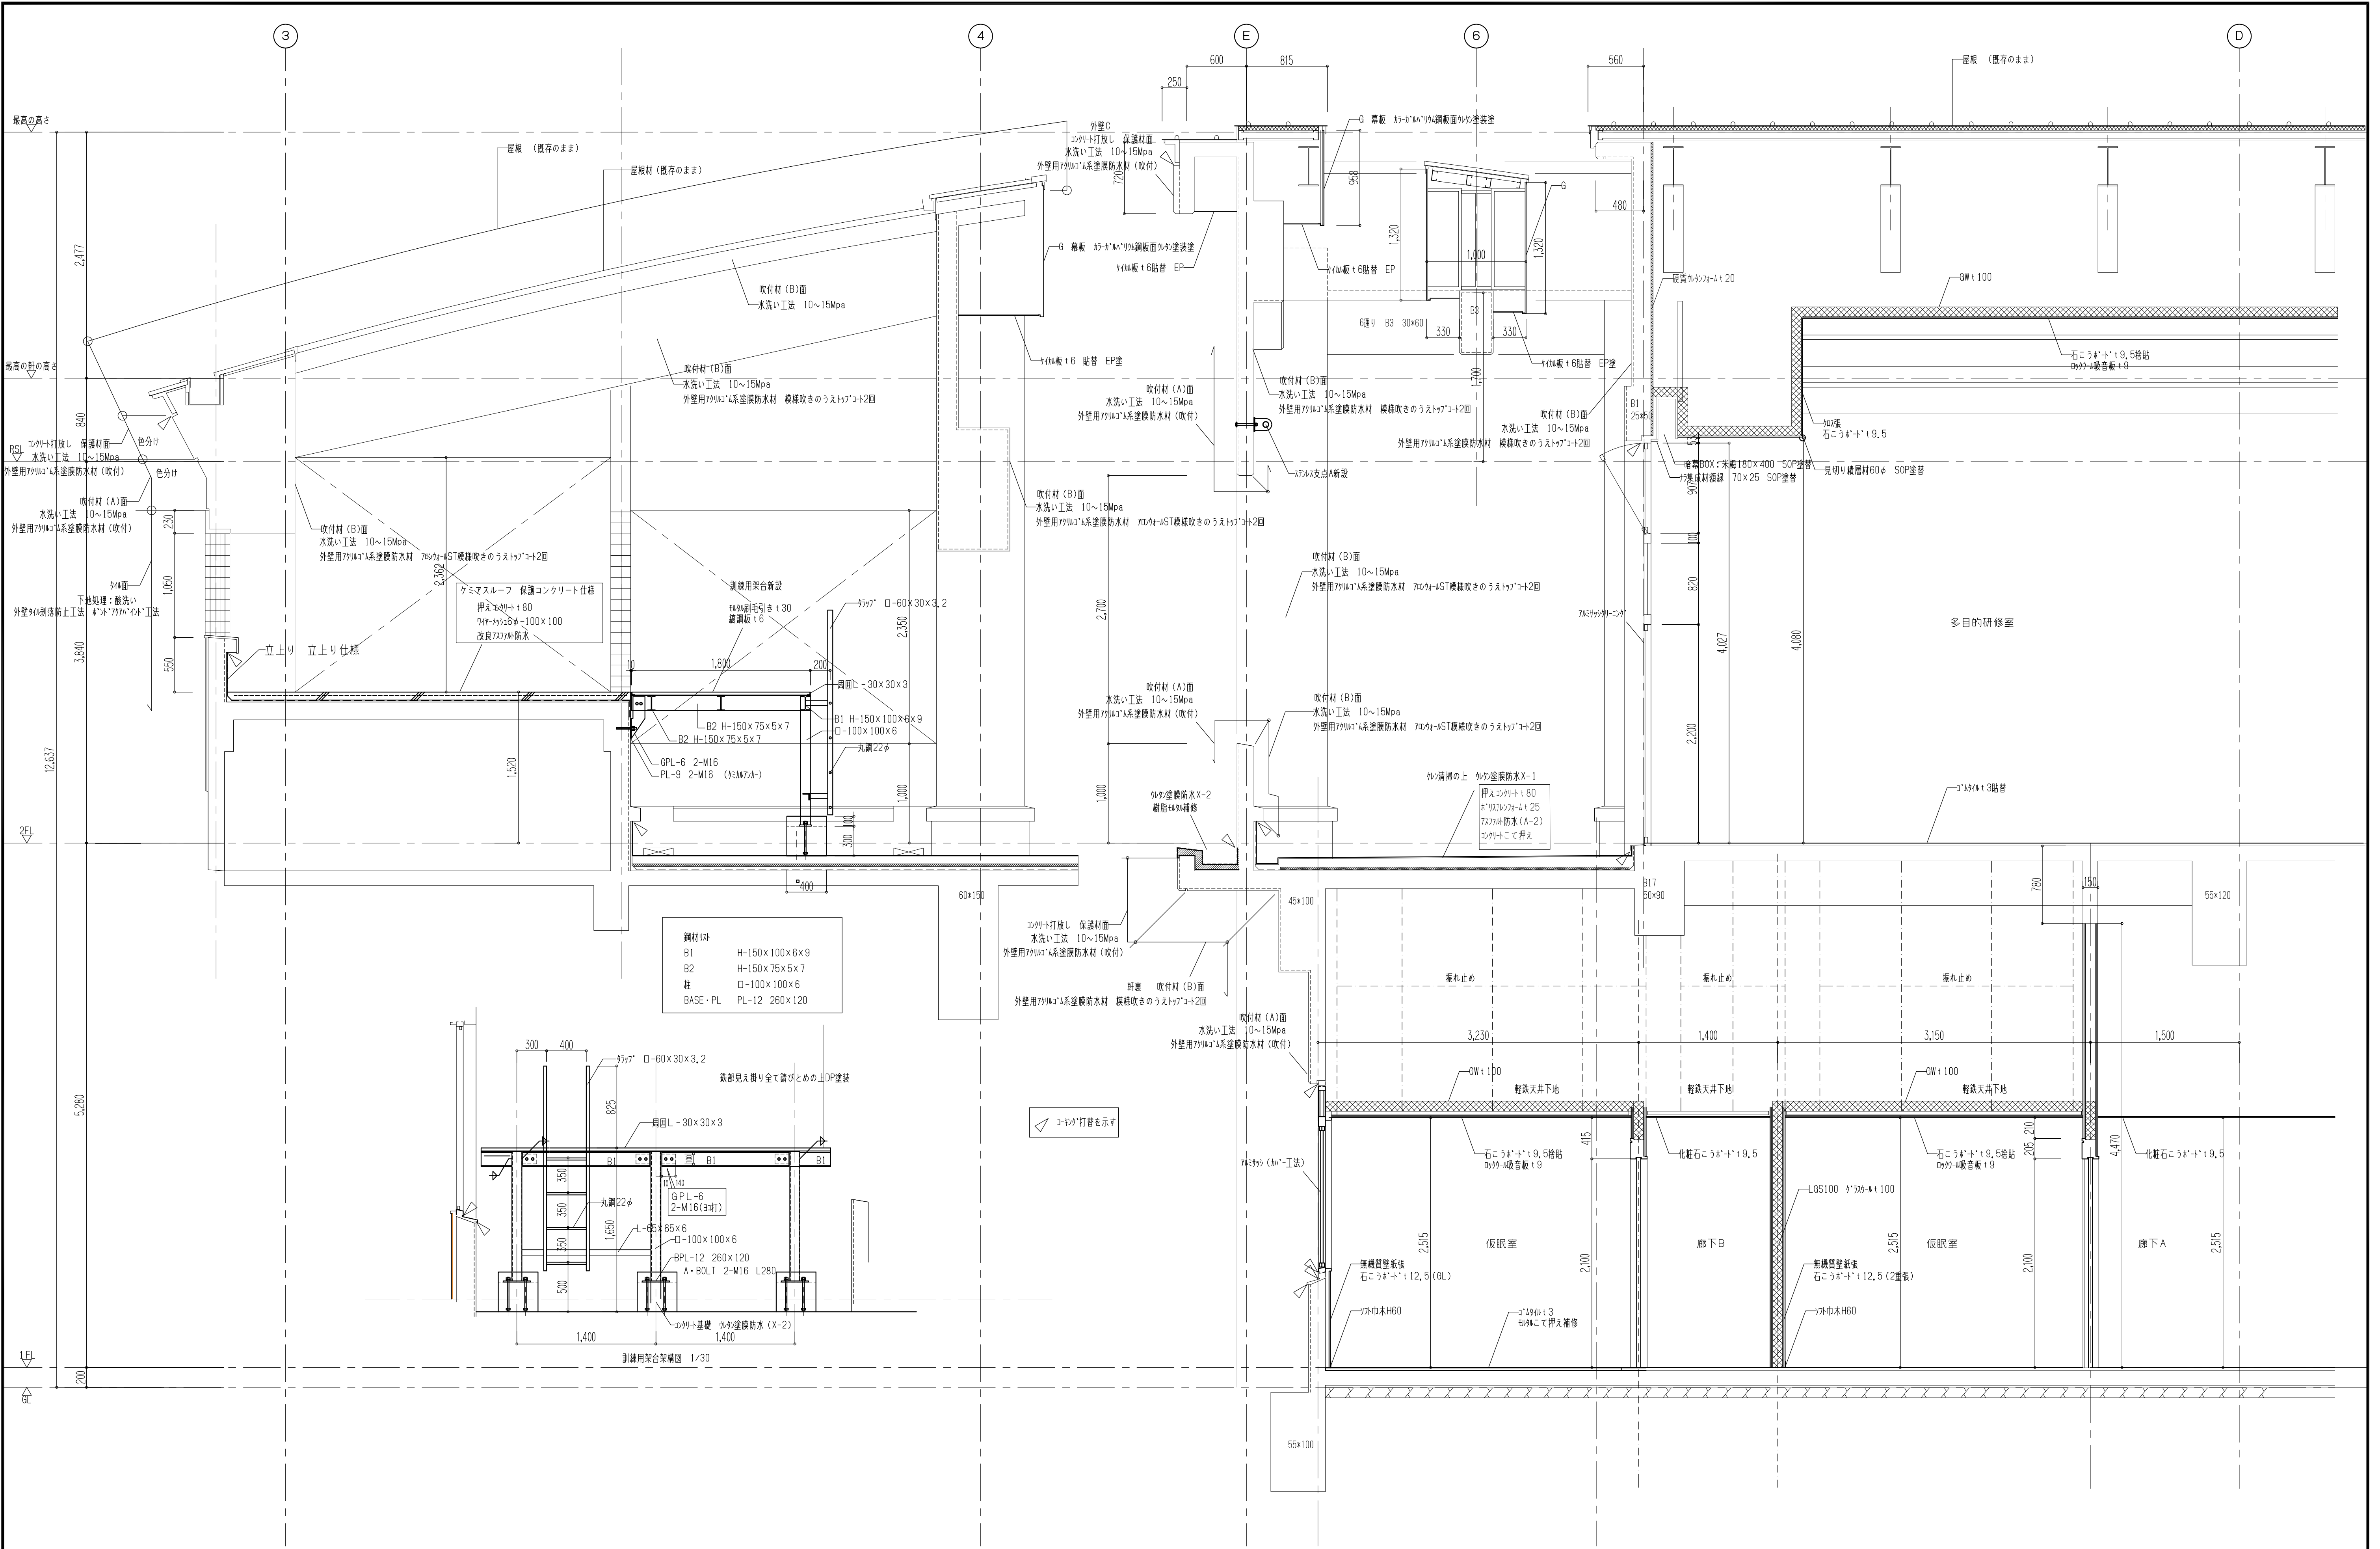

断面詳細図 1 (改修) 1/30

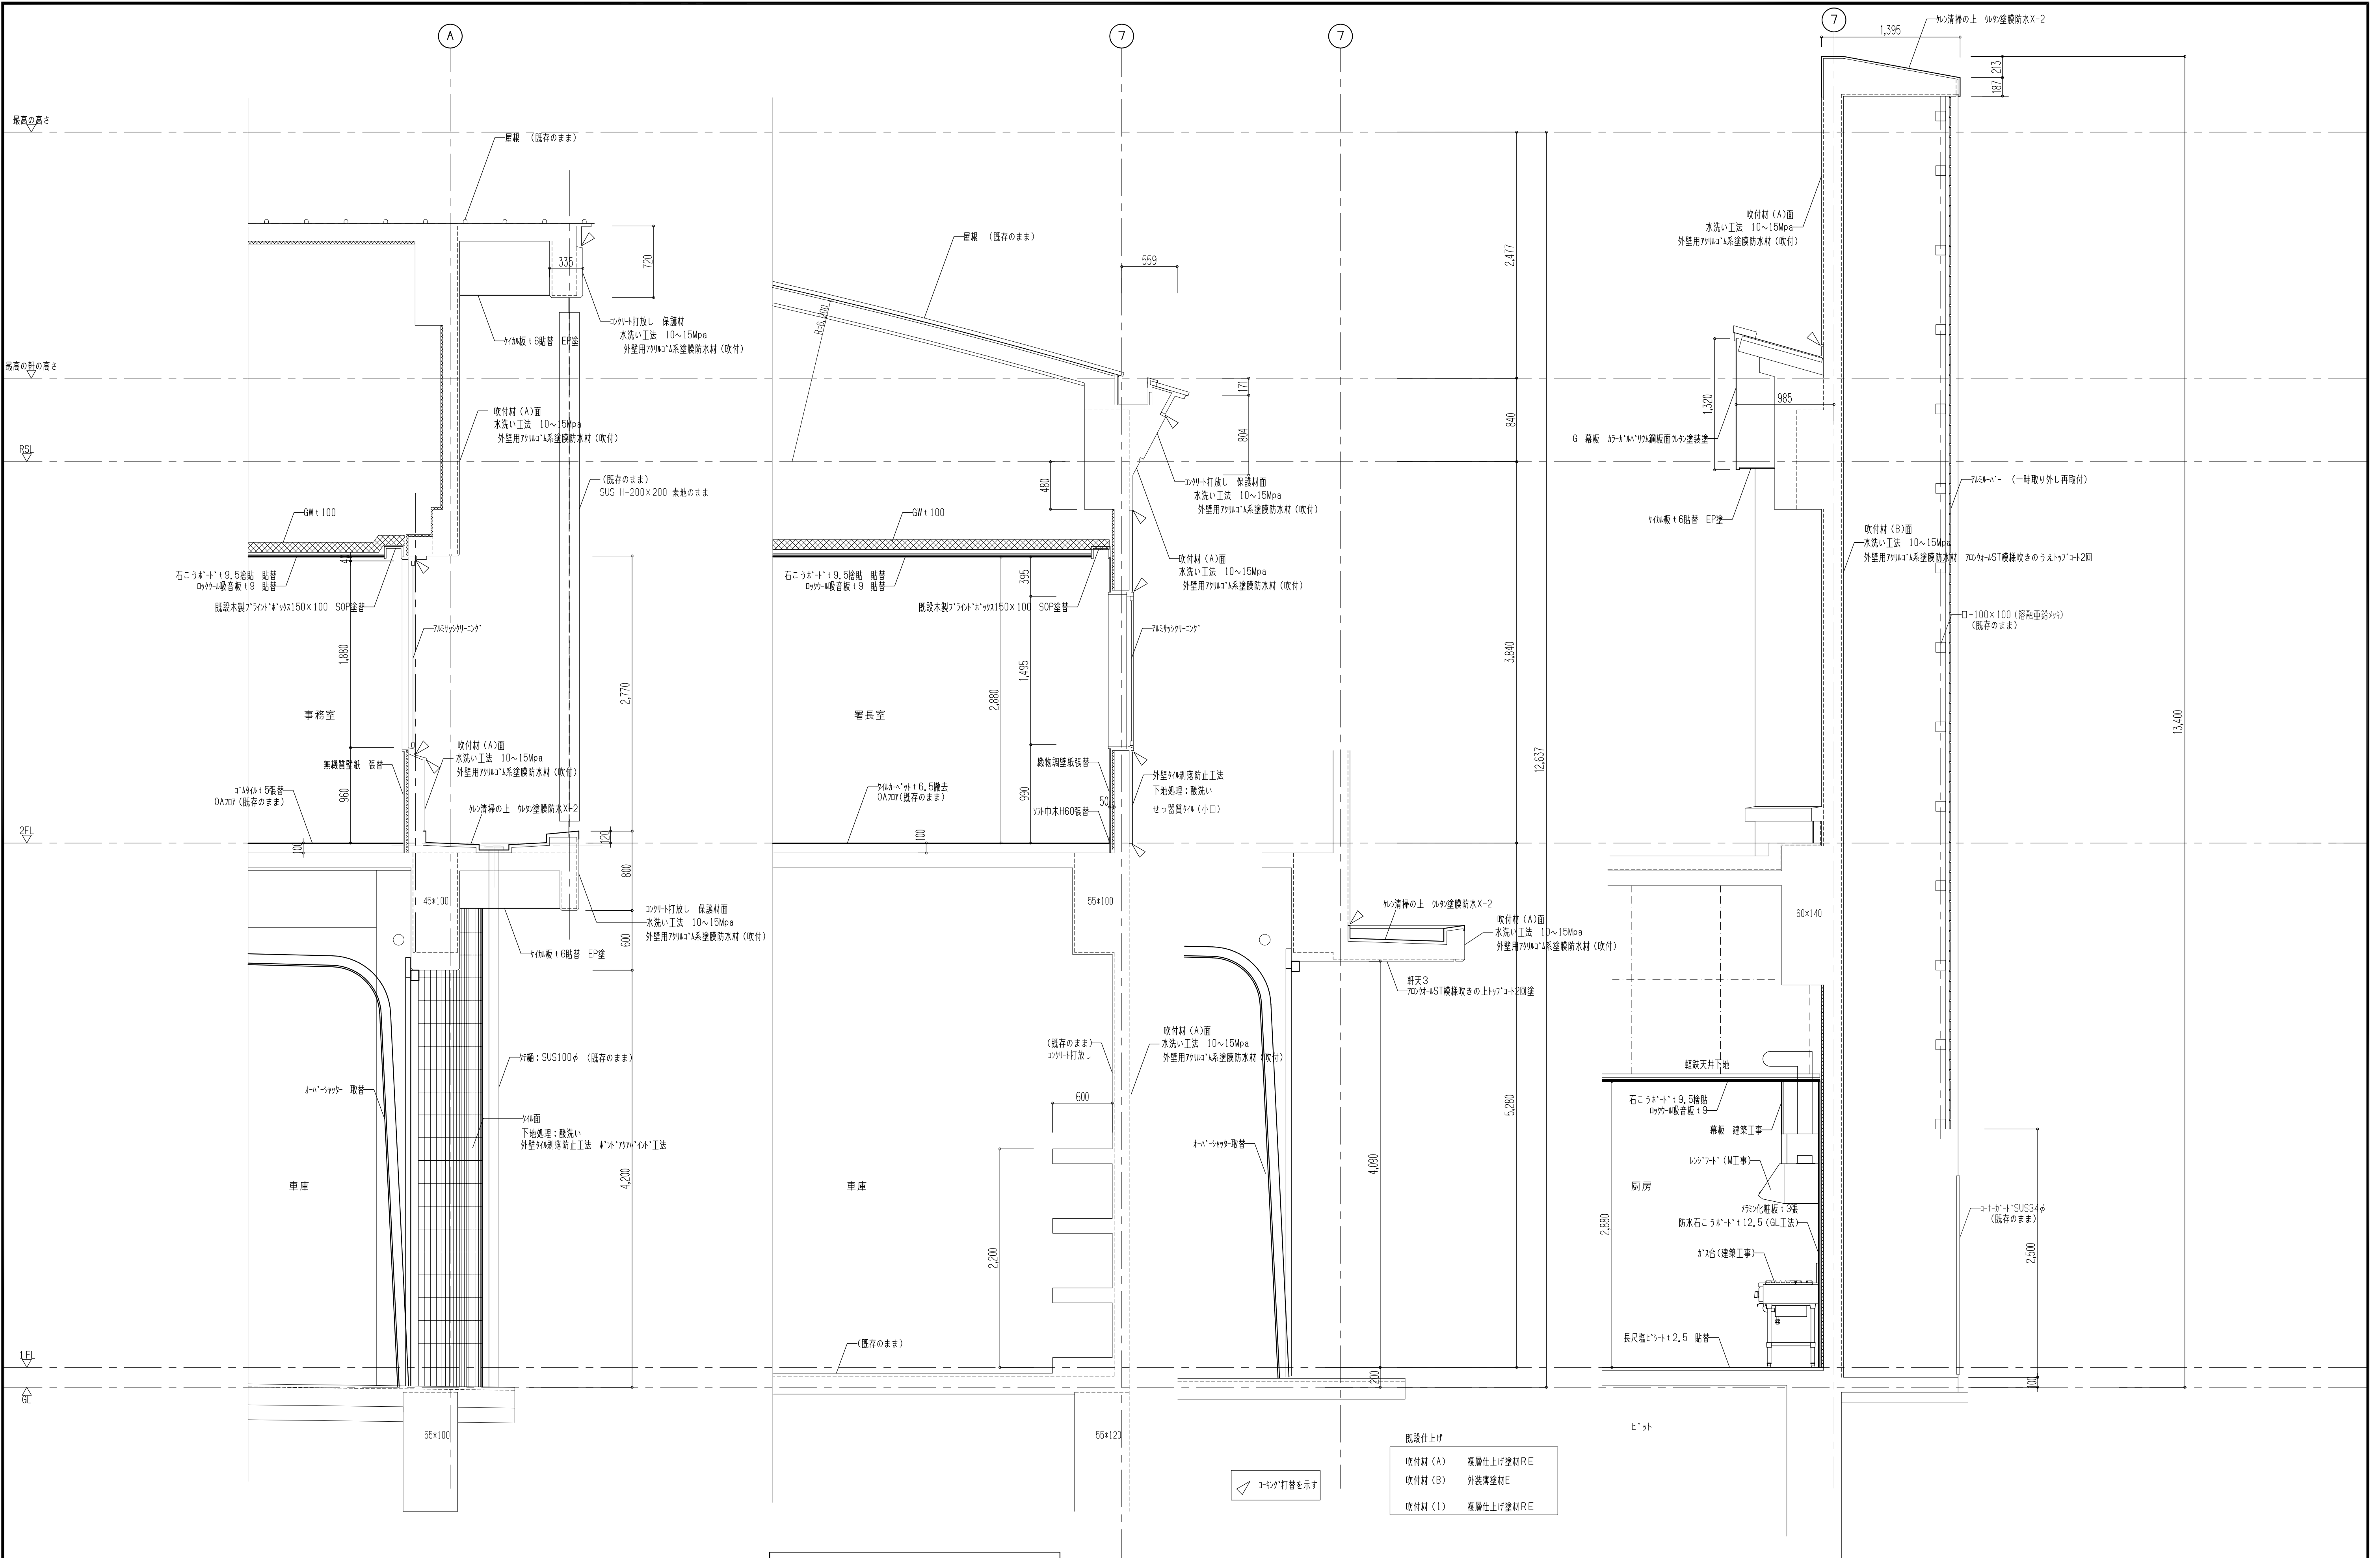


断面詳細図2(改修) 1/30

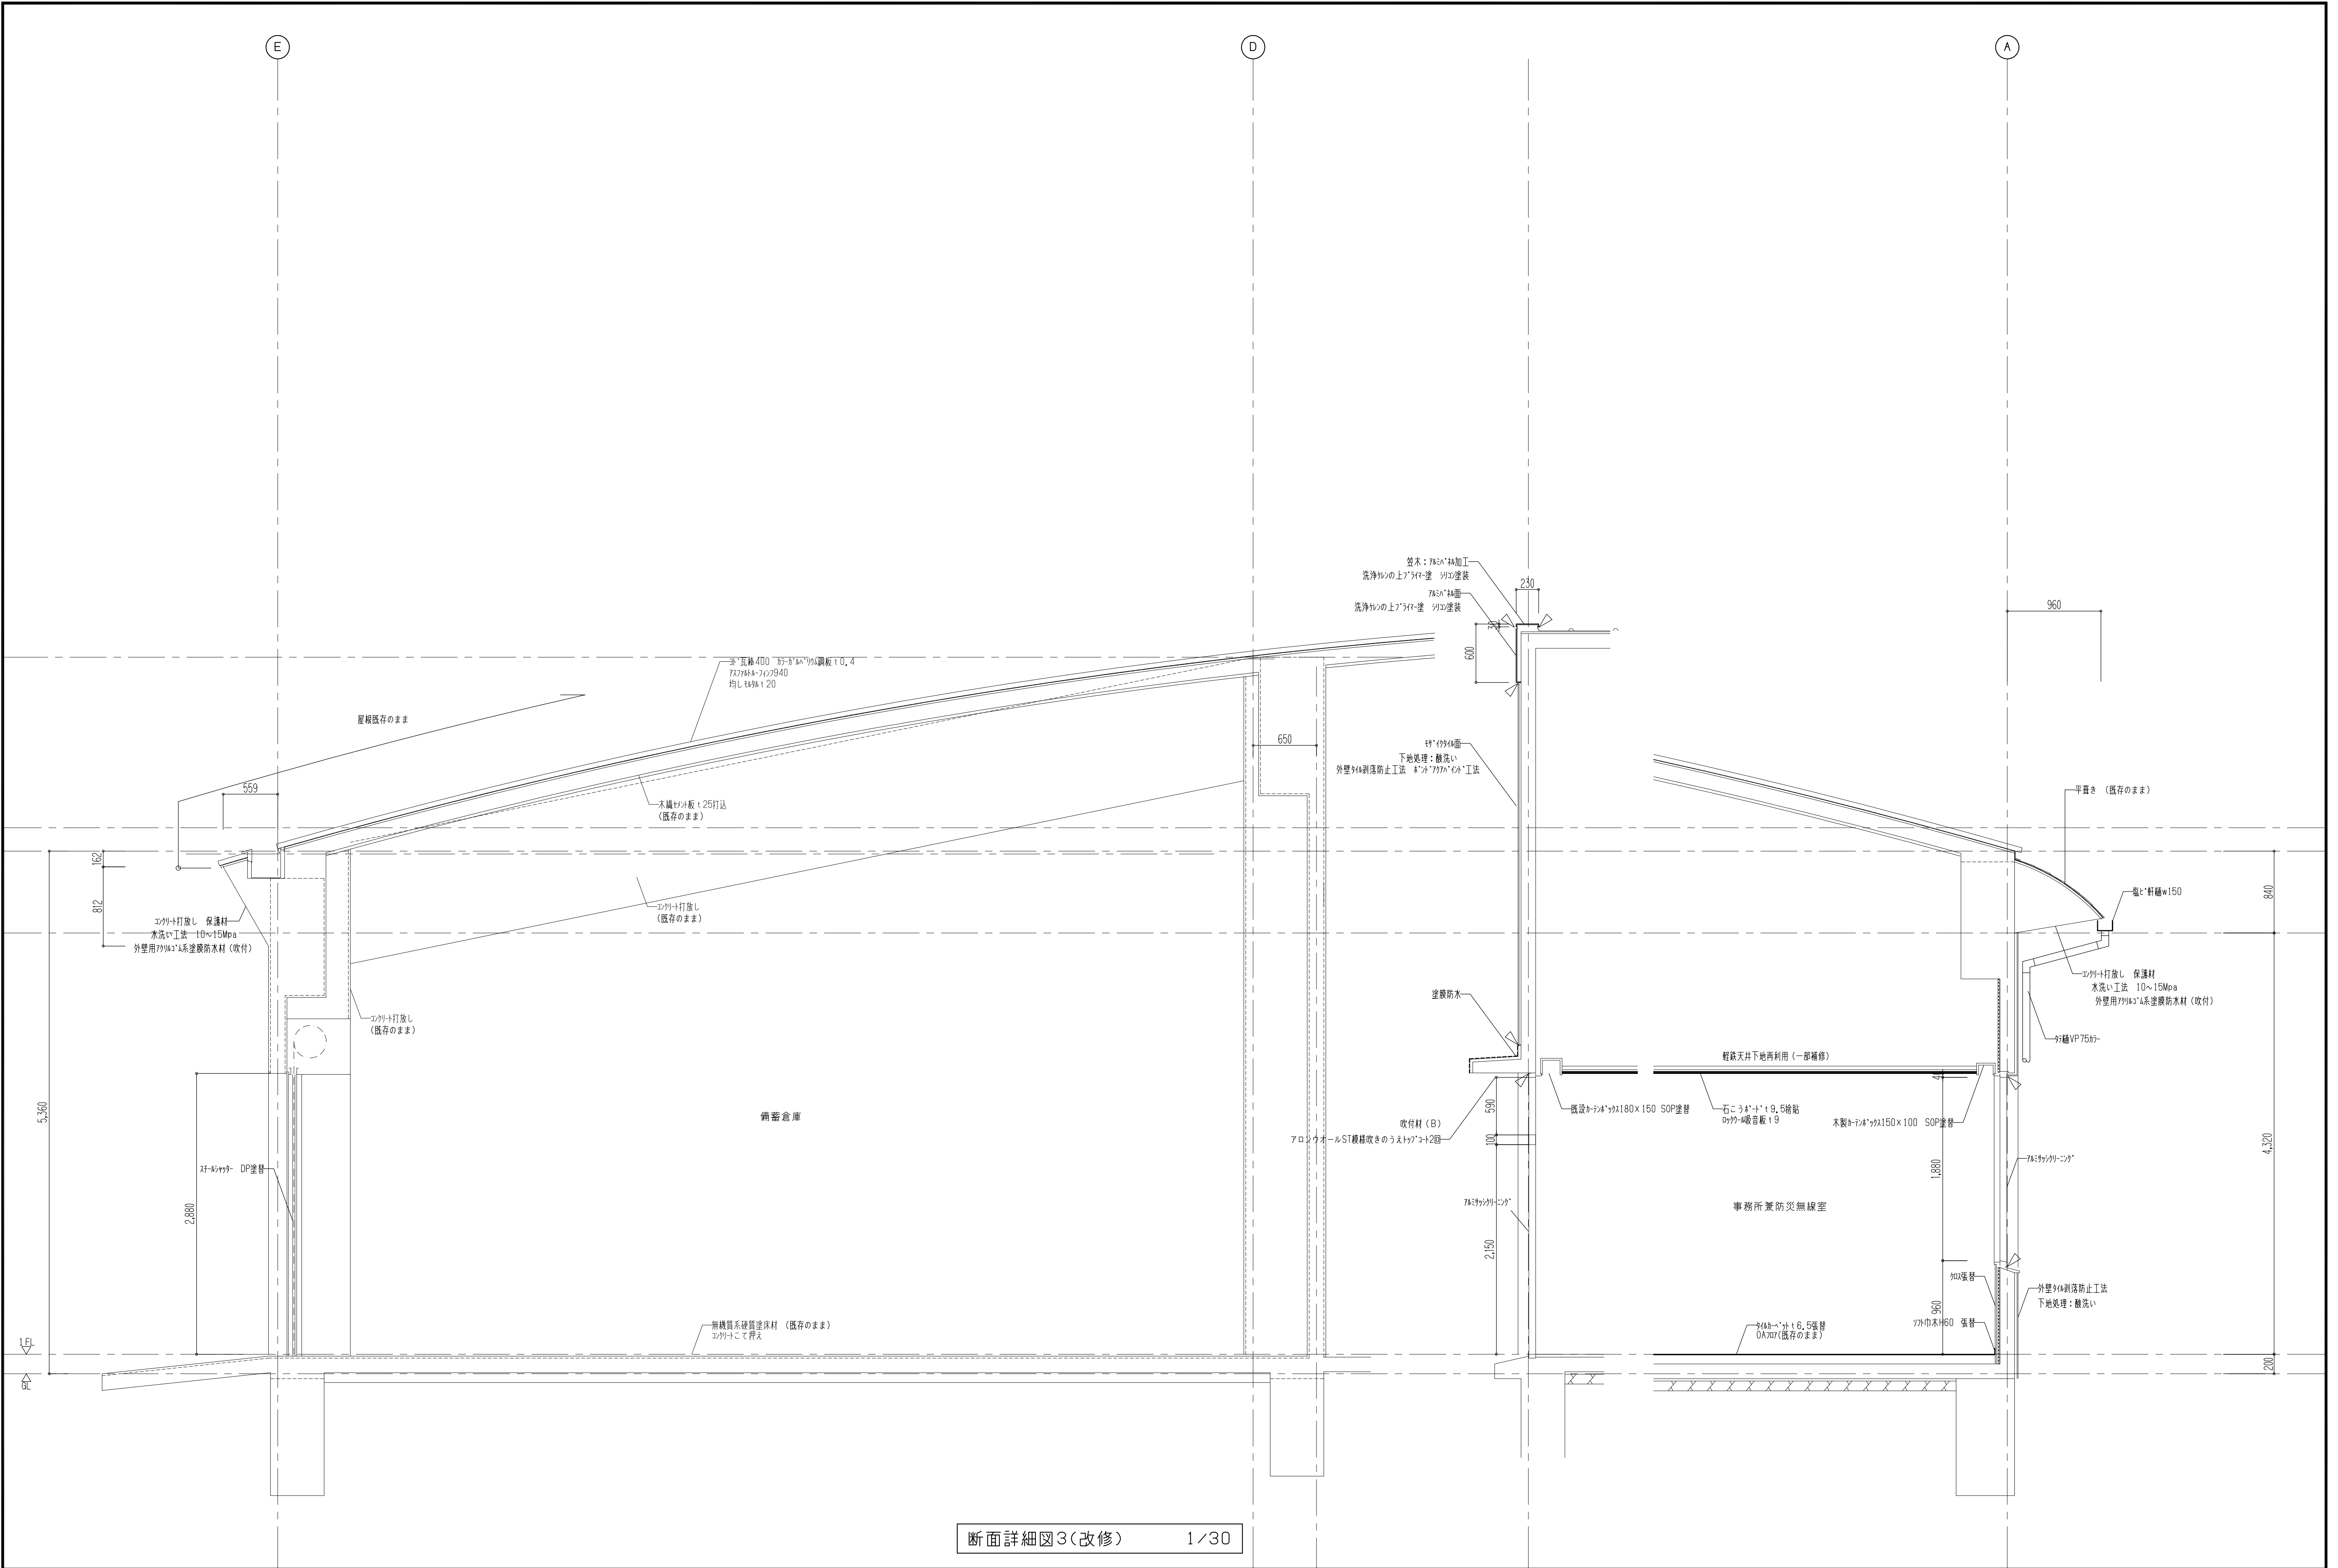


断面詳細図3(改修) 1/30

										守山コミュニティ防災センター・湖南広域消防局北消防署改修工事（建築工事）										SCALE		NO			
										DATE		断面詳細図 3（改修）										A1:1/30		A-22	
										2026												A3:1/60			
										株式会社 内堀建築設計事務所 1級建築士登録第148816号 和田 茂															

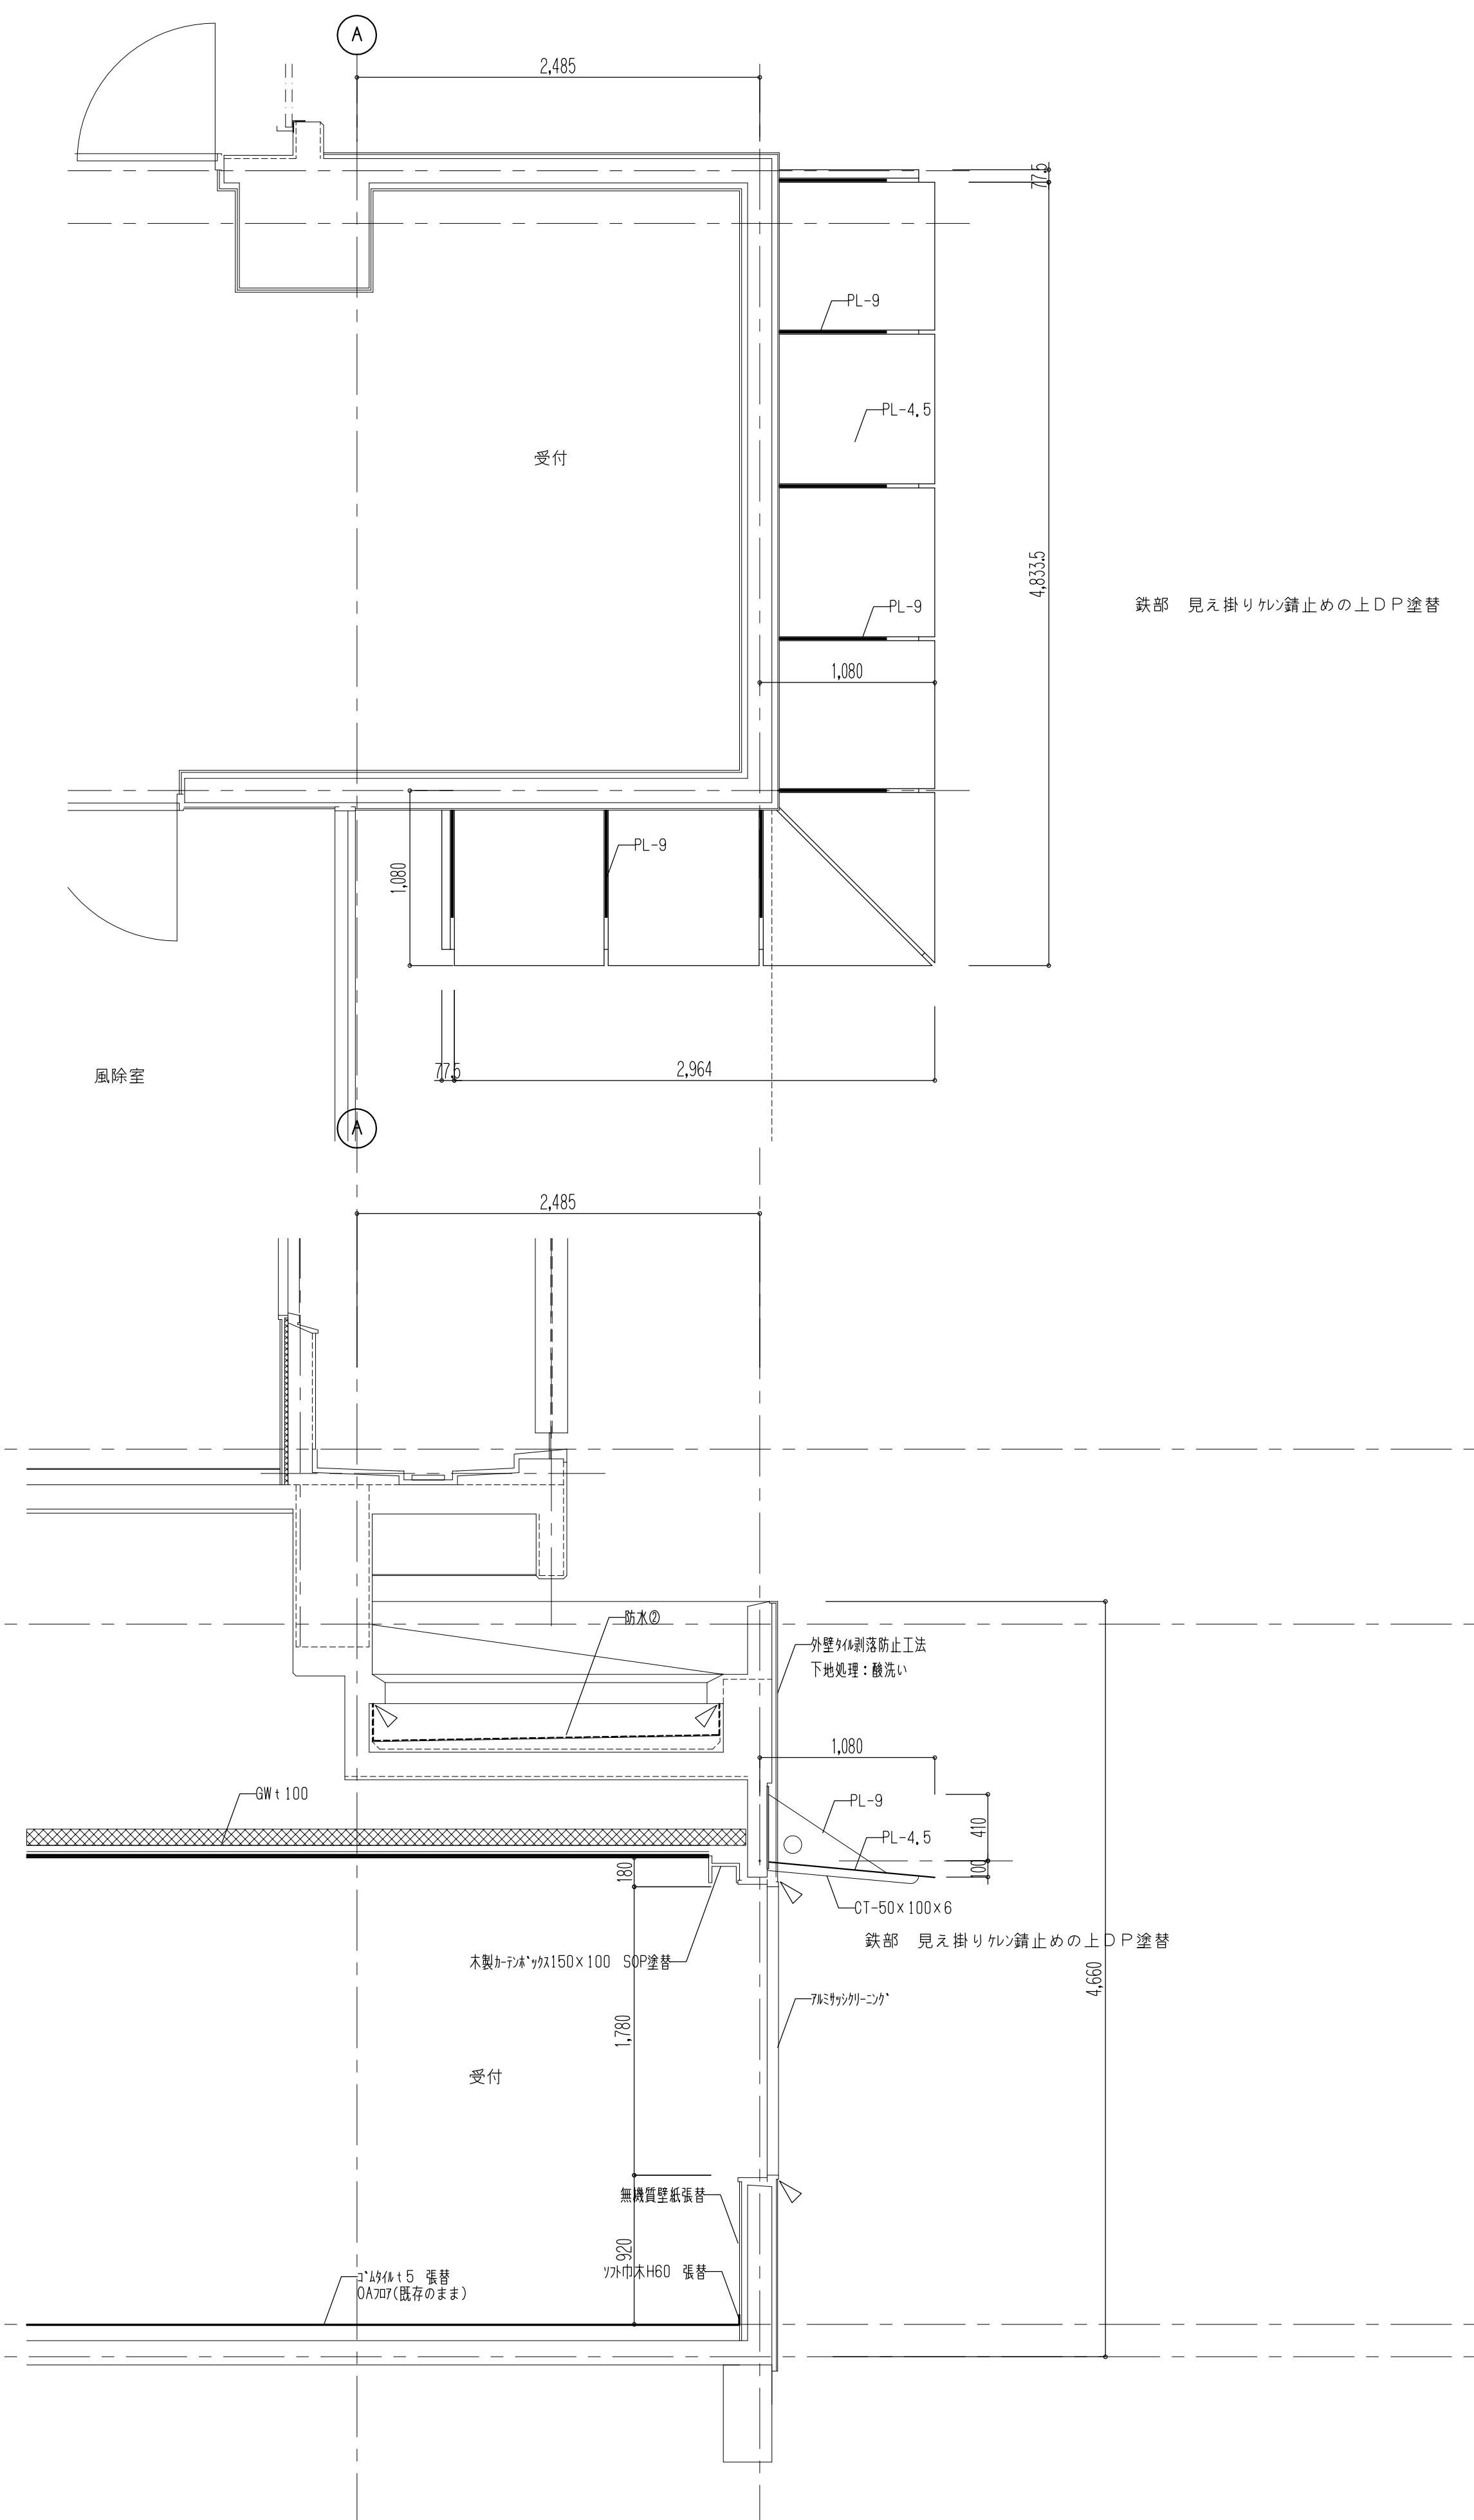

株式会社 内堀建築設計事務所 1級建築士登録第148816号 和田 茂

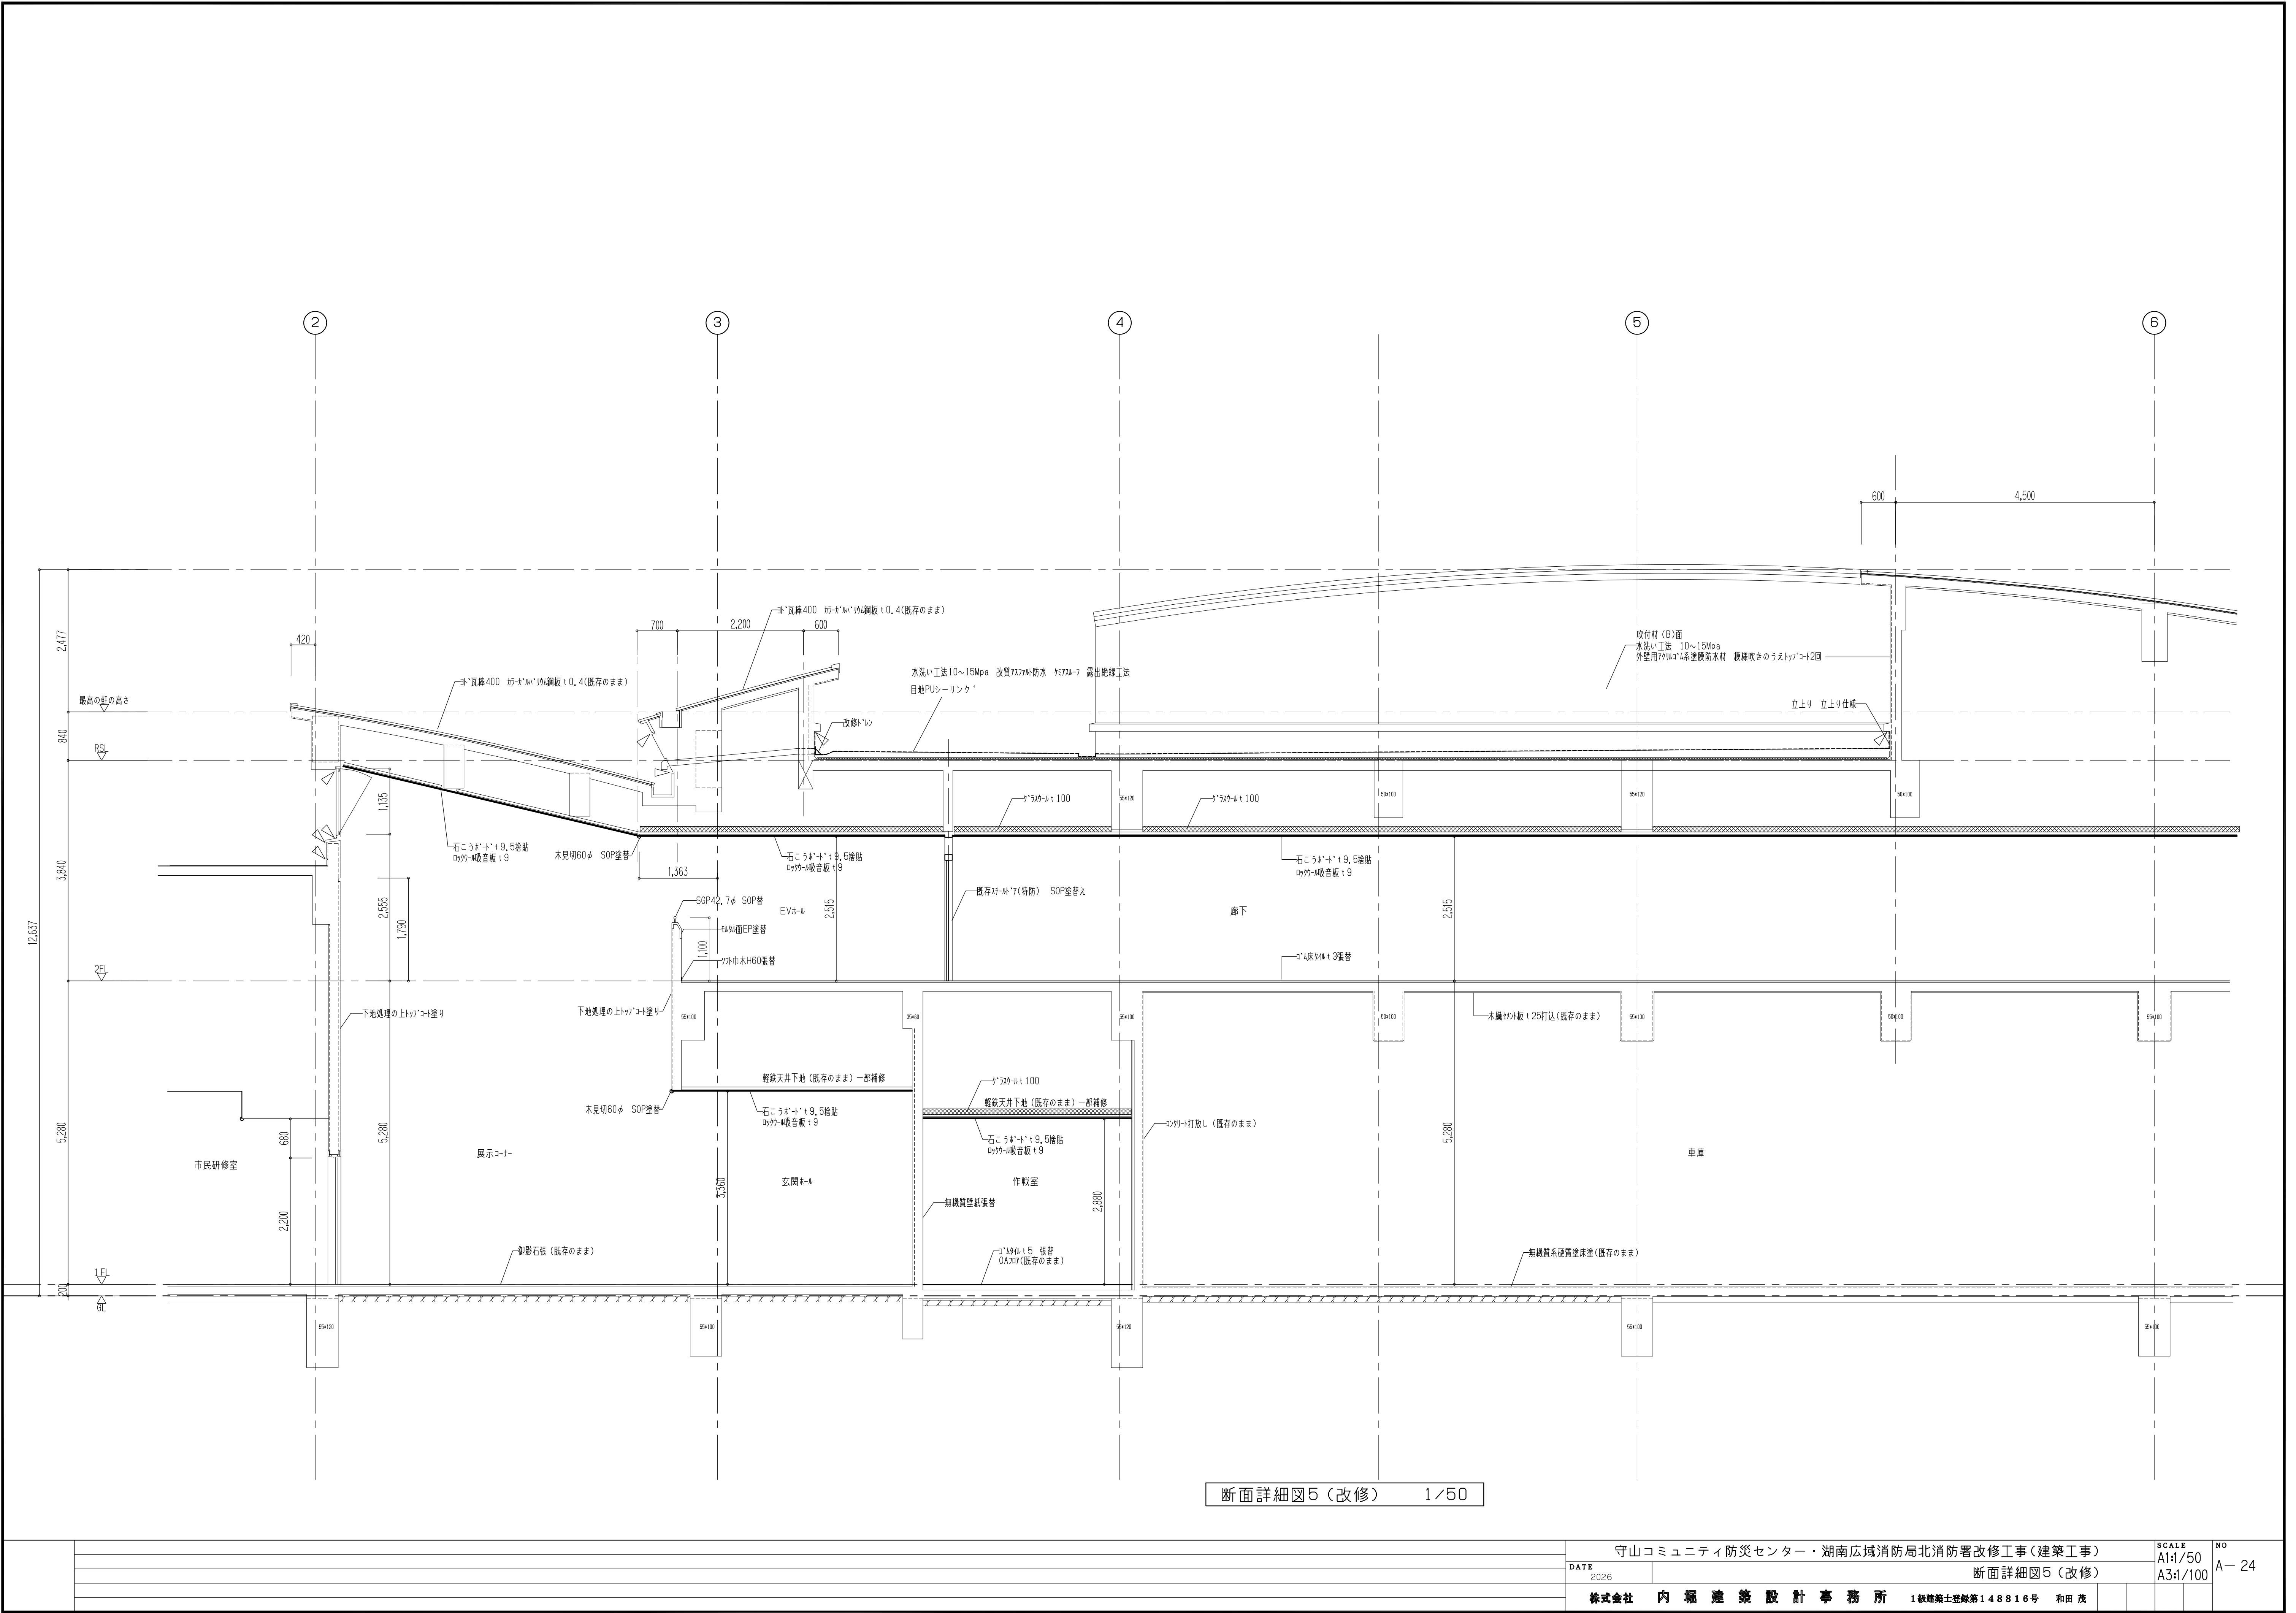

断面詳細図5 (改修) 1/50
